


3分でわかる!



Lychee REDMINE

ライチ・レッドマイン

— プロジェクト管理をもっと楽しく —

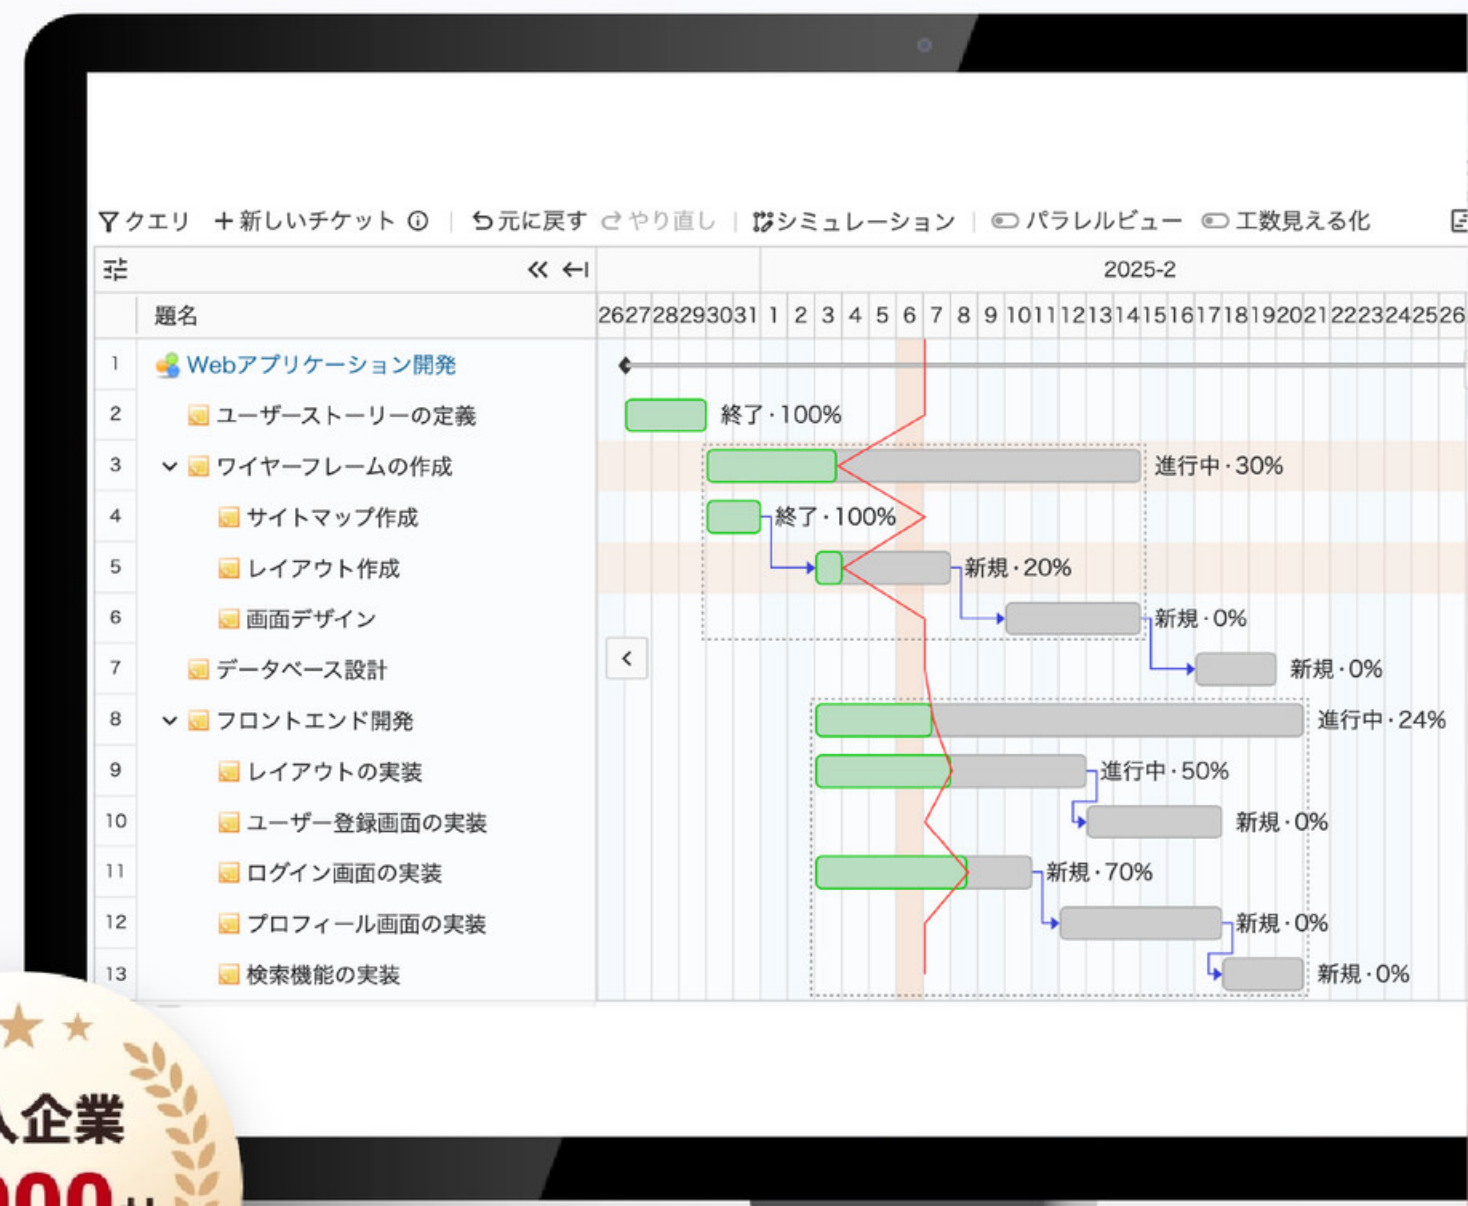



プロジェクトを成功へ導く機能を揃えた、
プロジェクト管理ツールです。

日々の進捗は**ガントチャート**や**カンバン**、**ダッシュボード**で確認。
複数プロジェクトの場合でも、**プロジェクトレポート**でまとめて状
況を把握できます。

その他にも**Lychee AI**によるサポートや、**工数の見える化**、
EVM、**CCPM**、アジャイル開発に使える**Neoバックログ**など豊富
な機能でプロジェクトの成功をバックアップします。



Lychee AI



ガント
チャート



Neo
バックログ



Neo
カンバン



リソース
マネジメント



CCMP



コスト
マネジメント



EVM





タイム
マネジメント



プロジェクト
レポート

チケットが追加・更新されるとすべての画面にリアルタイム反映されます


チケット
追加・更新

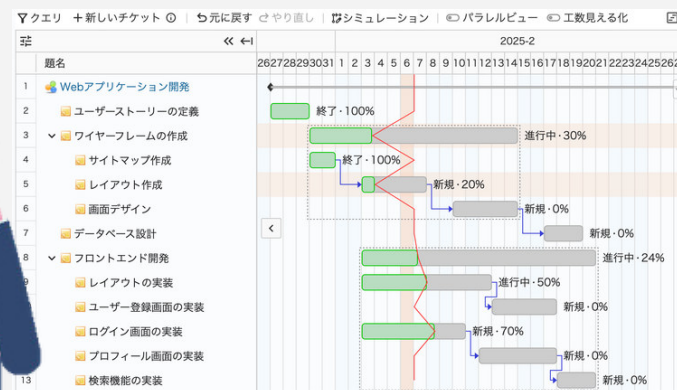

ガントチャート



カンバン

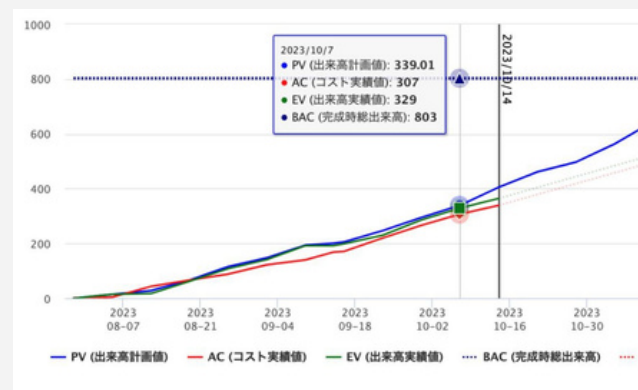

EVM

プロジェクト	マネージャー	タスク消化率	作業時間消化率	予算
販売会計システム開発	大城 忠義	133.2%	88.7%	3,400,000
携帯電話向けゲームアプリの開発	重田 登	92.9%	77.2%	4,625,000
議事録管理システム開発	水口 崇	90.6%	84.6%	4,000,000
新規事業システム開発	大橋 宏行	83.5%	64.7%	4,750,000
基幹システム開発	大橋 宏行	73.2%	92.6%	3,500,000
行政アプリの開発	甲斐 孝治	67.5%	100.6%	2,892,500
商品管理システム開発	宮本 吉之助	64.0%	71.8%	5,000,000
				2,250,000
				1,400,000
				4,000,000
				3,500,000
				2,500,000
				1,500,000
				1,158,900

プロジェクトレポート

全画面にリアルタイム反映

4つの特長で プロジェクトの成功をサポートします

1


進捗管理



誰がどの作業をどこまで進めているか
最新情報がチーム全体で確認できる

2

工数管理



作業が集中している
担当者の負荷分散を行う

3

予算管理



EVMで開発コスト超過を早期発見
収益悪化を防げる

4

レポート作成



毎週集計の手間いらず
統一フォーマットが実現


進捗管理



ガントチャート

イナズマ線で遅れているタスクが一目でわかる

進捗具合を可視化し、遅れているタスク（作業）がピンポイントでわかります。

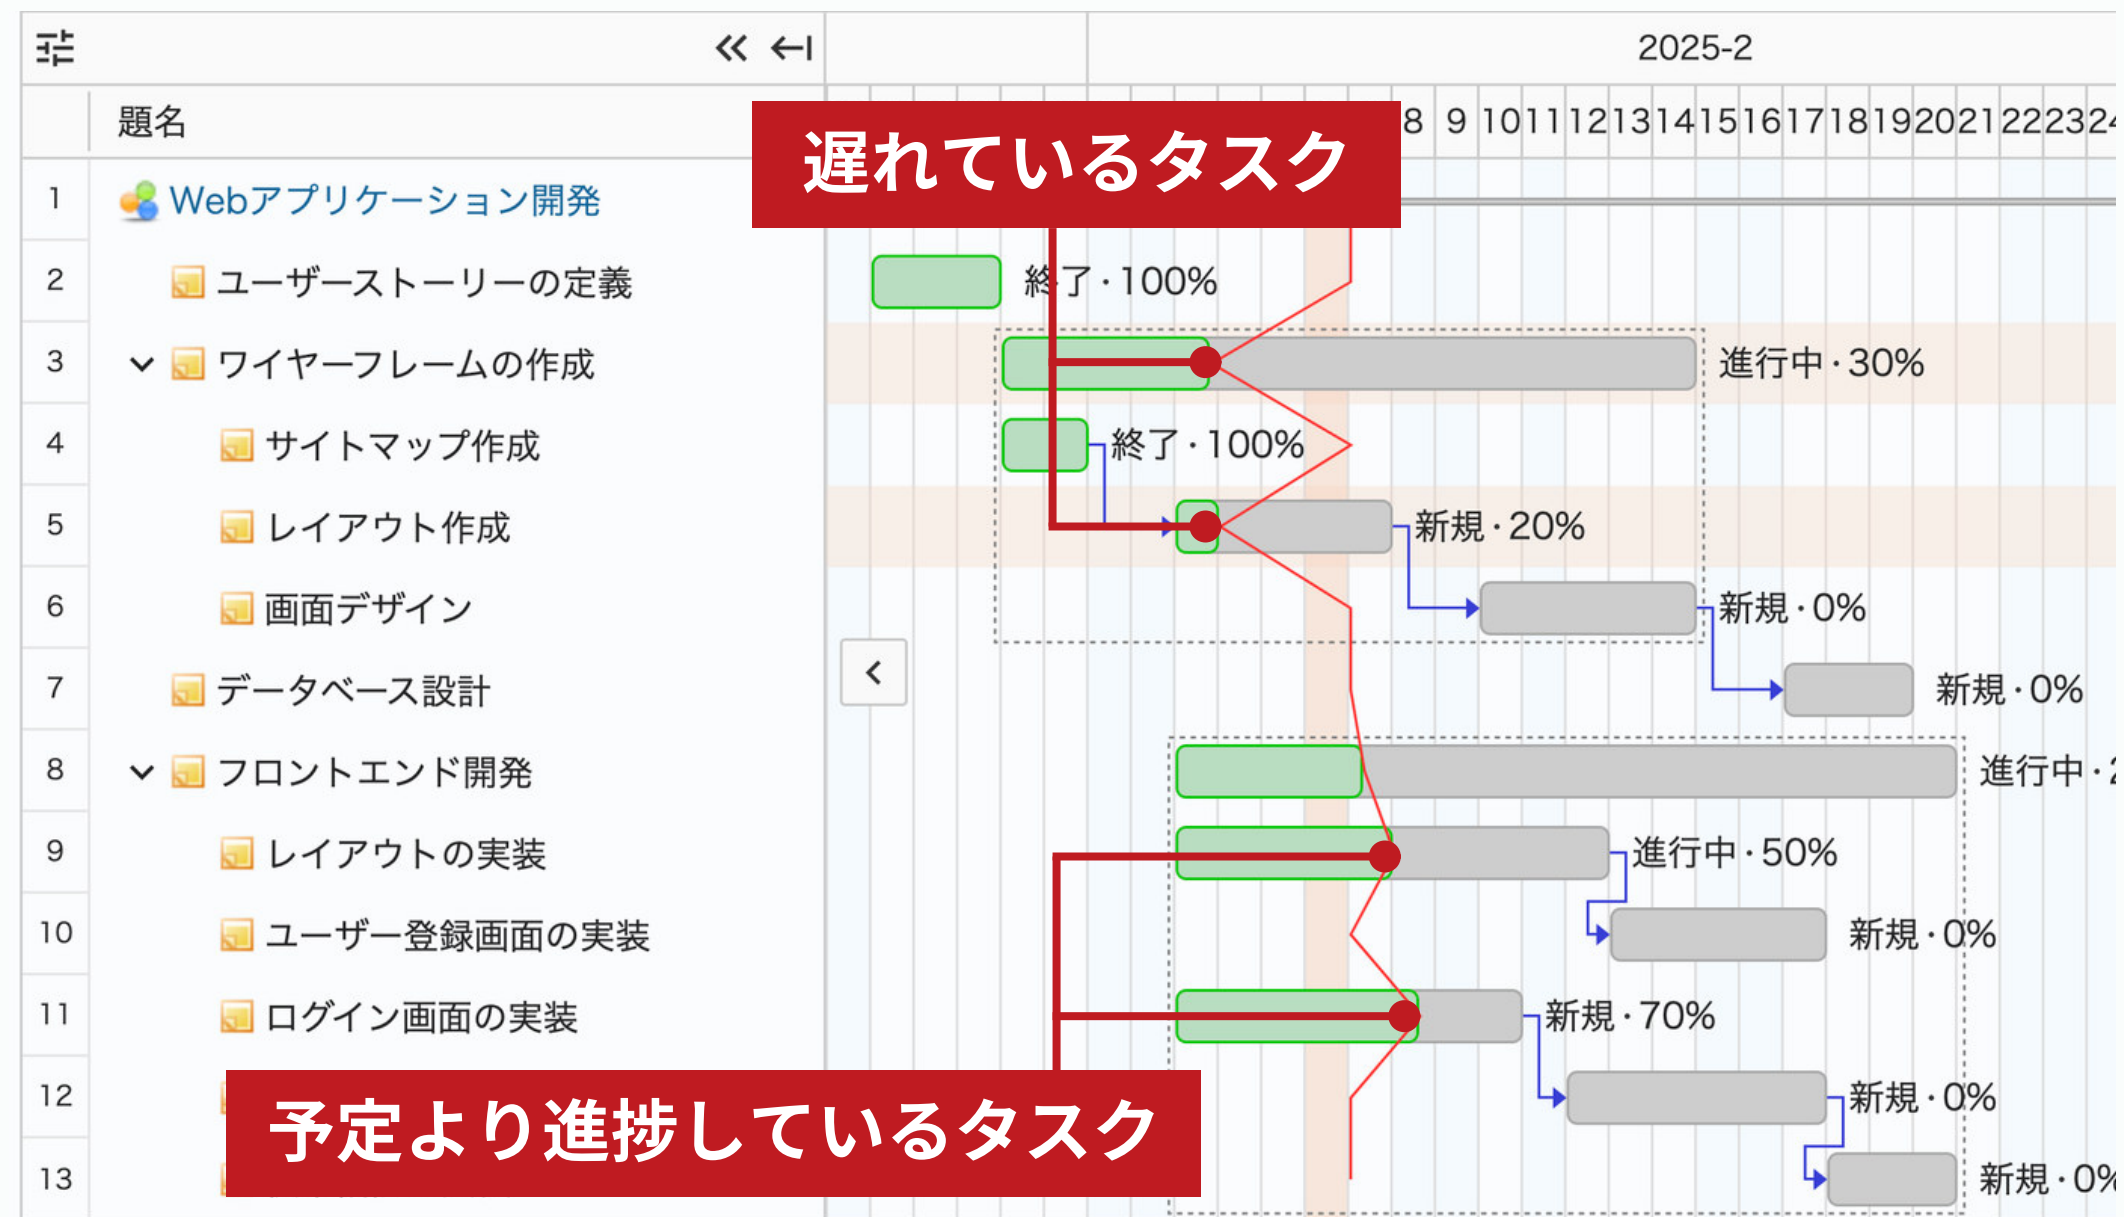




ガントチャート

納期に影響する重要タスクがわかるクリティカルパス

プロジェクトのスケジュールに直接影響を与える重要なタスクの流れを視覚化。
クリティカルパスを使うと、納期内に収まるように計画を立てやすくなります。

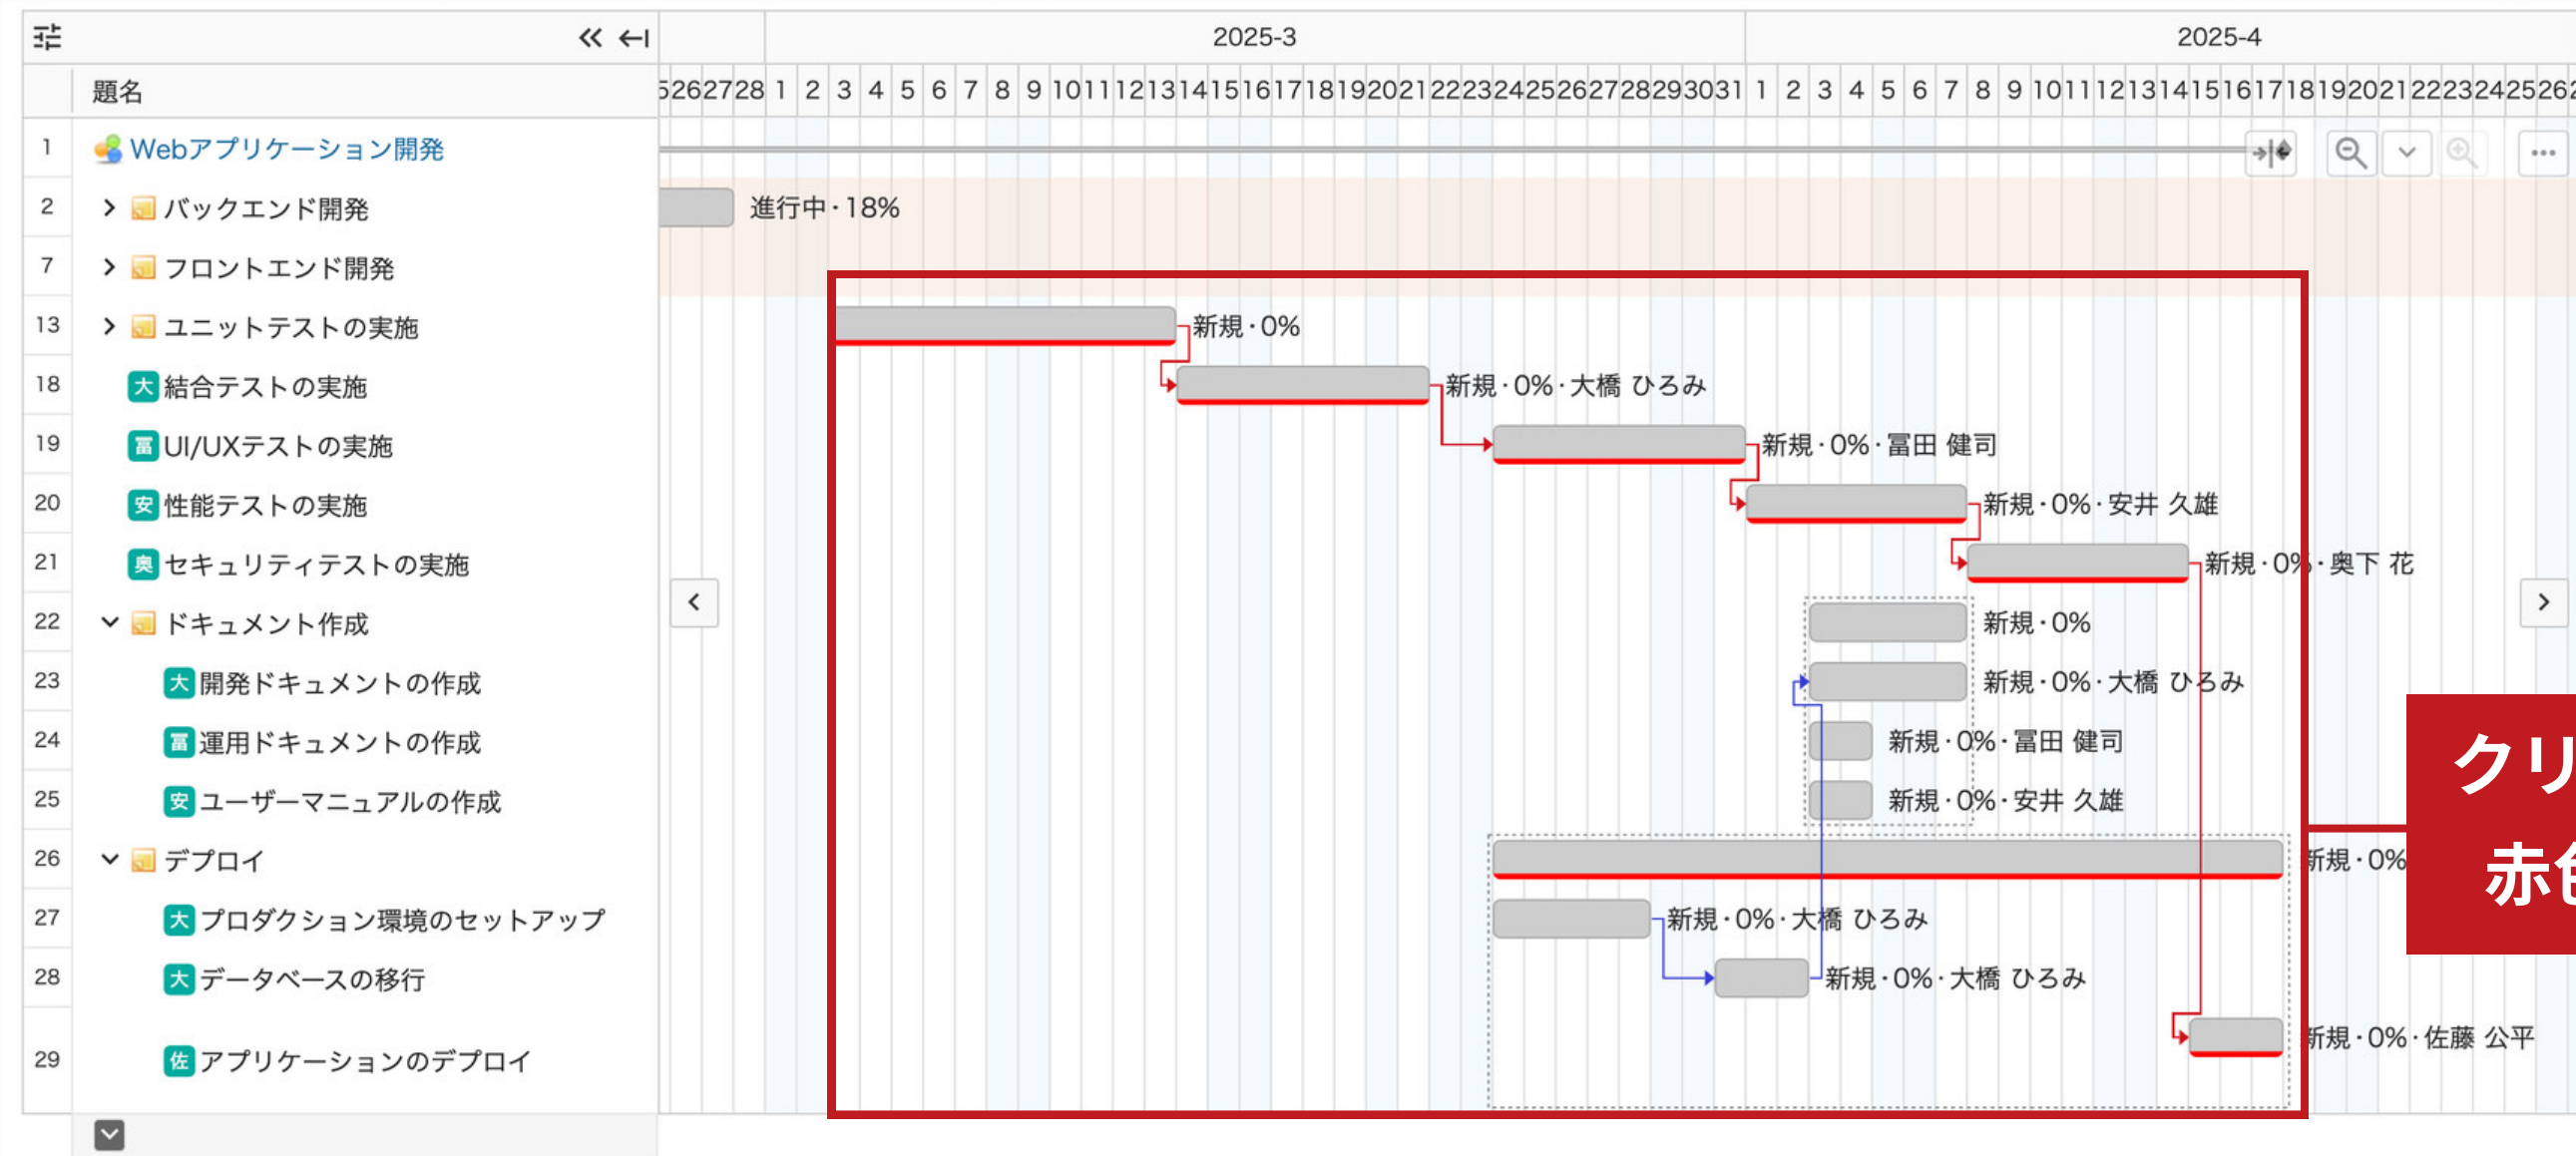

クリティカルパスは
赤色で明確に表示




ガントチャート


マイルストーンとタスクを紐付け、期日遅延がひと目でわかる

プロジェクトの重要な期日にマイルストーンを設定できます。
タスクと紐付けることでマイルストーンまでのバッファを可視化できます。

バッファがある時

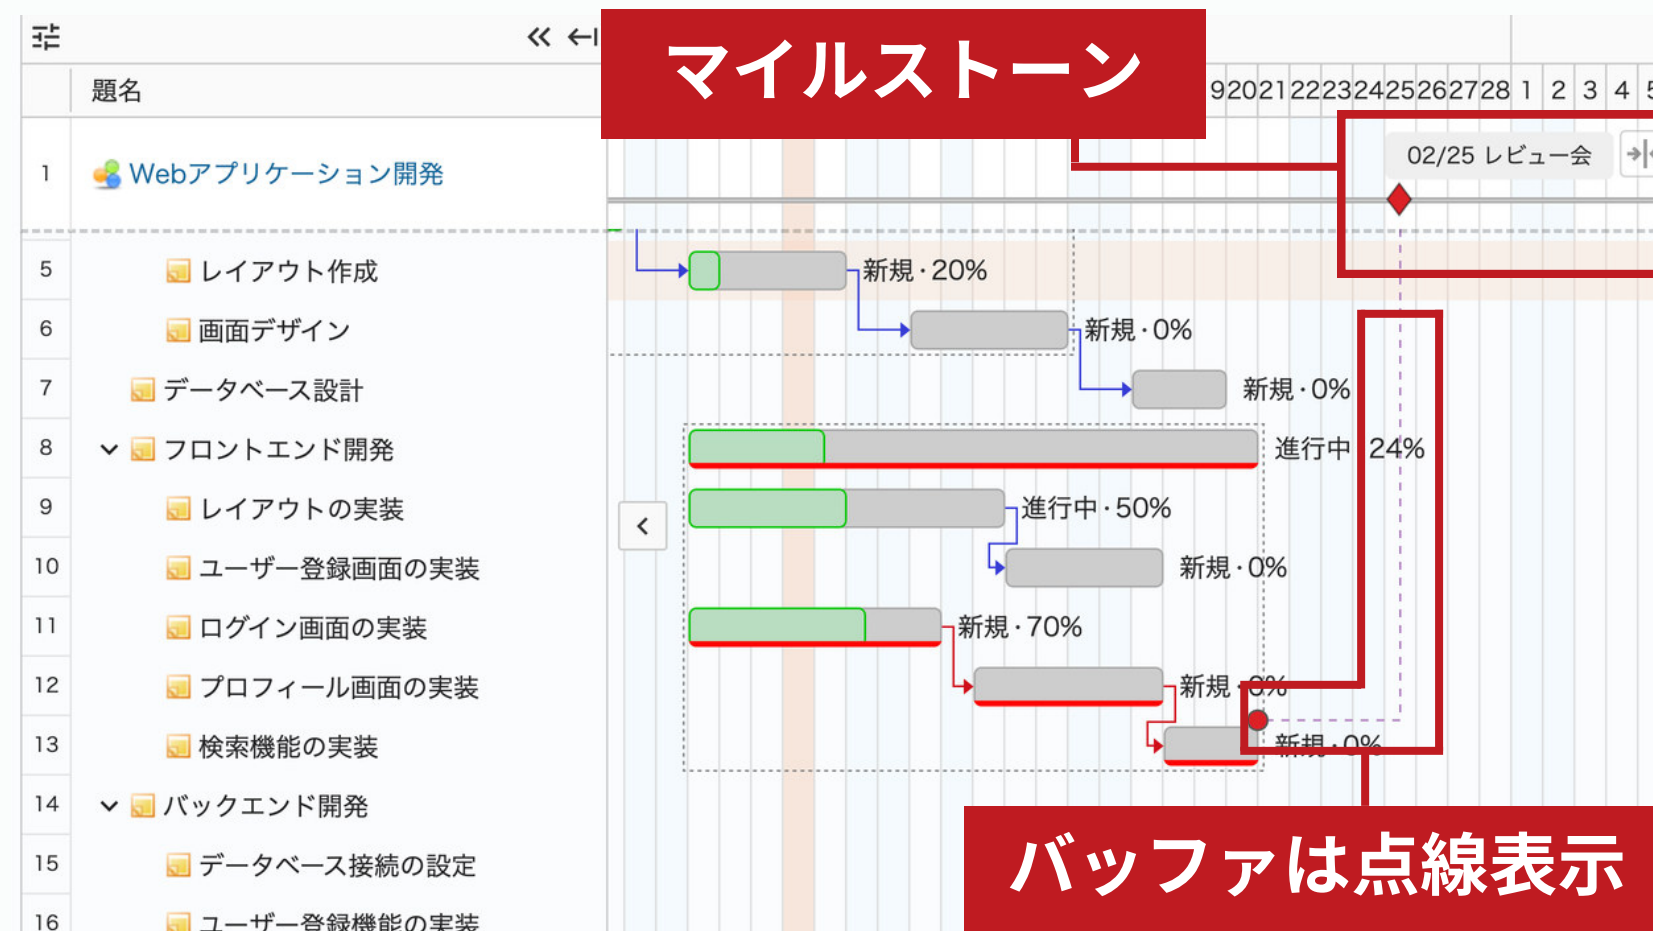

遅延している時

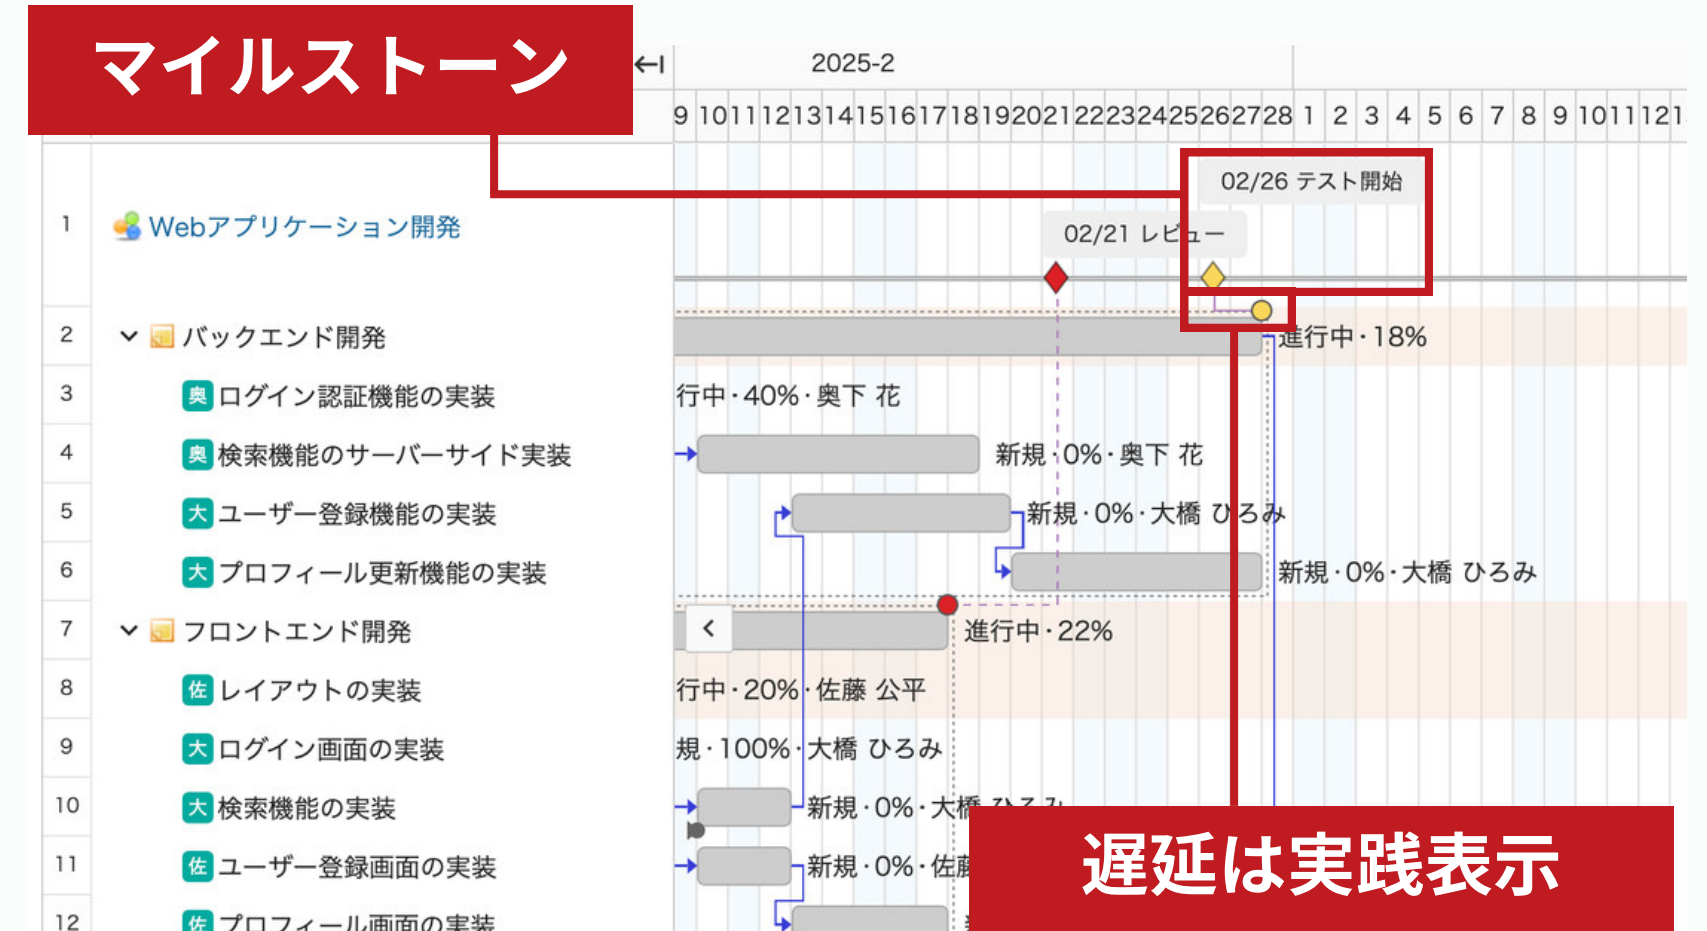




ガントチャート

予定と変更予定を一目で比較できる

初期の計画をスナップショット保存して現在の計画との差分を表示。元々予定していたスケジュールと比較して、計画に沿って進行できているか、どこで遅れが出始めたのか確認できます。

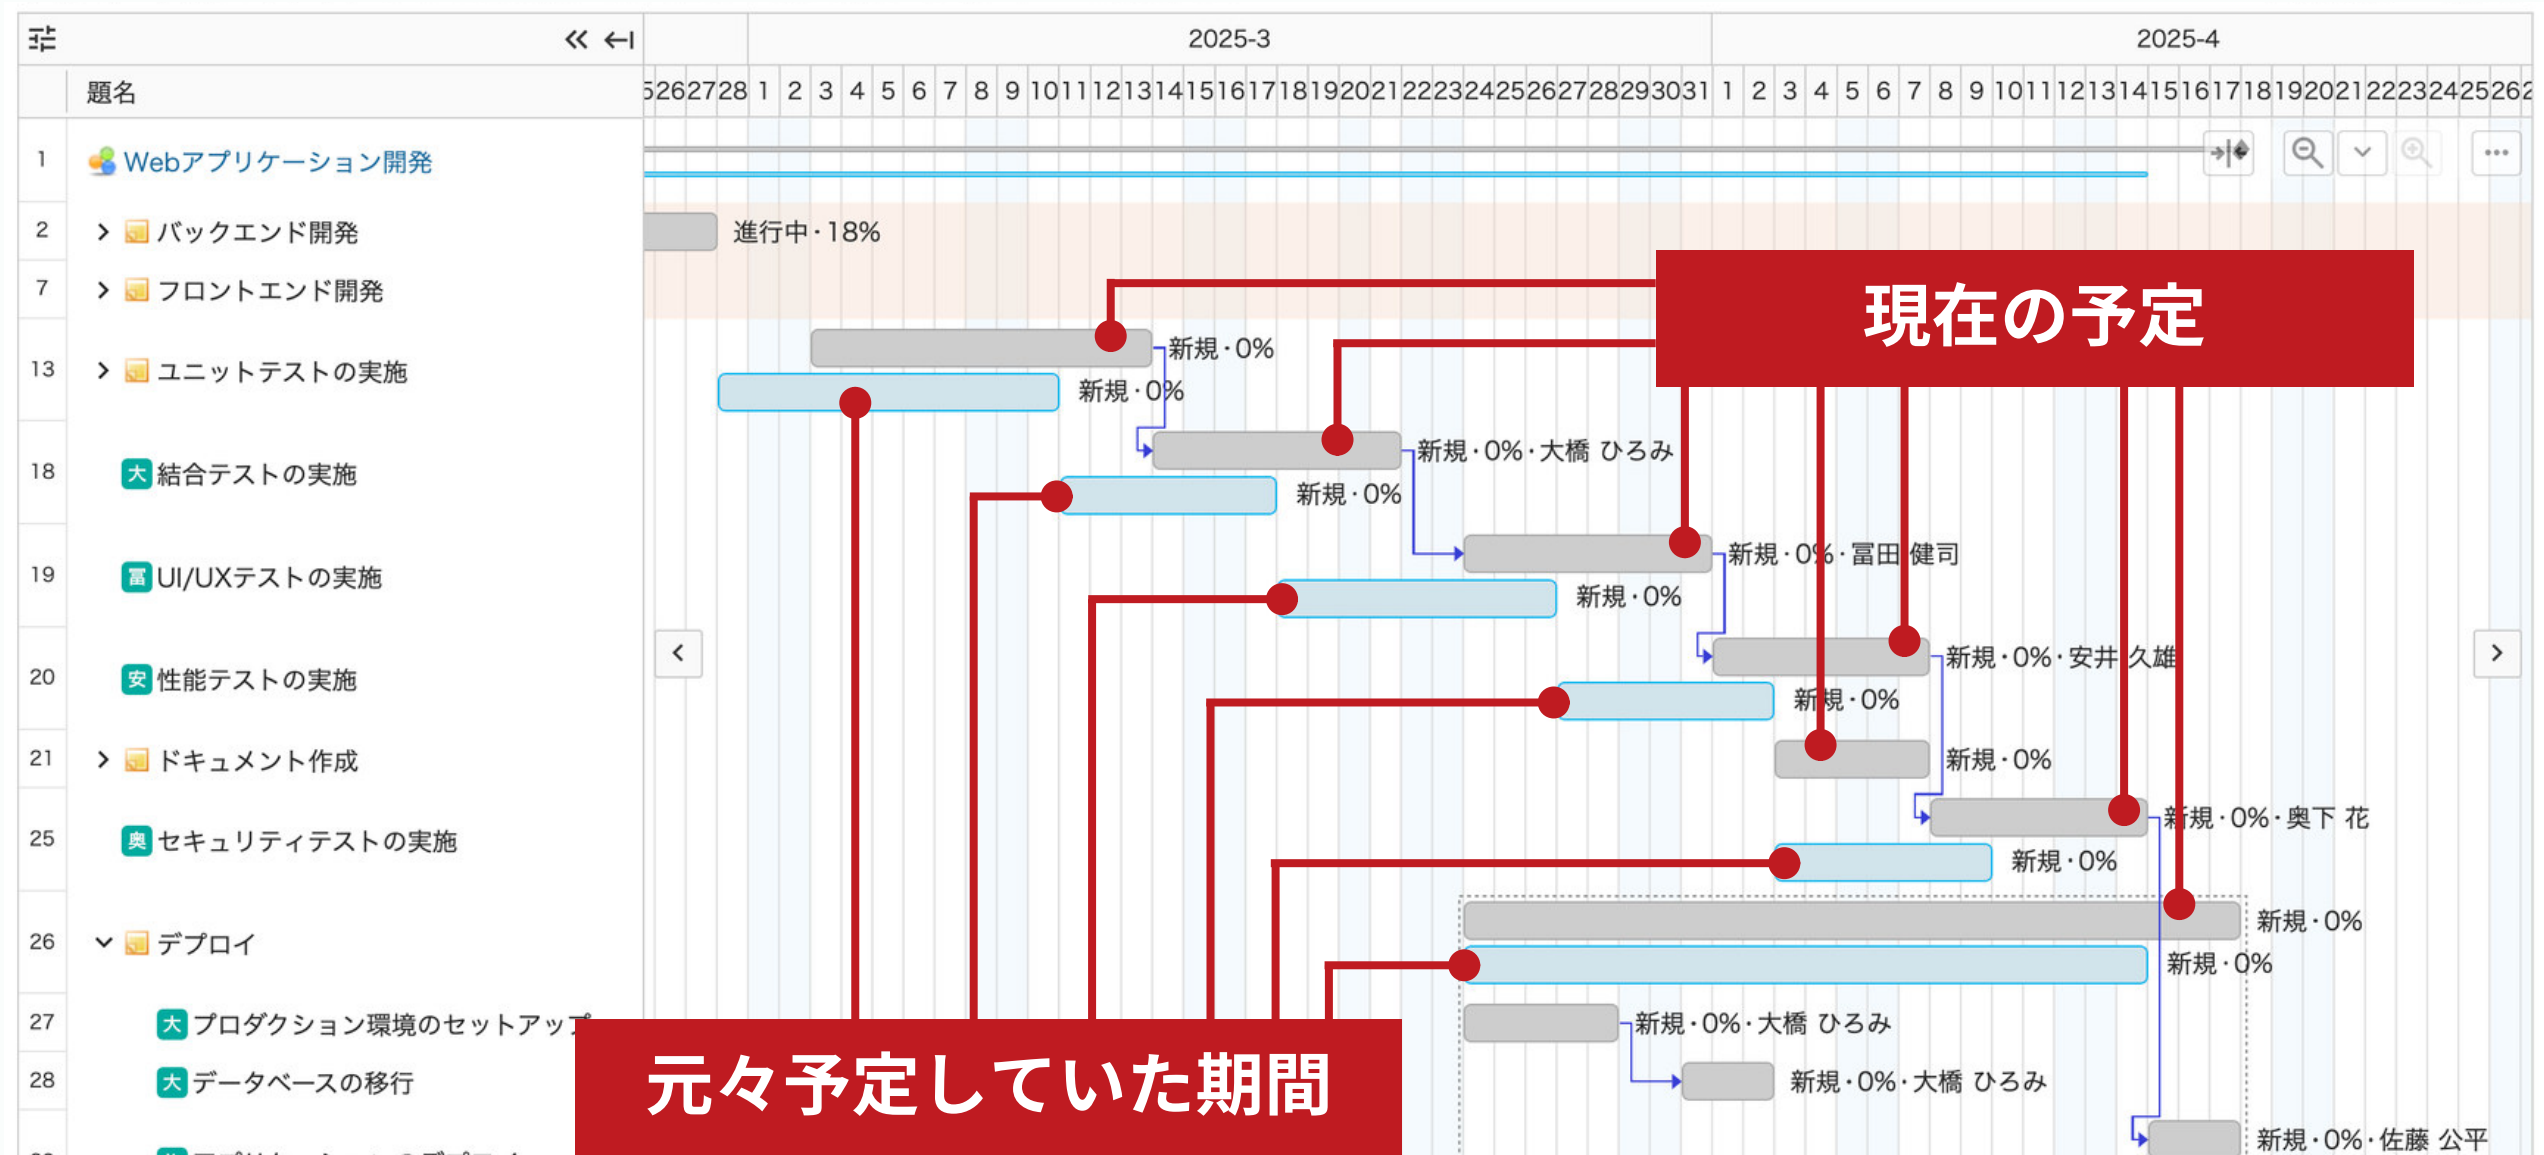



カンバン

担当者別カンバンで、各メンバーの負荷状況が見える

マネージャーがタスクの偏りを見つけて他のメンバーに割り振りしたり、期限切れのチケットも把握できますので、プロジェクトの停滞を防げます。

ステータス

担当者			着手前(16)		作業中(5)		レビュー(1)		終了(11)	
佐藤 公平	佐	予残	88H 実 88H 未完	0H 56H	ユニットテストの実施 #914 ユーザー登録機能のテスト 4/19 8H		#905 プロフィール画面の実装 3/28 32H		フロントエンド開発 #902 レイアウトの実装 3/22 32H	
					#925 アプリケーションのデプロイ 6/6 16H					
富田 健司	富	予残	122H 実 122H 未完	0H 106H	ワイヤーフレームの作成 #899 画面デザイン 3/6 32H		デプロイ #923 プロダクション環境のセットアップ 3/5 32H		ワイヤーフレームの作成 #898 レイアウト作成 3/5 16H	
					ドキュメント作成 #929 運用ドキュメントの作成 3/13 16H				ワイヤーフレームの作成 #897 サイトマップ作成 3/2 16H	
					ユニットテストの実施 #915 ログイン認証機能のテスト 4/22 4H					
					ユニットテストの実施 #916 プロフィール更新機能のテスト 4/24 6H					

期限切れは期日が赤になる

この担当者に負荷が偏っているのが見える

- ・「着手前」のチケットが多い
- ・期限切れのチケットもある

予定工数



ダッシュボード


進捗確認に必要な情報を 1 画面で見れる

日々確認しておきたい指標を登録しておくことで
作業遅れなどのリスクを事前に検知しやすくなります。


プロジェクト
全体の
進捗状況を
確認

ダッシュボード

プロジェクト進捗状況

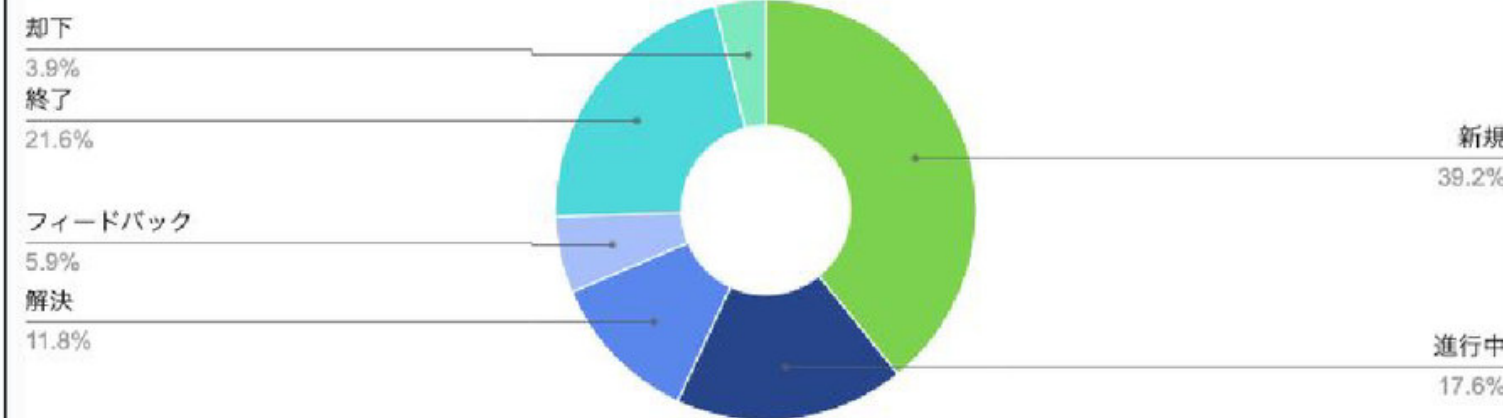

担当者別進捗状況

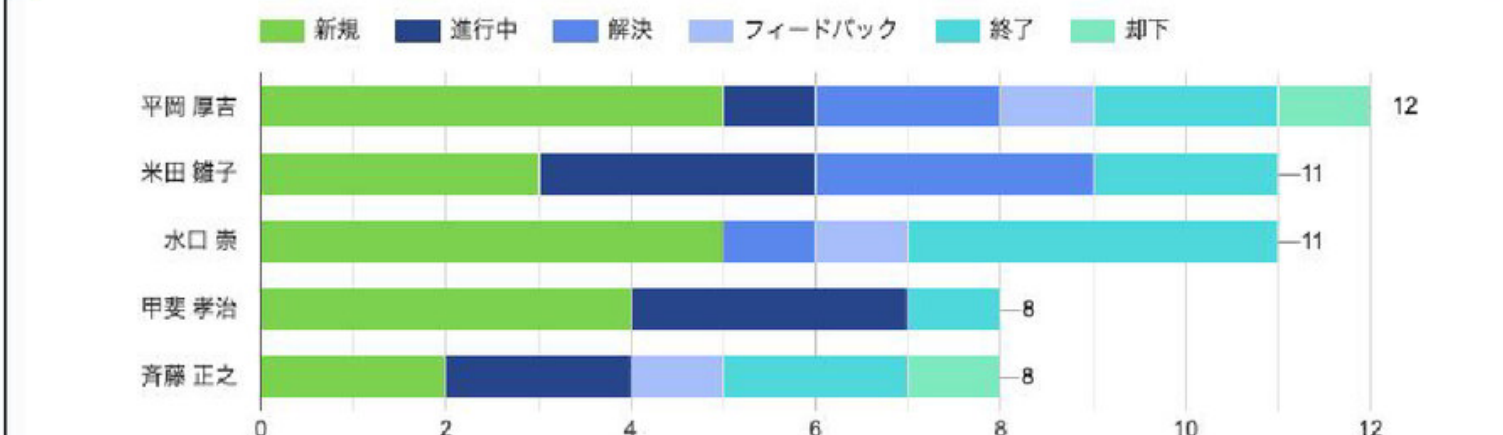

期限切れの
チケット

期限切れチケット

#	トラッカー	題名	担当者	期日
184	機能	画面詳細設計書	甲斐 孝治	2022-01-20
185	機能	画面パーツ一覧	甲斐 孝治	2022-01-21
186	機能	機能仕様書作成	平岡 厚吉	2022-01-24

期日が近い
チケット

期日が近いチケット

#	トラッカー	題名	担当者	期日
189	機能	画面パラメーター一覧	米田 雛子	2022-01-28
187	機能	エラーメッセージ一覧	斉藤 正之	2022-01-28
188	機能	表示メッセージ一覧	斉藤 正之	2022-01-31
214	機能	ログ出力設計		2022-02-01



ダッシュボード

いま対応すべきチケットを「今日のトピック」が自動で表示

期日を過ぎていたり、着手日を過ぎてても進捗が0%、一定期間更新がないものなど、確認・対応が必要なチケットを自動で集計し、重要度の高い順に表示

リスクになりうるチケットを ダッシュボード上で直接調整

今日のトピック ?

24件

遅延

4件

期日超過

7件

未着手

29件

更新停滞

4件

担当者未設定

2件

予定工数未設定

#1537 制御基板 詳細設計

ガントチャートで見る

遅延・07/15～07/21・進捗率 75%・担当者 佐藤 恵理

→ 後続あり

ステータス更新

期日変更

担当者変更

進捗更新

コメント

更新停滞

遅延3日

期日超過

未着手

担当者未設定

予定工数未設定

#1539 配線ハーネス 試作

遅延・07/16～07/22・進捗率 70%・担当者 田中 健一

ステータス更新

期日変更

担当者変更

進捗更新

コメント

#1536 試作1号機 組立・立ち上げ

ガントチャートで見る

遅延・07/16～07/22・進捗率 82%・担当者 中村 由紀

→ 後続あり

#1538 減速機 選定・発注

遅延・07/18～07/23・進捗率 88%・担当者 高橋 大輔

ステータス更新

期日変更

#1537 制御基板 詳細設計

ガントチャートで見る

遅延・07/15～07/21・進捗率 75%・担当者 佐藤 恵理

→ 後続あり

ステータス更新

期日変更

担当者変更

進捗更新

コメント

更新停滞

遅延3日

期日超過

未着手

担当者未設定

予定工数未設定

ステータス更新

遅延

コメント

部品選定の回答待ちで3日遅延しています。明日回答予定のため、期日を7/25に変更して対応します。|

キャンセル

保存


工数管理



ガントチャート

作業負荷を確認しながらスケジュールを調整できる

予定工数を確認しながら、勤務時間内にタスクが終わるように負荷分散できます。

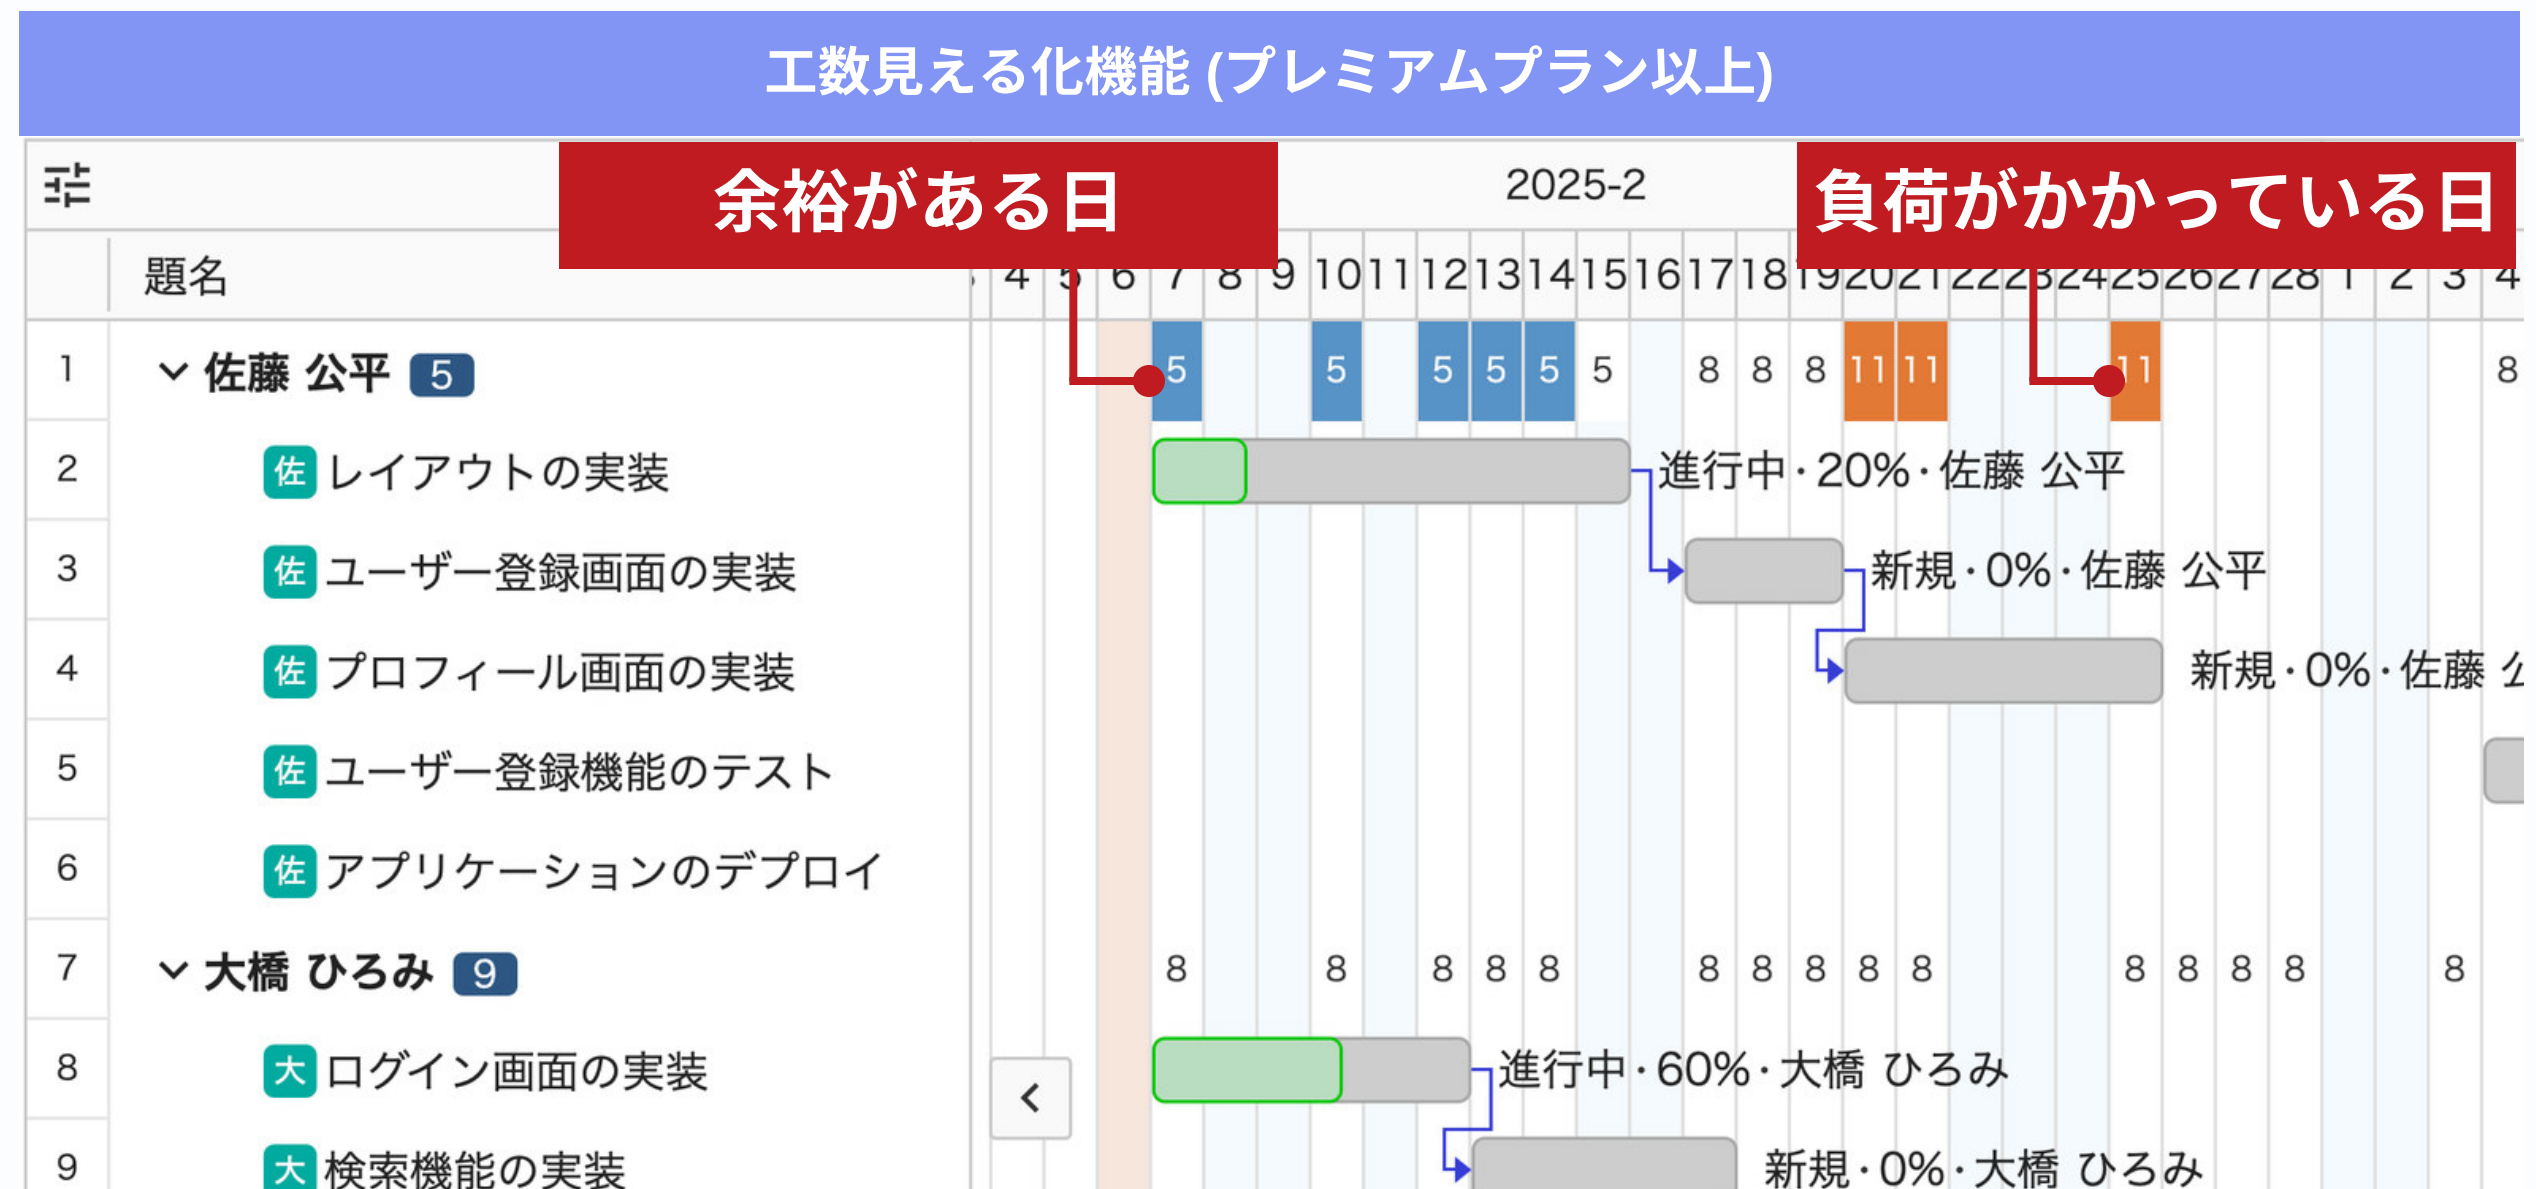



各担当者の作業時間が見える

タスク完了までにかかる労働時間を見積・記録することで、
予定工数と作業工数の差がグラフで表示できます。




预算管理



EVM

進捗・コストの健全性を予測し、問題をいち早く察知

チケットに登録した期日や工数のデータを元に EVM（出来高管理）を集計し計算、グラフにします。
例えば、総コスト（EAC）が当初予算（BAC）の範囲に収まるか、現在の開発ペースから予測できます。

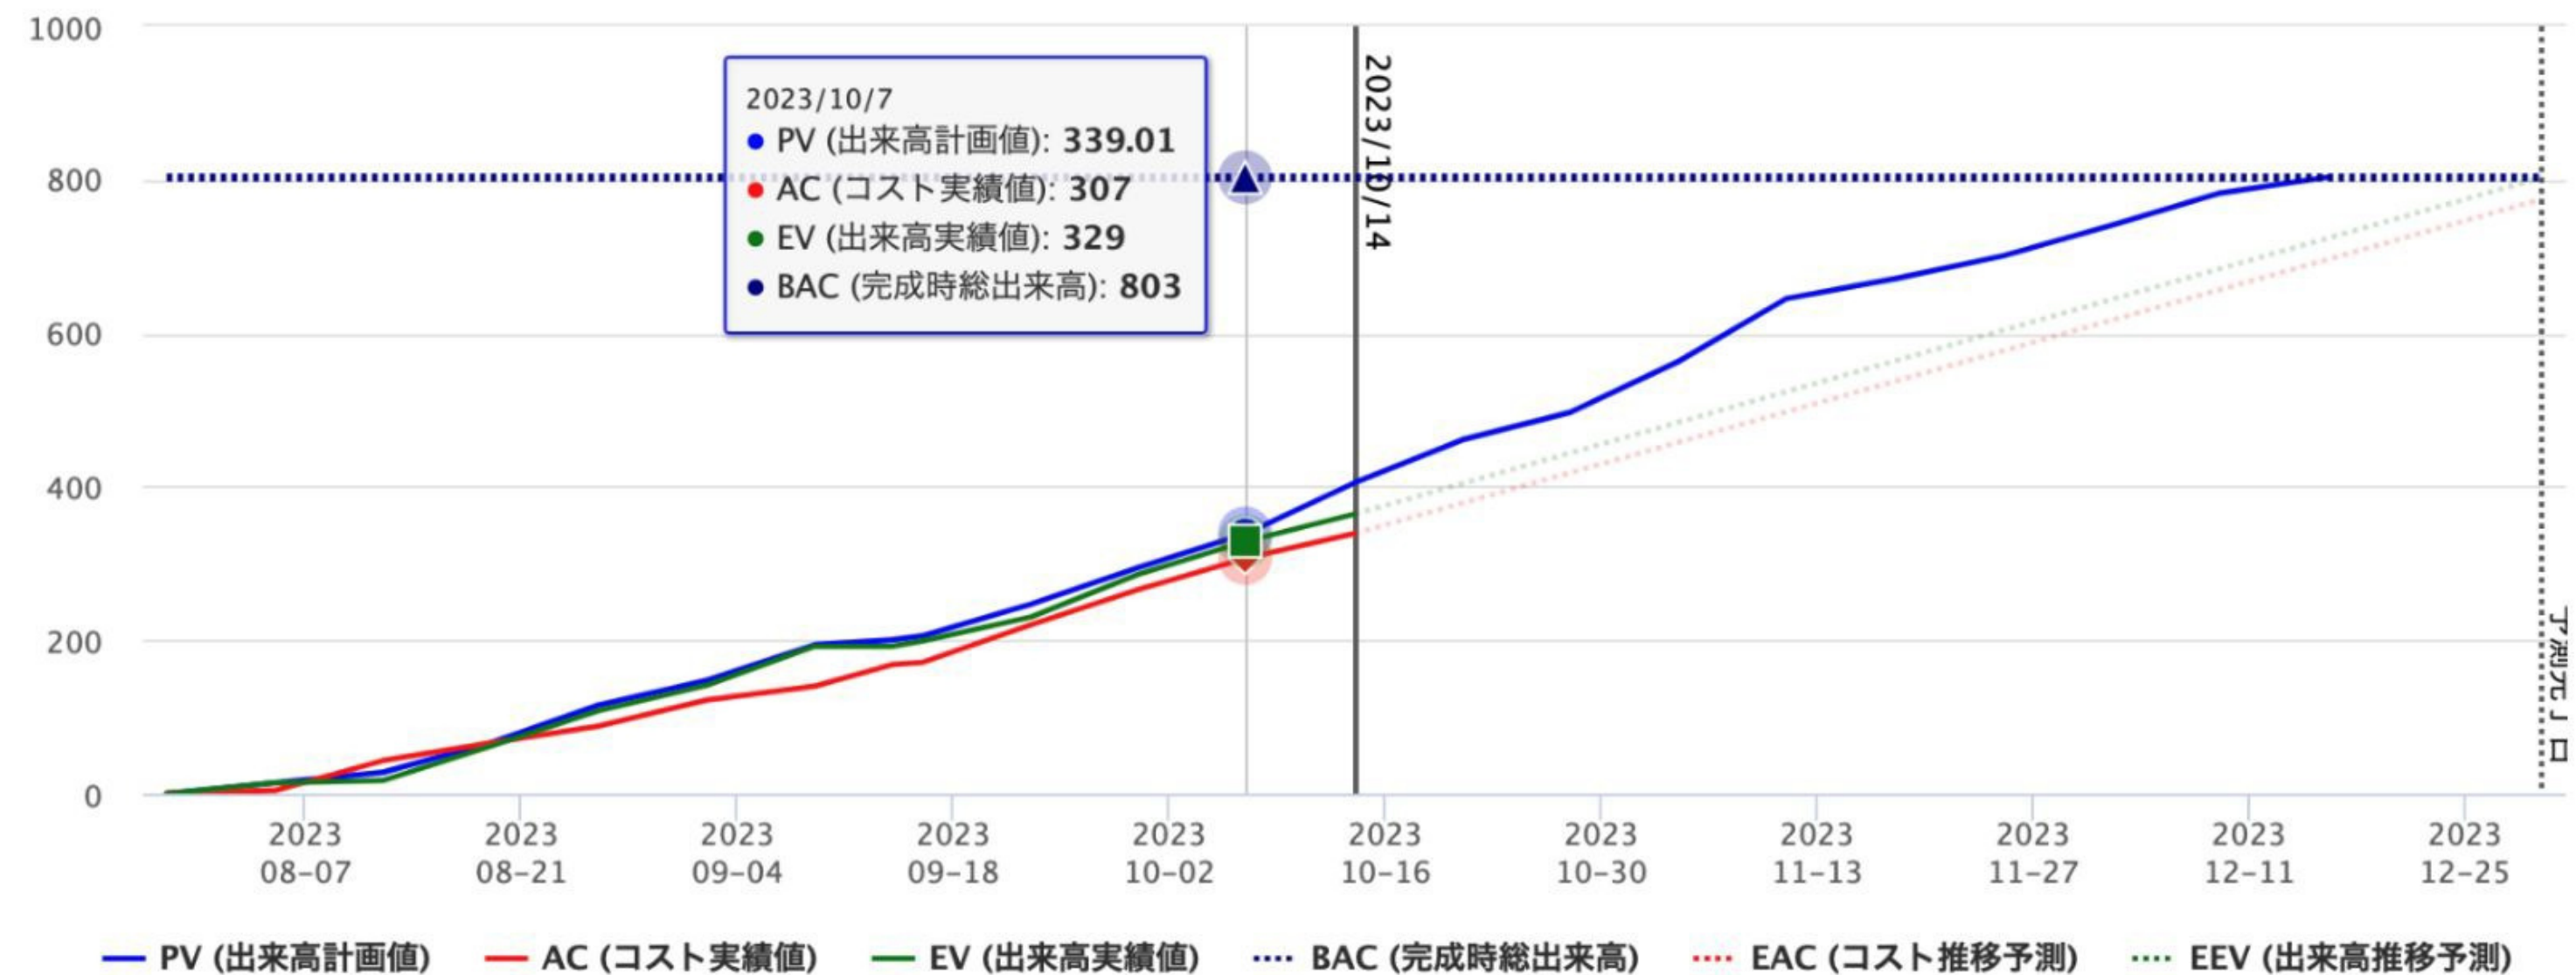




EVM

2つの基準日で進捗・コスト・生産性を比較

工程ごとに進捗・コスト・生産性を比較分析したり、要員増減、開発スコープ変更のタイミング前後で、進捗・コスト・生産性に変化が発生したか否かを分析できます。

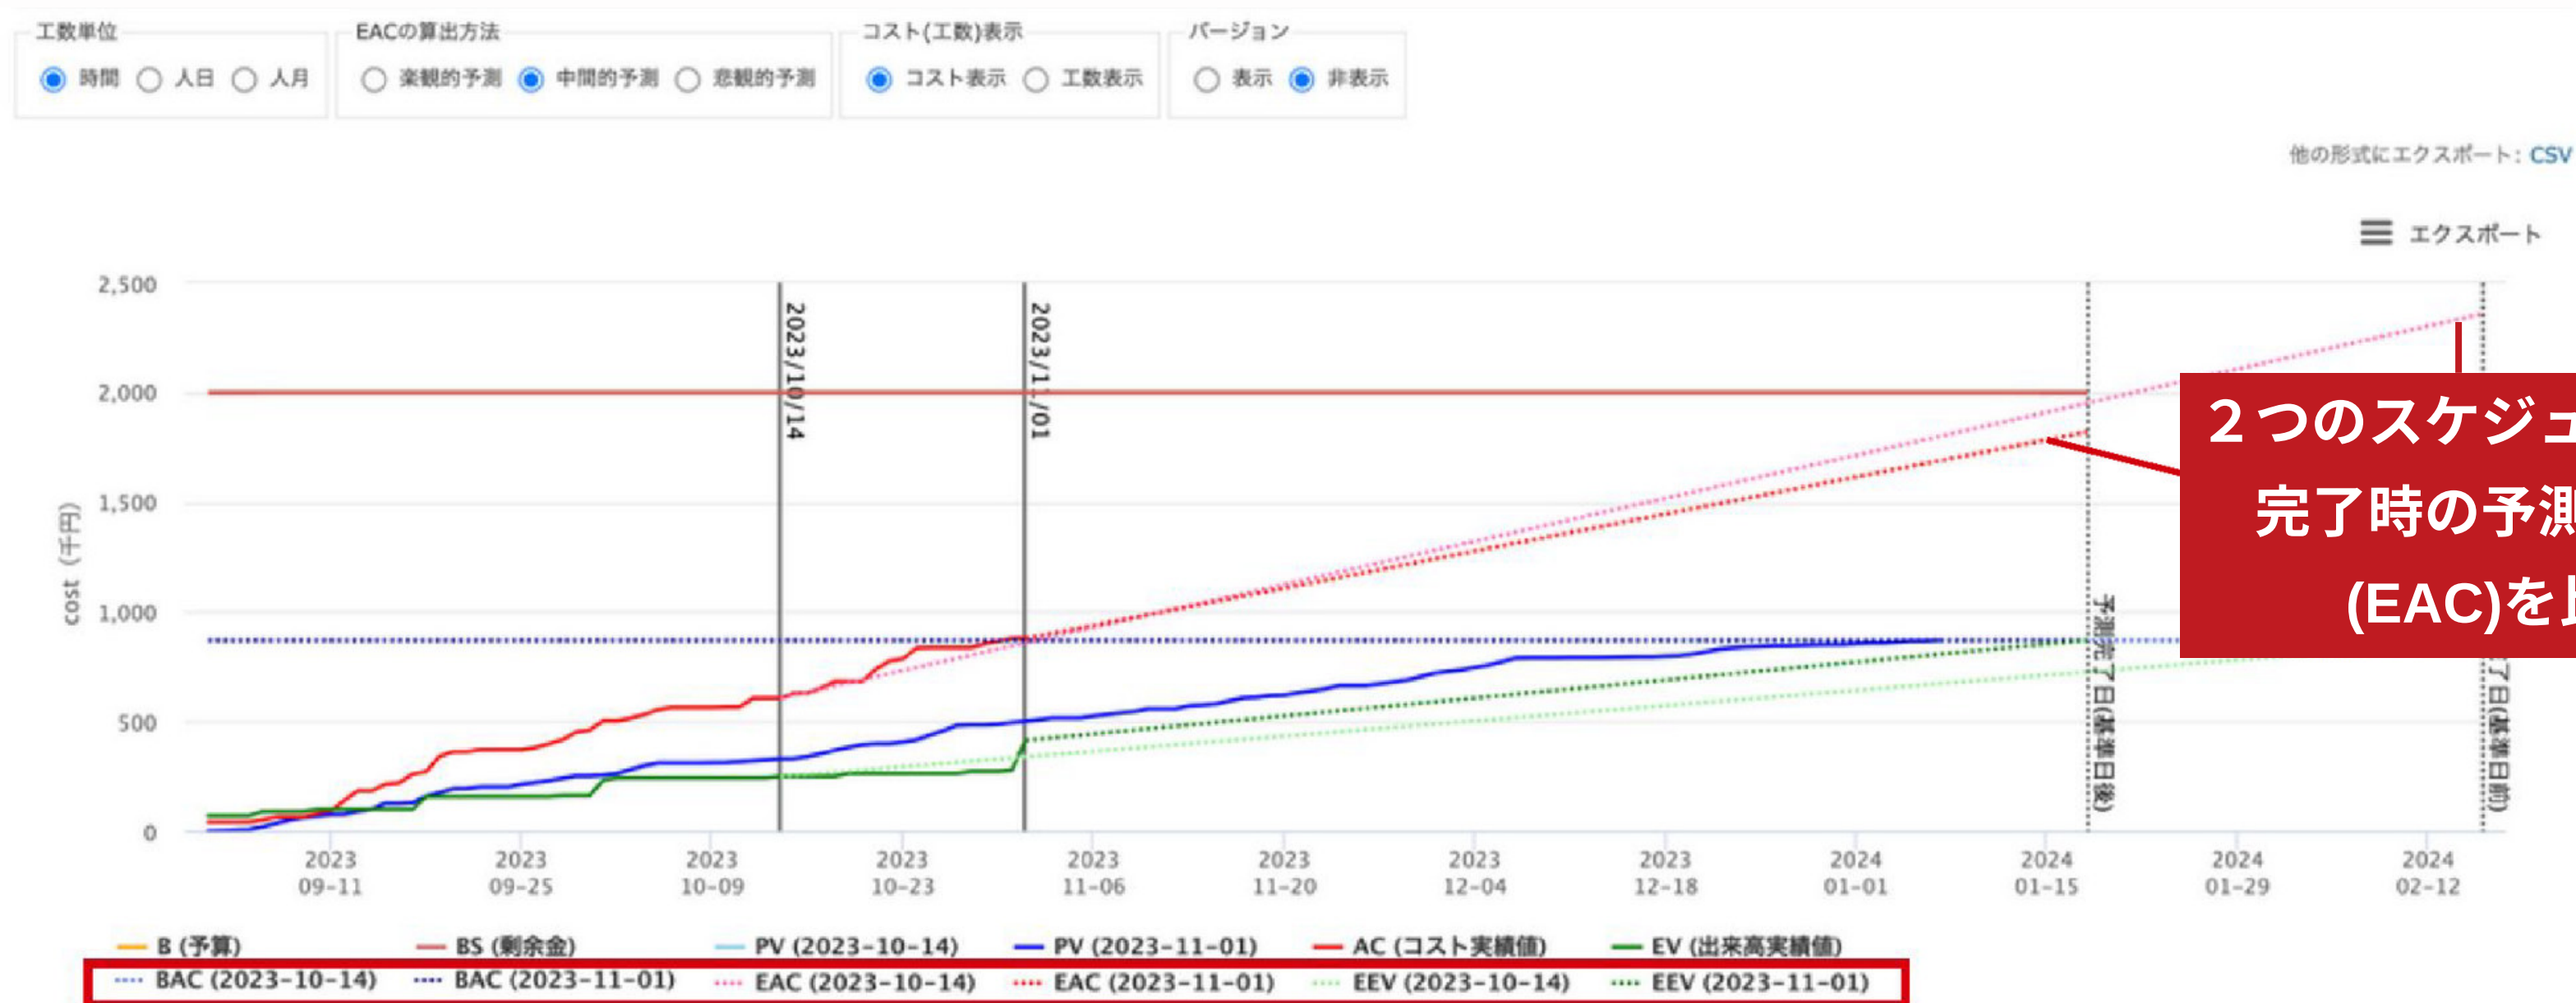





EVM

プロジェクトに係る費用を集約し、金額ベースでグラフ表示が可能

コストグループ別の工数単価を設定しておくことで、その単価をもとに、今まで工数でしか把握できなかったEVMが金額ベースでできるようになり、プロジェクトにする現在の状況や予測がさらに容易になります。

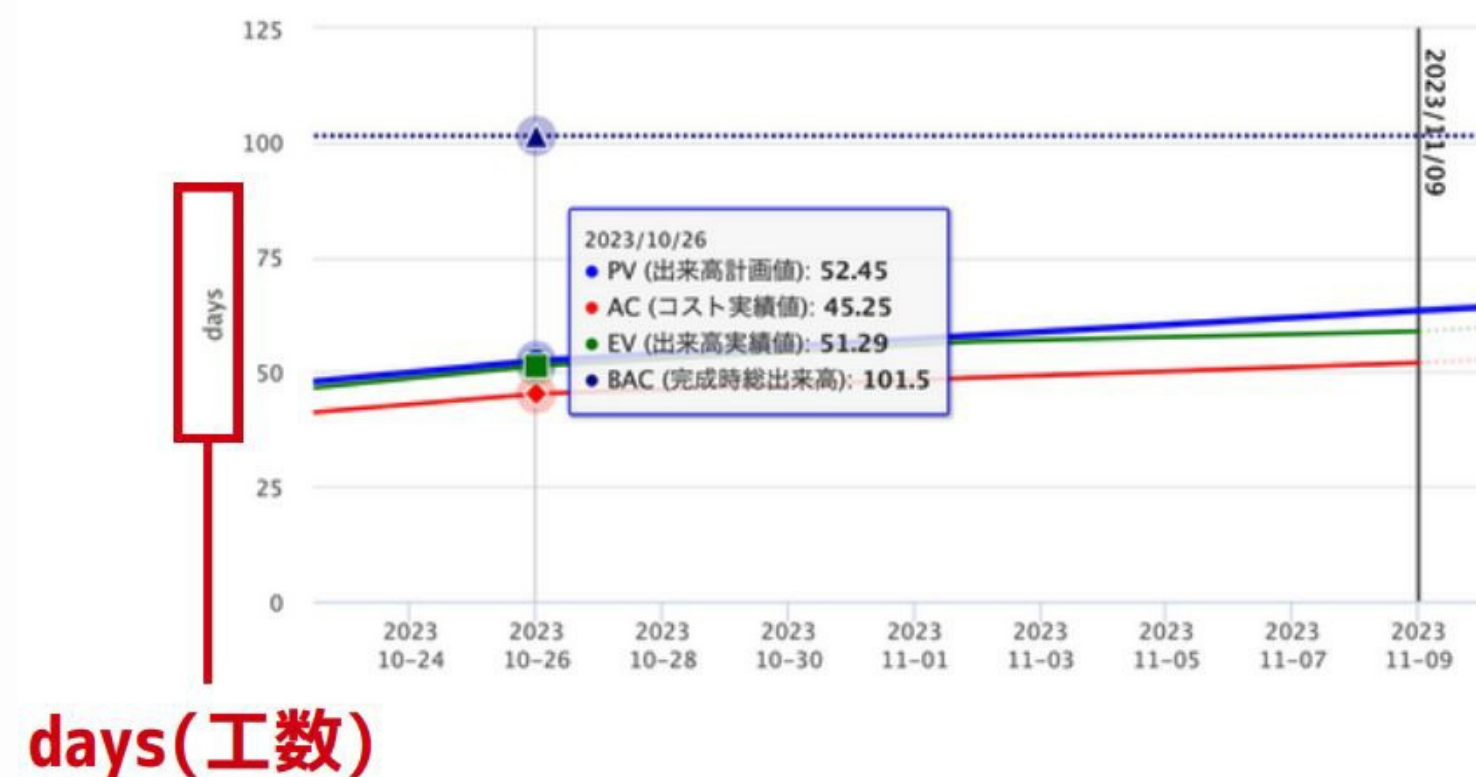

工数表示から
金額表示に

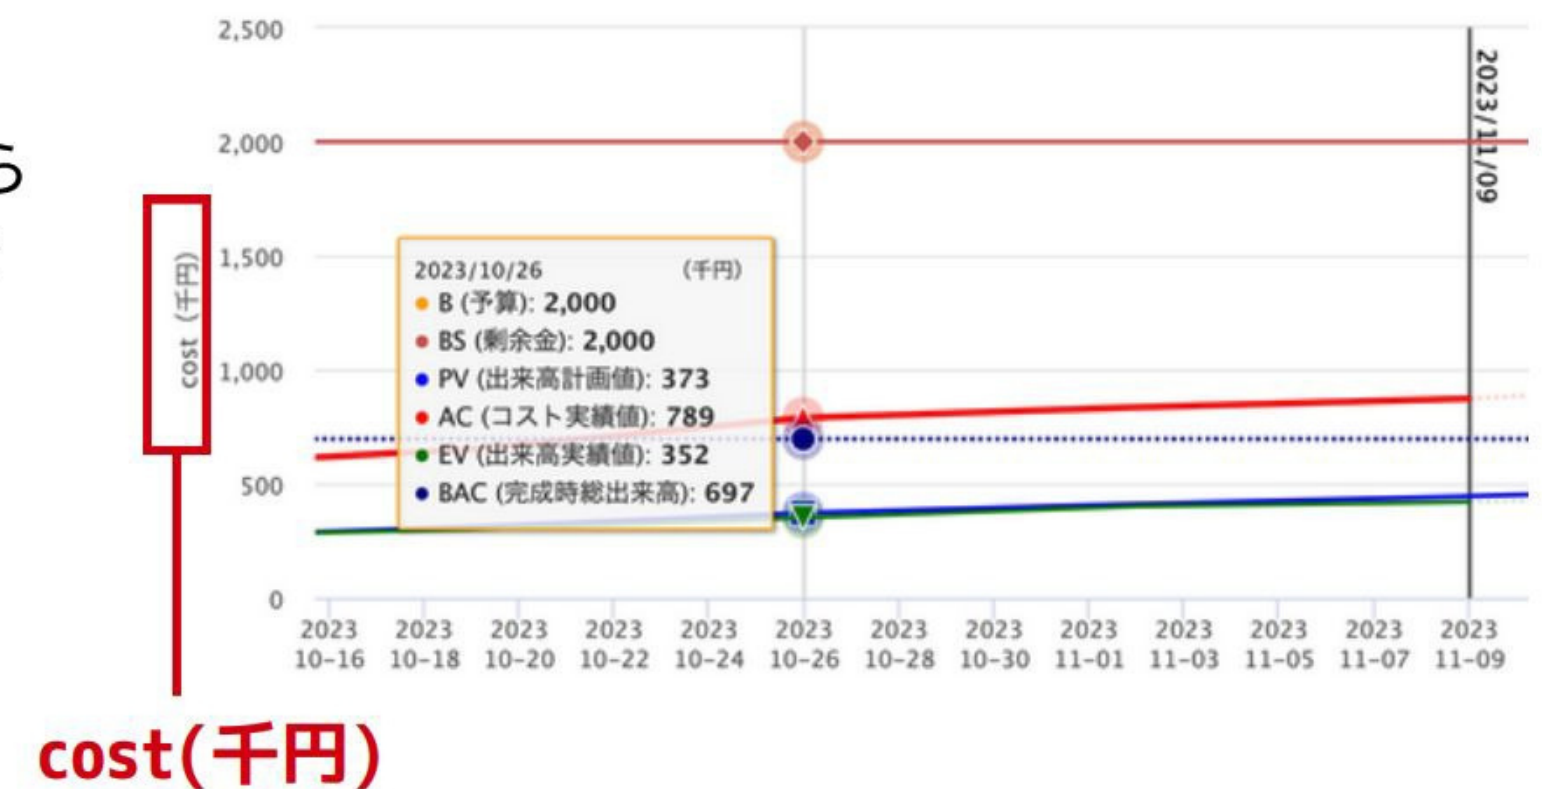




EVM

SPI（スケジュール効率化指数）、CPI（コスト効率化指数）

現在の開発ペースから、納期遅延やコスト増のリスクを事前に検知できます。
(青は進捗が良好、黄色は注意、赤は危険ゾーン)

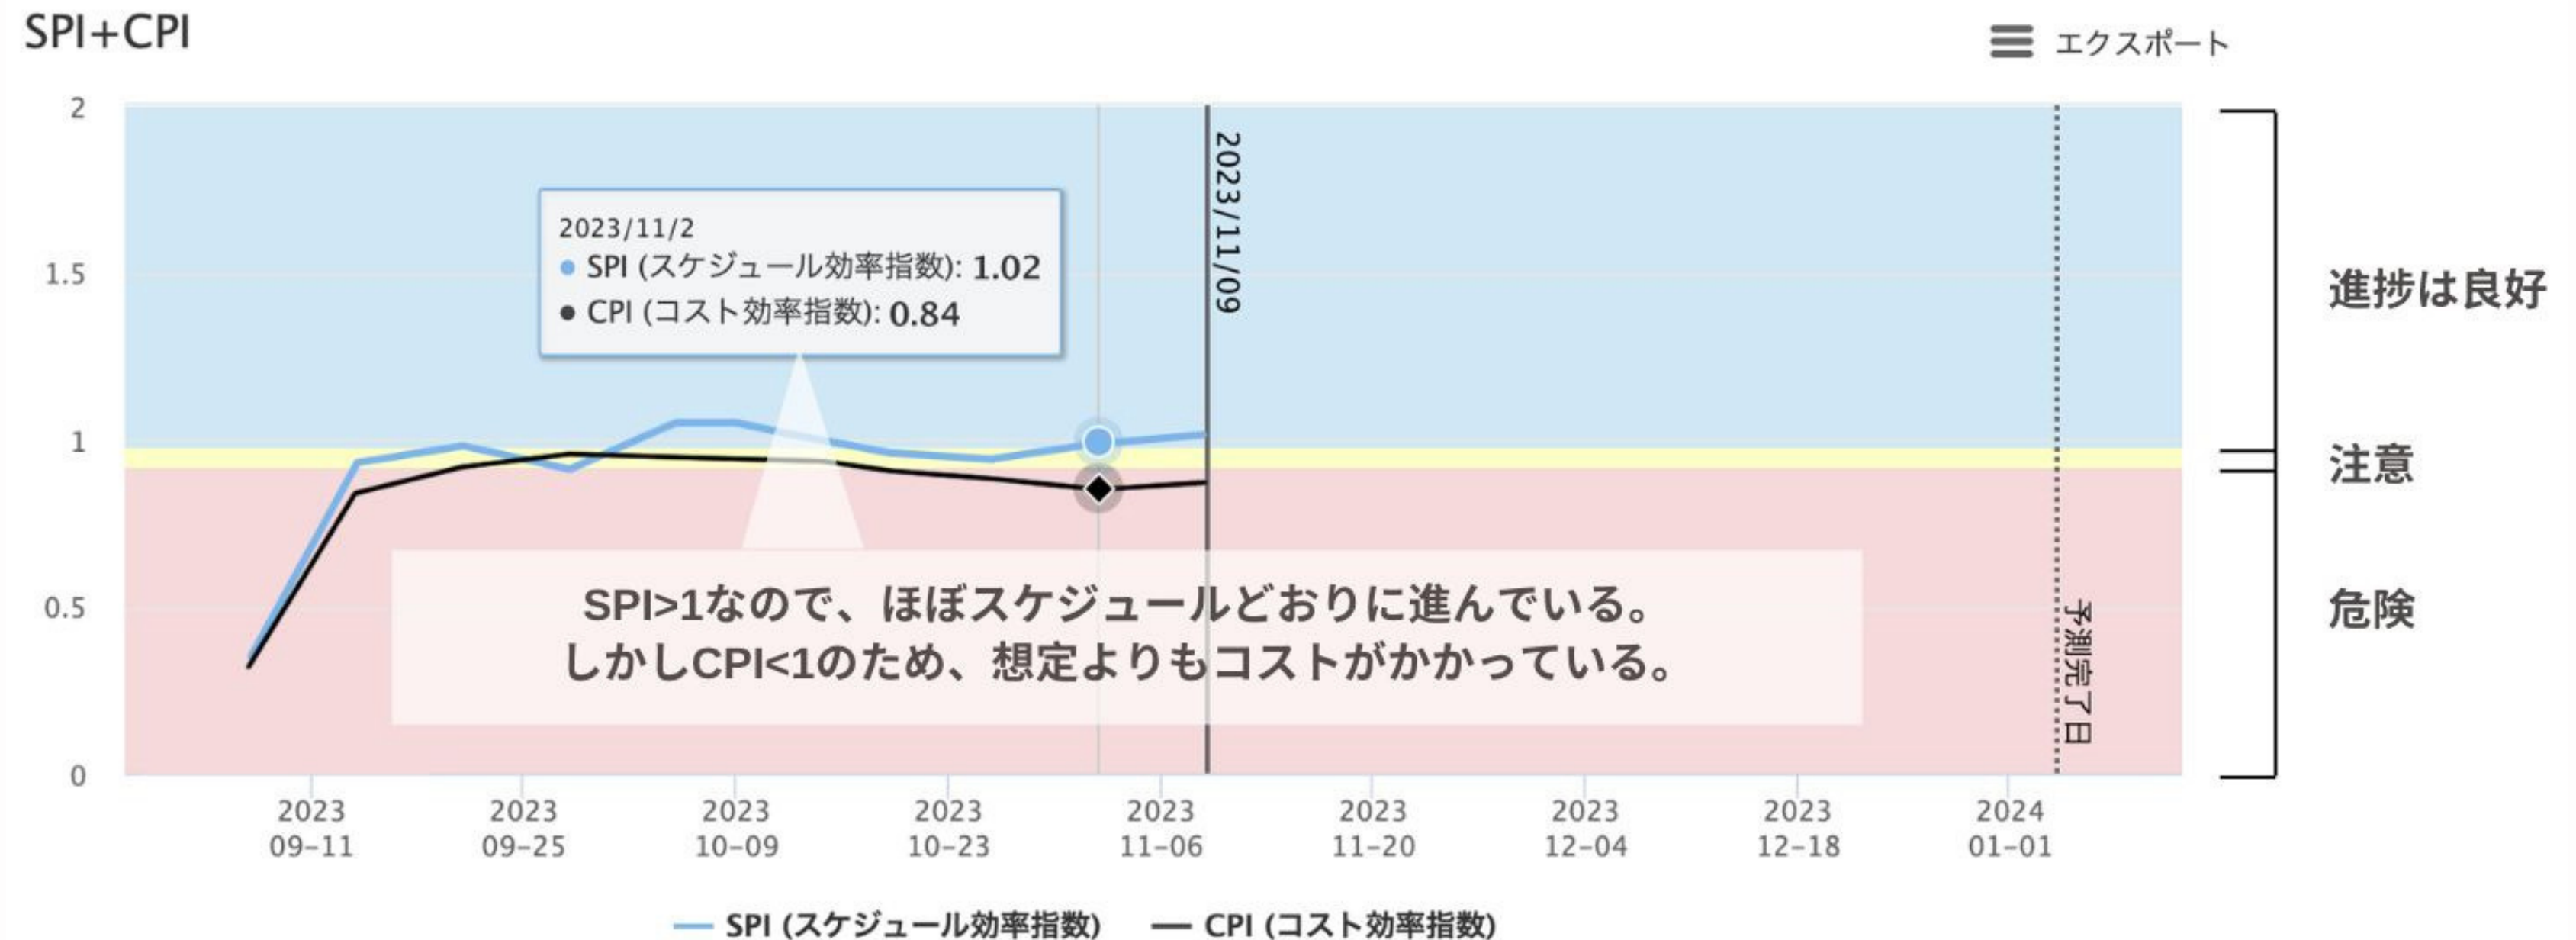

レポート作成



各部門向けごとに表示項目を切り替えられる

部門ごとへの報告資料を作成する手間を大幅に削減します。

品質保証部門向けレポート											
プロジェクト	進捗	テスト 密度 (数 / KLOG)	バグ 密度 (数 / KLOG)	バグ件数	バグ放置 件数 (5日以上)	マイルストーン					
						3月	4月	5月	6月	7月	8月
▼ ABC 商事	101%	67	3	61	11						
販売管理システム開発	108%	150	6	35	7		設計		試験		
営業支援システム開発	100%	50	3	18	3		設計	▼工程会議	試験	▼受入検査	
問合せ管理システム開発	91%	20	1	8	1			▼設計会議 バージョン1		▼設計会議 バージョン2	
▶ 顧客管理システム開発	86%	120	5	32	10		▼工程会議 バージョン1		▼受入検査 バージョン2	▼工程会議	▼受入



各部門向けごとに表示項目を切り替えられる

部門ごとへの報告資料を作成する手間を大幅に削減します。


PMO向けレポート										
プロジェクト	プロジェクト マネージャ	CPI	SPI	予算 コスト予想	マイルストーン					
					3月	4月	5月	6月	7月	8月
▼ ABC 商事	阿闍瑠 一郎	0.99	1.01	34,000,000 25,600,000						
販売管理システム開発	山田 大翔	1.00	1.08	15,000,000 10,000,000		設計		試験		
営業支援システム開発	松本 悠真	0.95	1.00	10,000,000 8,900,000		設計	▼工程会議	試験	▼受入検査	
問合せ管理システム開発	岡田 雄史	1.08	0.91	9,000,000 6,700,000			▼設計会議 バージョン1	バージョン2	▼設計会議	
▶ 顧客管理システム開発	川端 荔枝	0.88	0.86	5,000,000 3,980,000		▼工程会議 バージョン1		▼受入検査 バージョン2	▼工程会議	▼受入



プロジェクトレポート

個別レポートで、目的に応じたレポートレイアウトを作れる

会議に必要なレポートを自動作成。各パネルを自由に選択・配置でき、目的に応じたレイアウトのパターンが作れます。同一種パネルを複数個、表示する内容を変えて表示することもできます。

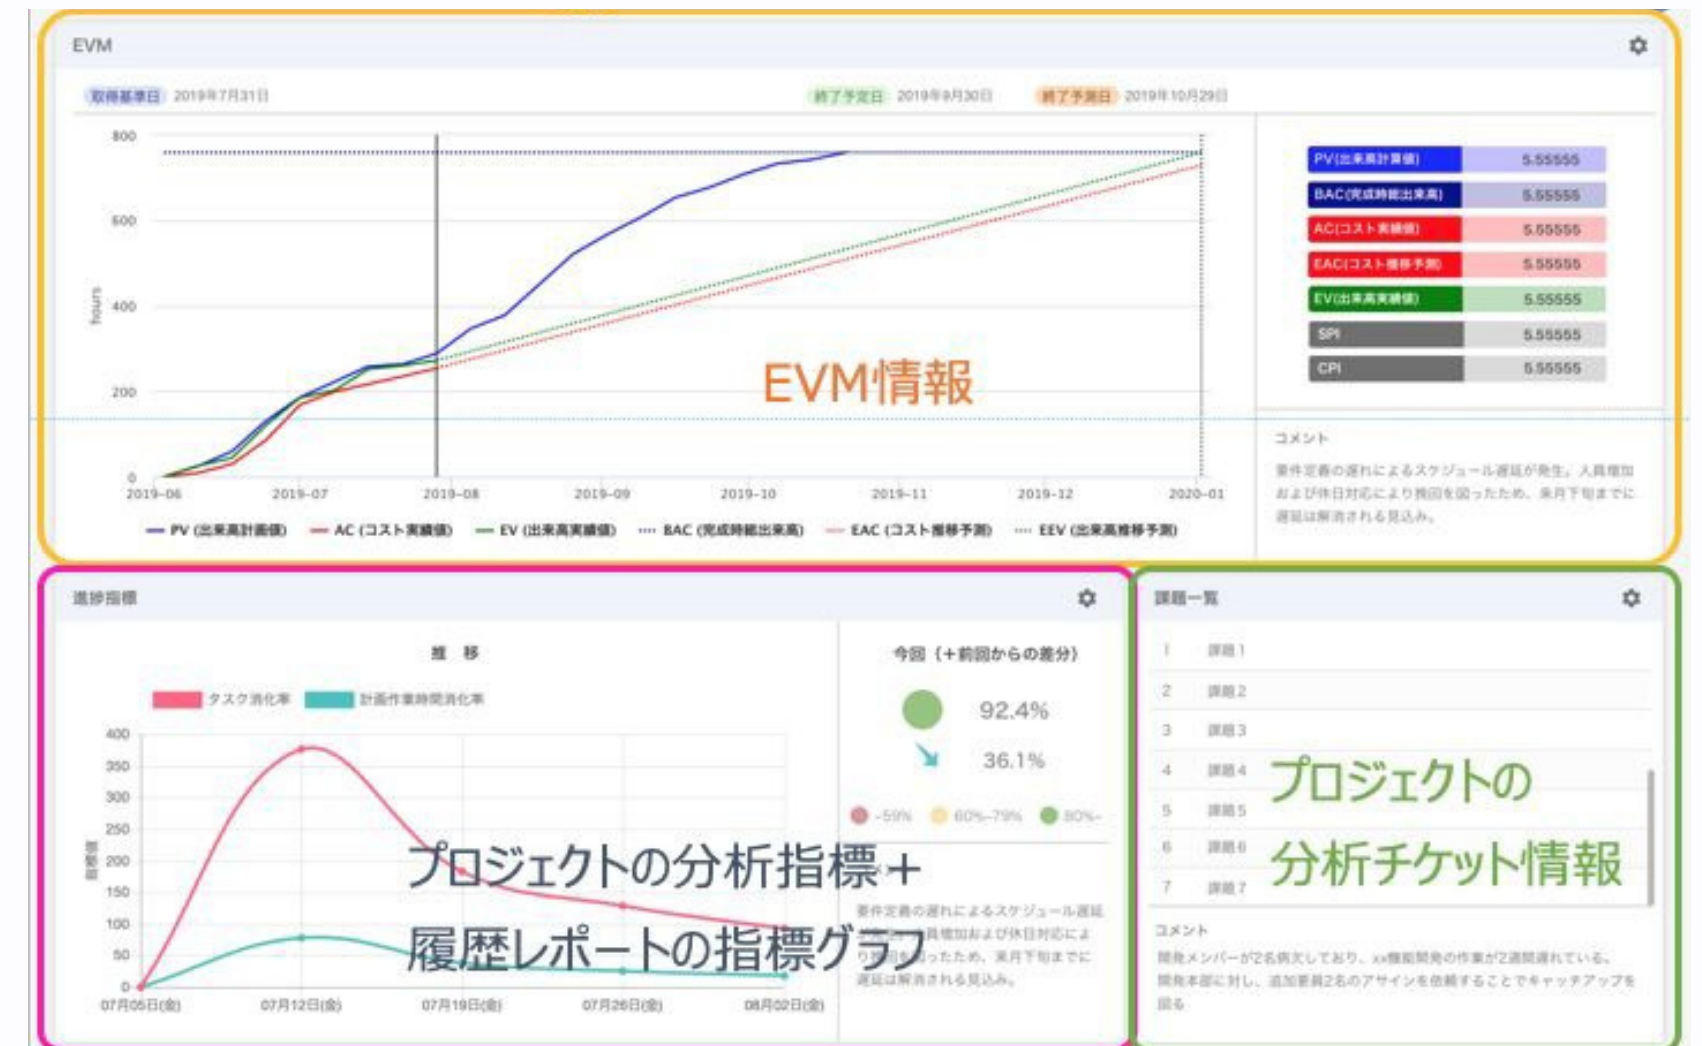




ガントチャート

ガントチャートの画面イメージをそのまま PDF 出力

イナズマ線、クリティカルパス、折り畳んだ状態など、表示されている画面をそのままPDF出力。
報告資料として利用できます。

PC画面

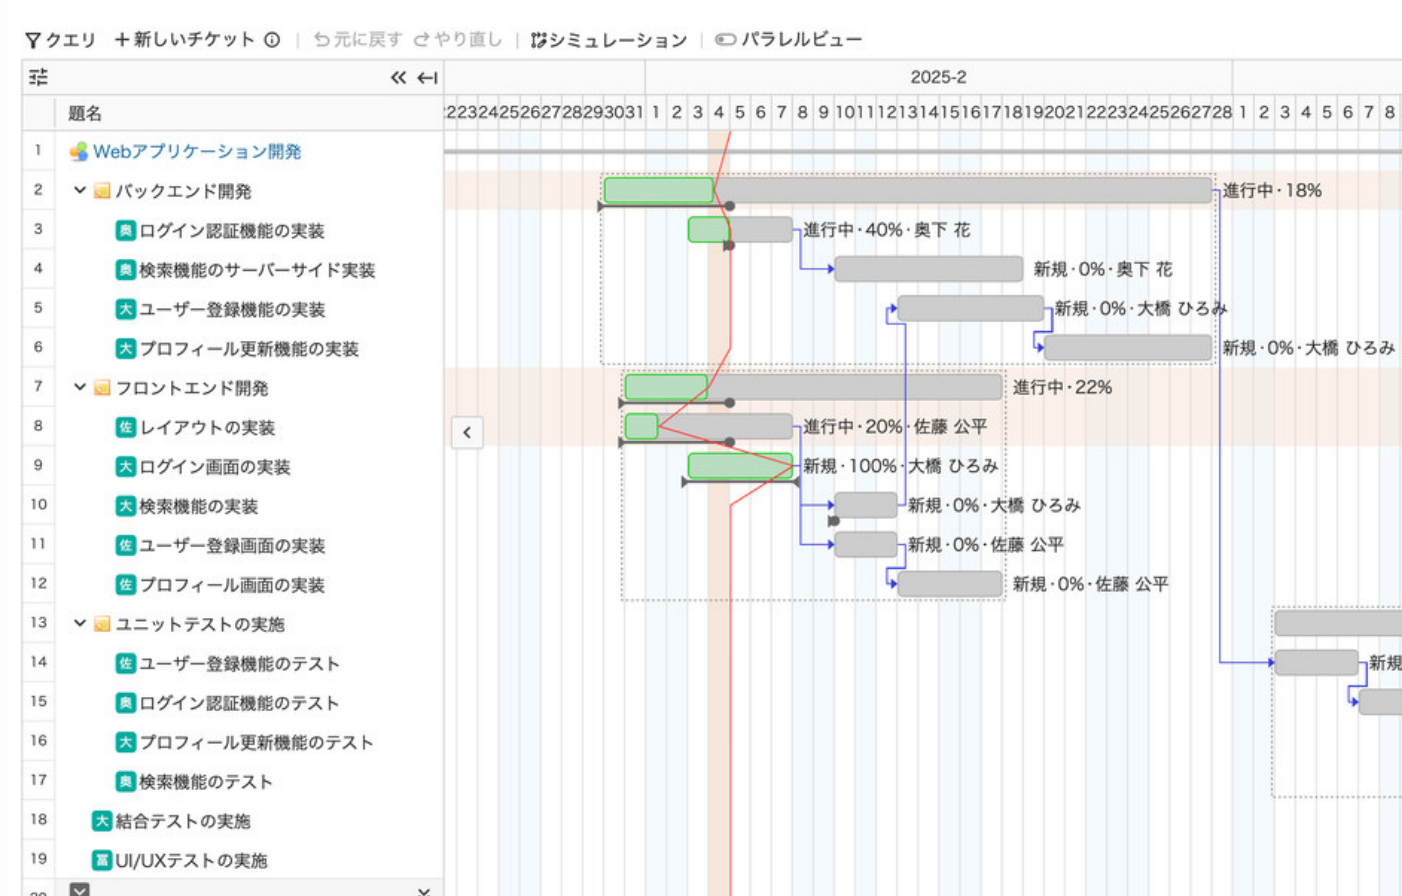


出力



PDF

Webアプリケーション開発

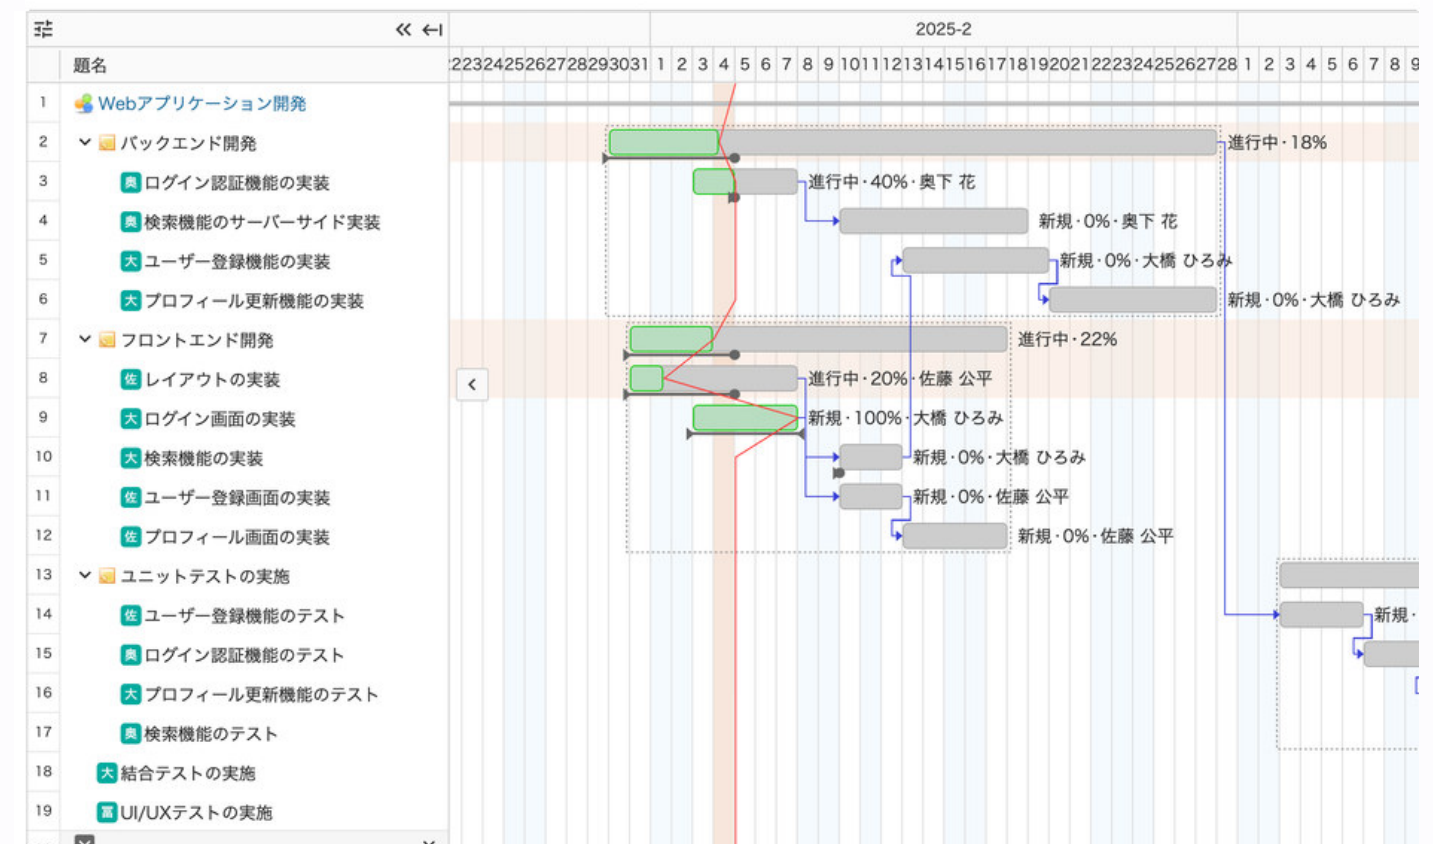

Lychee AI

Lychee AI とは？


Lychee AIは、チームやプロジェクトの状況を分析し、メンバーが気づきにくいタスクの遅れや偏りをAIが教えてくれる“**判断支援AI**”です。

対話型で「**チームの気づきを増やすAI**」として、日々のプロジェクト運営に寄り添います。

The screenshot displays the Lychee AI interface. On the left, a 'マイページ' (My Page) section includes a 'スタートアップガイド' (Startup Guide) and a list of tasks under '担当しているチケット (8)'. The tasks are as follows:


#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	題名
5433	テストプロジェクト_202509	機能	進行中	AIファシリテーター機能のプロトタイプ
5427	テストプロジェクト_202509	機能	新規	感情分析による議論ヒートマップ
5429	テストプロジェクト_202509	機能	新規	マルチモーダル入力対応 (音声+テキスト)
5426	テストプロジェクト_202509	機能	新規	AIアシスタントによる議題整理機能
5425	テストプロジェクト_202509	機能	新規	音声認識機能の精度向上
5435	テストプロジェクト_202509	機能	新規	タスク管理ツール連携機能

On the right, an 'AIアシスタント' (AI Assistant) chat window is open. It features a search bar, a list of suggested topics like '要返信チケット' and '今日のタスク', and a text input area for messages. A small robot icon is visible at the bottom right of the chat window.



チャットで完結する直感的な操作

画面上に出現するチャットパネル「AIアシスタント」から、AIに話しかけるだけでチケットの作成・更新・検索・スケジュール調整が可能。


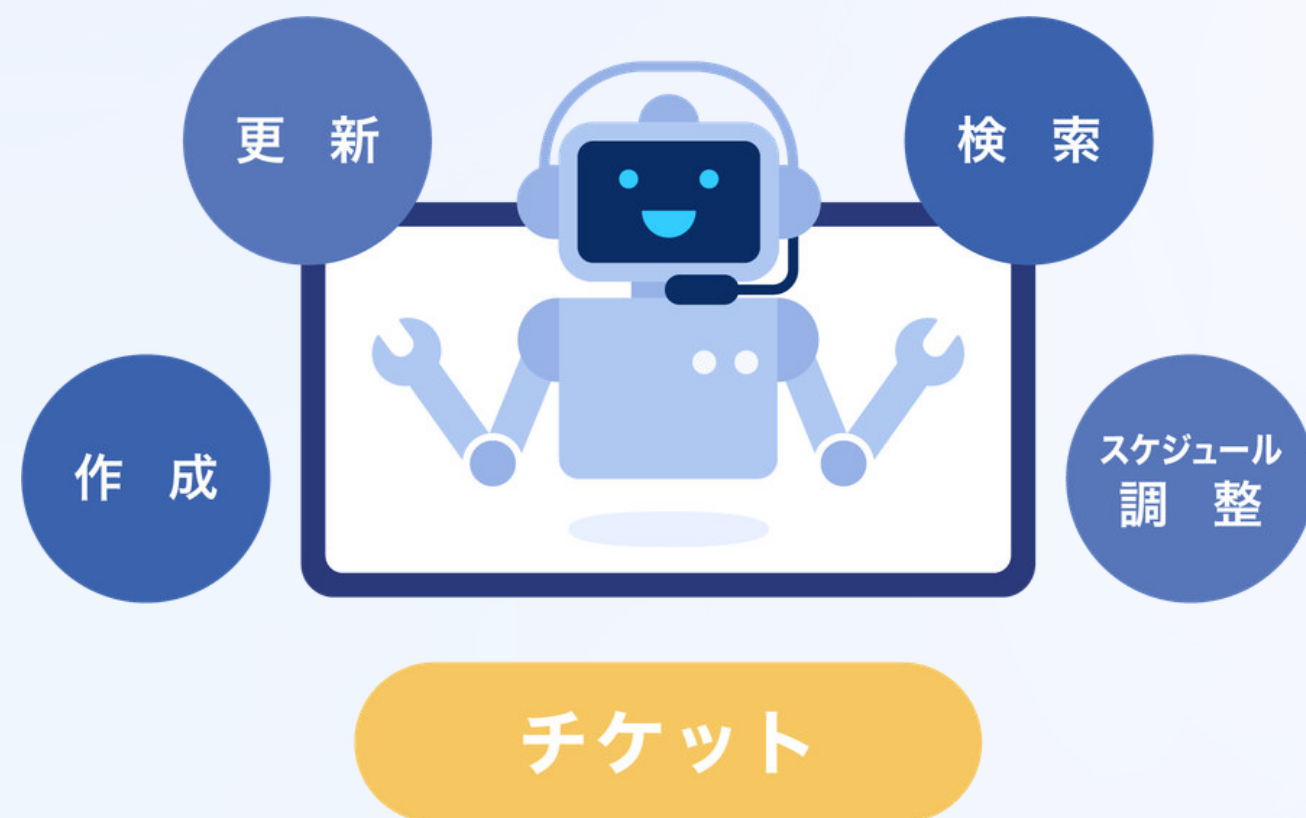


プロジェクト管理・タスク管理に慣れていない方もわかりやすいよう、チャットメニューにはよく使う質問をご用意。ボタンひとつでAIに指示を出すこともできます。



今日やるべきタスクを自動抽出



AIが担当チケットを分析し、「今日やるべきこと」「期限が迫っていること」をリスト化。
PM（プロジェクトマネージャー）の指示がなくてもメンバーが1日の全体像を把握できるので
毎日のスタートがスムーズになります。

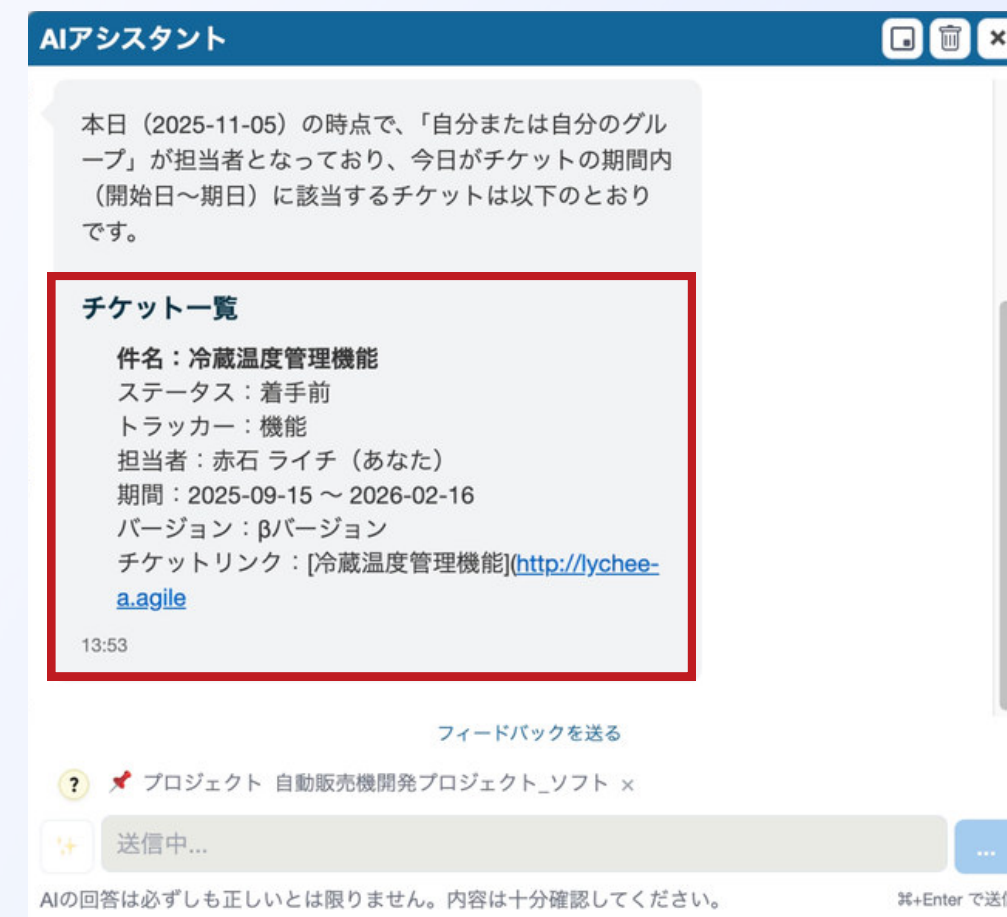


PM・PMO（プロジェクト・マネジメント・オフィス）の判断を強力にサポート

AIがタスクの進行状況やコメント内容进行分析し、「プロジェクト状況」「遅れそうなプロジェクト」「負荷が偏っているメンバー」を検出。分析にかけていた時間を圧縮します。

“人がデータを探して・見て判断する”から、“AIが情報を探して判断のきっかけをくれる”へ。

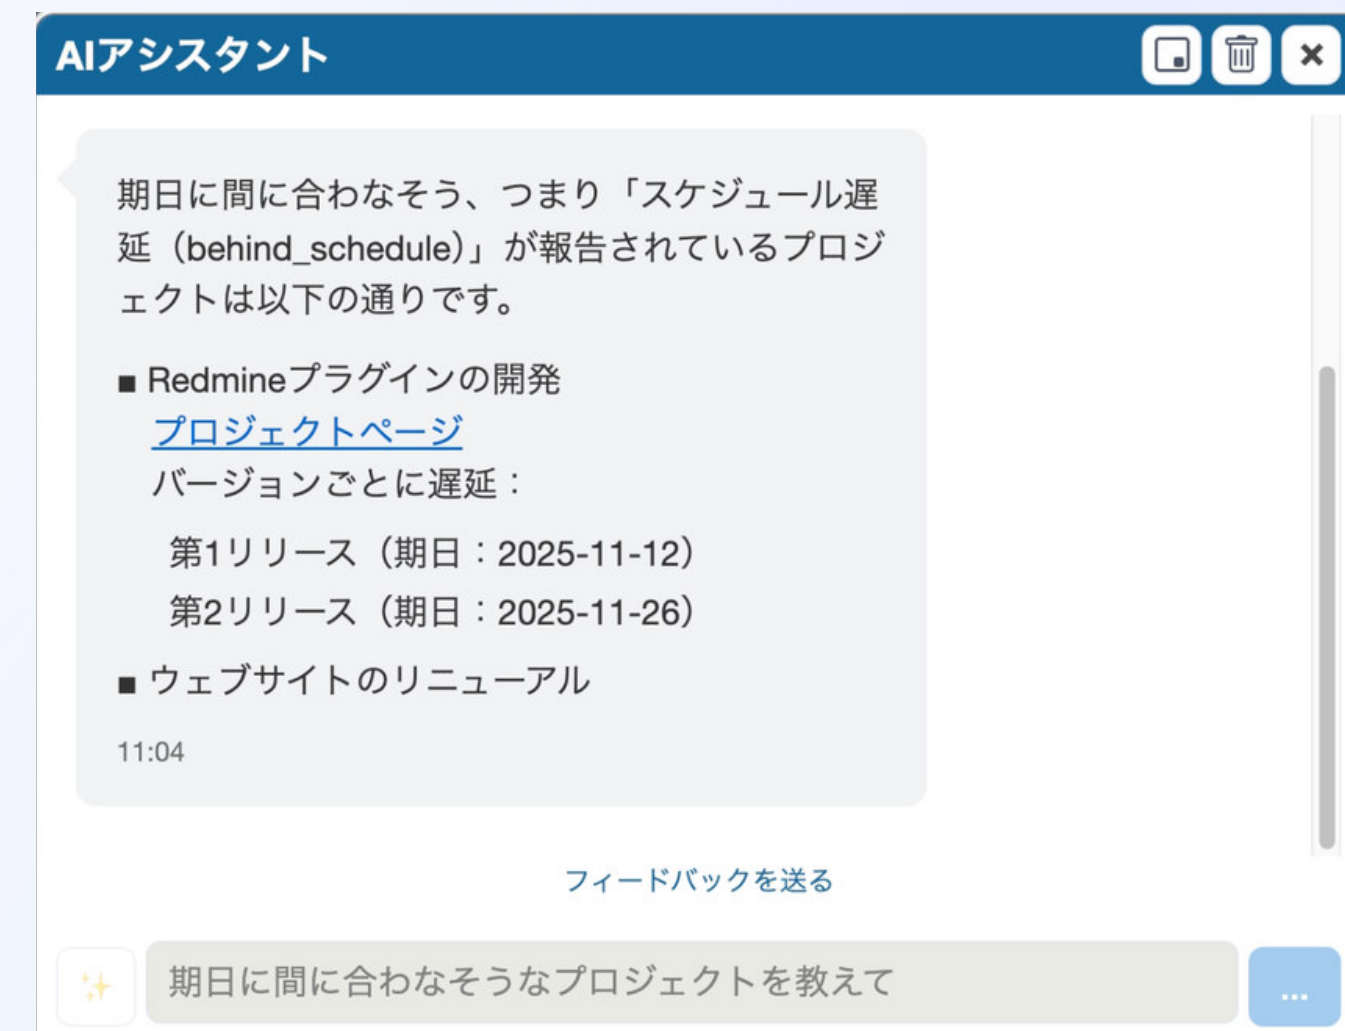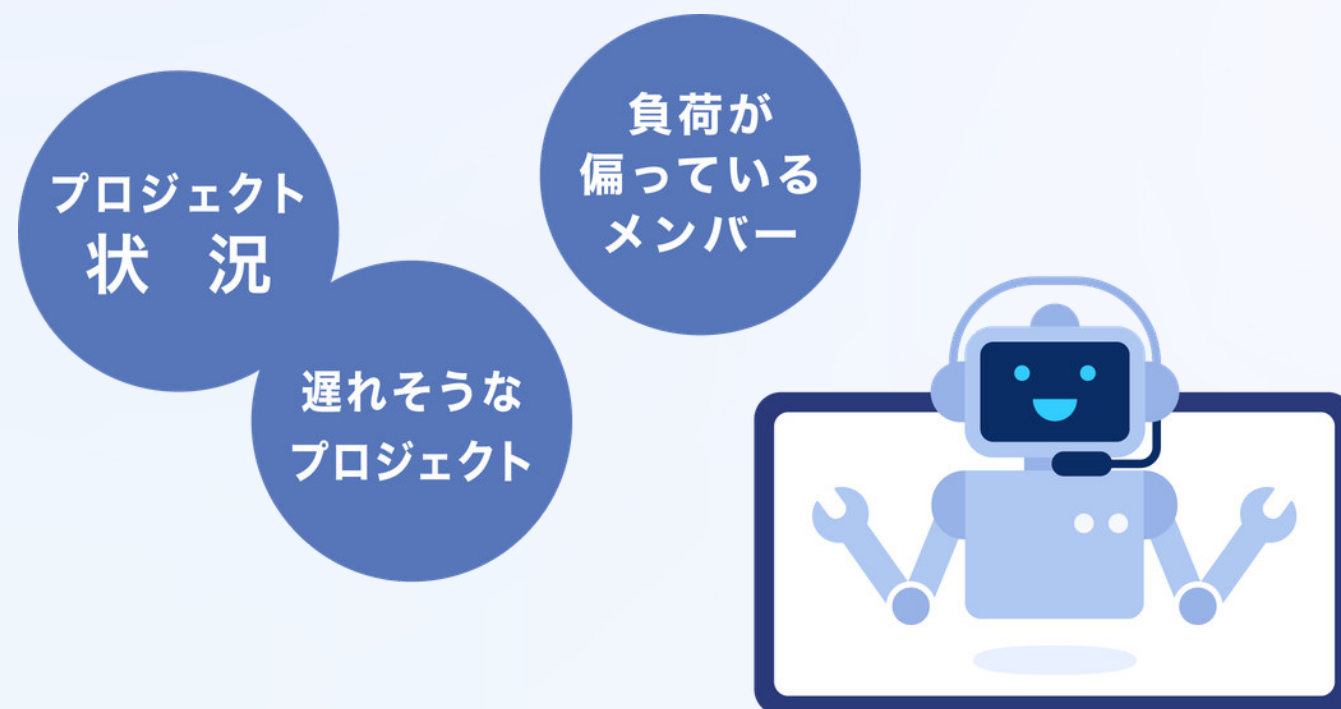

集計対象について



集計対象について

Lychee AIは通常50件、指定すれば最大100件ずつしかチケットを読み込みできません。

集計が必要になる場合は、100件ずつになるようお願いいたします。


良い例

- 「リスク」トラッカーかつ期日が切れているチケットで、優先度が高い順に100件を表示して
- まず絞り込み条件を指定し、ソートをかけた上で上位100件を取得している
- 「次の100件を表示して」と依頼すると、ページネーションのように表示も可能です

チケットが正しく集計されない例

- 期日切れのチケット数が多い順にプロジェクトを一覧表示してください
- 件数の指定がなければ、チケットの最終更新日順に50件取得
- 該当のチケットが50件以上あれば正しくない結果に・・・

対応プランとデータの取り扱いについて




対応プラン

クラウド版（スタンダード／プレミアム／ビジネス）

※OpenAIまたはAzure OpenAIとAPI契約が必要です。

ご契約のAPIキーをLychee Redmineに設定することでAI機能が有効になります。



データの取り扱いについて


Lychee独自のAIではないため、AIへの入力内容やプロジェクト情報が学習や再利用に用いられることはありません。

また、API提供元であるOpenAIおよびMicrosoft Azure OpenAIも、API経由で送信されたデータをモデル学習に使用しない旨を公式に明示しています。

詳細は以下をご確認ください。

- [OpenAI公式：データ利用ポリシー（英語）](#)
- [Microsoft Azure OpenAI：FAQ（日本語）](#)


安心してご利用いただくために



AIが参照する権限について

Lychee AIは、指示を出したユーザーの権限範囲内で動作します。

そのユーザーに付与されている権限に基づいて、プロジェクトやチケットの閲覧・更新・作成などを行うため権限を超えた操作やアクセスはできません。




回答内容の信頼性について

Lychee AIの回答内容はAIによる生成結果であり、誤った情報を返す場合があります。

AIからの回答はLychee Redmineの公式サポート対象外となります。

内容をご確認のうえ、ご利用ください。



操作安全性について

Lychee AIでは、ユーザーが意図しない操作が実行されることはありません。

- AIが自動的に操作を行うことはありません。
- チケットの作成・更新・削除などを行う場合は、**必ず確認を求めるメッセージが表示され利用者の承認後に実行されます。**



もっとアジャイル開発に寄り添った

Neoバックログ



Neoバックログとは

「Neoバックログ」は、プロダクトバックログの管理・スプリントプランニングをサポートする機能です。

タスクの優先順位を並び替えるだけで、チームの実績ペースに基づき「いつ頃どこまで届けられるか」の見通しを自動で再計算します。

計画調整の手間を減らすことで、本来の目的である「価値ある製品づくり」に集中できる環境づくりを支援します。



1. 自動スプリント計画により優先順位の並び替えに集中できる

チームの実力（平均ベロシティ）を元に、
バックログアイテムの並び替えと連動して各スプリントの割り当てを自動で再計算します。

バックログアイテムの優先順位を変えるたびに、
「プロダクトのロードマップやリリースまでのスケジュールを見直す」という作業から解放されます。

The screenshot displays the Neo Backlog interface, showing two views of a backlog. The left view shows a backlog with items for '3/4-3/17' (6pt) and '3/18-3/31' (9pt). The right view shows the same backlog after a re-estimate, with the '3/4-3/17' item now at 7pt and the '3/18-3/31' item at 13pt. An orange arrow points from the '3/18-3/31' item in the left view to the '3/4-3/17' item in the right view, indicating a re-estimate action.

Left View (Initial State):

- 3/4-3/17 (6pt):** 共有された写真を見てみんなでわいわいできる (3 pt) - 進行中
- 3/18-3/31 (9pt):** 読者として、共有された写真にコメントしたい。なぜなら、「大きくなったね」など感想を伝えたいから。 (3 pt) - 家族と写真を共有してつながれる
- 3/18-3/31 (9pt):** 投稿者として、コメントやいいねがついたら通知がほしい。なぜなら、見た人の反応に気づきたいから。 (3 pt) - 大切な更新を見逃さない
- 3/18-3/31 (9pt):** 読者として、写真を日付で自動グループ化してほしい。なぜなら、手動で整理しなくても時系列で振り返りたいから。 (8 pt) - 写真をアップロード・整理して振り返れる
- 3/18-3/31 (9pt):** 読者として、写真にいいねをつけたい。なぜなら、お気に入りの写真を気軽にリアクションしたいから。 (1 pt) - 家族と写真を共有してつながれる

Right View (After Re-estimate):

- 3/4-3/17 (7pt):** 共有された写真を見てみんなでわいわいできる (3 pt) - 進行中
- 3/18-3/31 (13pt):** 読者として、共有された写真にコメントしたい。なぜなら、「大きくなったね」など感想を伝えたいから。 (3 pt) - 家族と写真を共有してつながれる
- 3/18-3/31 (13pt):** 読者として、写真にいいねをつけたい。なぜなら、お気に入りの写真を気軽にリアクションしたいから。 (1 pt) - 家族と写真を共有してつながれる
- 3/18-3/31 (13pt):** 投稿者として、コメントやいいねがついたら通知がほしい。なぜなら、見た人の反応に気づきたいから。 (3 pt) - 大切な更新を見逃さない
- 3/18-3/31 (13pt):** 読者として、写真を日付で自動グループ化してほしい。なぜなら、手動で整理しなくても時系列で振り返りたいから。 (8 pt) - 写真をアップロード・整理して振り返れる

2. 「一画面完結」で「操作がサクサク」の心地よい操作性

プランニングイベントやデイリーミーティングにおいて、
ツールの画面を切り替える時間は、チームの思考や会話を止めてしまう要因になります。
すべての操作が一画面で完結する「ストレスフリーな操作感」を追求しました。

The screenshot displays the Neo Backlog interface, which is designed for seamless navigation and task management. The interface is divided into two main sections: a task list on the left and a detailed task view on the right.

Task List (Left Panel):

- Header:** Includes a toggle for "終了スプリントを表示" (Show completed sprints), a "Debug" button, and a velocity indicator "ベロシティ: 13pt".
- Task 1:** "3/4-3/17 共有された写真を見てみんなでわいわいできる 7pt". The task description is "閲覧者として、共有された写真にコメントしたい。なぜなら、「大きくなったね」など感想を伝えたいから。". It is marked as "進行中" (In Progress) and has a sub-task "家族と写真を共有してつながれる".
- Task 2:** "1 pt". The task description is "閲覧者として、写真にいいねをつけたい。なぜなら、お気に入りの写真を気軽にリアクションしたいから。". It is marked as "新規" (New) and has a sub-task "家族と写真を共有してつながれる".
- Task 3:** "3 pt". The task description is "投稿者として、コメントやいいねがついたら通知がほしい。なぜなら、見た人の反応に気づきたいから。". It is marked as "新規" (New) and has a sub-task "大切な更新を見逃さない".
- Task 4:** "3/18-3/31 13pt". The task description is "閲覧者として、写真を日付で自動グループ化してほしい。なぜなら、手動で整理しなくても時系列で振り返りたいから。". It is marked as "新規" (New) and has a sub-task "写真をアップロード・整理して振り返れる".

Task Detail View (Right Panel):

- Header:** Shows the task ID "#6237" and a close button "X Esc".
- Description:** "閲覧者として、共有された写真にコメントしたい。なぜなら、「大きくなったね」など感想を伝えたいから。".
- Tracker:** Shows "機能" (Feature) as the tracker and "進行中" (In Progress) as the status.
- Tags:** Includes a tag "家族と写真を共有してつながれる".
- 説明 (Description):** "共有写真にテキストコメントを投稿できる機能。"
- チェックリスト (Checklist):**
 - 写真に対してコメントを投稿できる (Completed)
 - コメントの編集・削除ができる (自分のコメントのみ) (Completed)
 - コメントは時系列で表示される (In Progress)
 - 絵文字入力に対応 (In Progress)
- Footer:** Includes a text input field "コメントを追加..." and a "送信" (Send) button.

3. スプリントゴールを常に可視化

日々たくさんのタスクに向き合っていると、「チケットを終わらせること」が目的になり、
本来届けたかった価値を見失ってしまうことがあります。
スプリントの目的である「ゴール」を画面上部に常時表示、
今取り組んでいる作業がどの価値につながっているのかを、全員がいつでも確認できます。

↑ 終了スプリントを表示

3/4-3/17
7pt

共有された写真を見てみんなでわいわいできる

3 pt

閲覧者として、共有された写真にコメントしたい。なぜなら、「大きくなったね」など家族と写真を共有してつながれる

1 pt

閲覧者として、写真にいいねをつけたい。なぜなら、お気に入りの写真を気軽にリア家族と写真を共有してつながれる

3 pt

投稿者として、コメントやいいねがついたら通知がほしい。なぜなら、見た人の反応



スプリント実行をサポート！

Neoカンバン



Neoカンバンとは

Neoカンバンは、「Neoバックログ」とセットで使う、アジャイル開発のスプリント実行に特化したカンバンボード機能です。Neoバックログでスプリントゴールと優先順位を決めたあと、Neoカンバンで「いま何に向き合い、どこまで前へ進んだか」を一画面で見える化します。スプリントゴールを画面上部に常時掲げながら、ドラッグ&ドロップで軽快にチケットを動かせる設計のため、開発チームは「ゴール達成に向けて何を動かすか」「リスクや障害をチームでどう取り除くか」に意識を向けやすくなります。



Neoバックログとの連携

同じスプリント・同じチケットデータを共有しながら、Neoバックログで決めたゴールをそのままNeoカンバンで実行に移せます。

Neoバックログ
何を・どの順番でやるかを決める

Neoカンバン
いまどう進んでいるかを共有する

4/9-4/22 34pt 旅行者が宿泊プランの内容を見て、自分に合った施設を選べるようにする

- 3 pt 家族連れとして、各部屋タイプの写真・広さ・ベッドタイプ・設備を確認したい。なぜなら、子どもが安全に過ごせる部屋かどうか事前に判断したいからだ。
#旅行者が十分な情報をもとに宿泊先を判断できるようにする 進行中
- 8 pt 新婚旅行の宿を慎重に選びたいカップルとして、施設の基本情報・設備・アクセス情報・ポリシーを詳しく確認したい。なぜなら、一生に一度の旅行で失敗したくないからだ。
#旅行者が十分な情報をもとに宿泊先を判断できるようにする 新規
- 5 pt グループ旅行者として、人気エリアのサジェスト機能と0件時の近隣エリア提案を活用したい。なぜなら、より楽しめるスポットを調べたいからだ。
#旅行者が理想の宿を素早く見つけられるようにする 新規
- 8 pt グループ旅行者として、施設が提供する複数の宿泊プランを比較したい。なぜなら、全員の予算と希望に合うプランを見つけたいからだ。
#旅行者が十分な情報をもとに宿泊先を判断できるようにする 新規
- 5 pt 宿泊施設として、期間指定での空室数の一括更新と特定日の販売停止を設定したい。なぜなら、手作業を最小限にして効率よく空室数を管理したいからだ。
#宿泊施設が効率的に情報とプランを管理できるようにする 新規

上から優先順

4/9 - 4/22 旅行者が宿泊プランの内容を見て、自分に合った施設を選べるようにする

新規	進行中	終了
進行中 ▾ 家族連れとして、各部屋タイプの写真・広さ・ベッドタイプ・設備を確認したい。なぜなら、子どもが安全に過ごせる部屋かどうか事前に判断したいからだ。 RA +	部屋の設備（ベビーガード・バス・トイレ別など）を一覧で確認したい。 + 部屋の広さ（㎡）と定員を確認したい。 +	各部屋タイプの写真を一覧で見たい。 +
	新婚旅行の宿を慎重に選びたいカップルとして、施設の基本情報・設備・アクセス情報・ポリシーを詳しく確認したい。なぜなら、一生に一度の旅行で失敗したくないからだ。 +	
	グループ旅行者として、人気エリアのサジェスト機能と0件時の近隣エリア提案を活用したい。なぜなら、より楽しめるスポットを調べたいからだ。 +	

上から優先順

1. スプリントゴールを常に掲げ判断を揃える

画面上部にスプリントゴールを常時表示。

日々の業務の中でも「何を重視して進めるか」をチームで揃えながら進められます。

いま取り組んでいることがどんな価値につながっているかを、チーム全員で確認しながら進める設計です。

5/12 - 5/18

旅行プランを設定し、旅行者が宿泊施設詳細とプラン一覧を確認できる状態にする

スプリントゴール

新規	進行中	終了
新規 ▾ 家族連れとして、各部屋タイプの写真・広さ・ベッドタイプ・設備を確認したい。なぜなら、子どもが安全に過ごせる部屋かどうか事前に判断したいからだ。 Aグ +	部屋の設備（ベビーガード・バス・トイレ別など）を一覧で確認したい。 + 部屋タイプ同士を横並びで比較したい。 +	部屋の広さ（㎡）と定員を確認したい。 + 各部屋タイプの写真を一覧で見たい。 +
	宿泊施設として、紹介文をリッチテキストで入力し写真を複数枚アップロードしたい。なぜなら、施設の魅力を最大限アピールしたいからだ。 Bグ +	
	宿泊施設として、期間指定での空室数の一括更新と特定日の販売停止を設定したい。	

2. 親子チケット（PBI）単位で進捗をまとめて確認

PBIごとに子タスクをグループ表示し、「どこまで前へ進んでいるか」を一画面でまとめて把握できます。
デイリースクラムでもチーム全員が同じ画面を見ながら状況の認識を揃えられ、
スプリント中に新たに必要だと気づいたタスクはその場ですぐに追加できます。

5/12 - 5/18

旅行プランを設定し、旅行者が宿泊施設詳細とプラン一覧を確認できる状態にする

親子チケット	子チケット	進行中	終了
新規 ▾ 家族連れとして、各部屋タイプの写真・広さ・ベッドタイプ・設備を確認したい。なぜなら、子どもが安全に過ごせる部屋かどうか事前に判断したいからだ。 Aグ +	部屋の設備（ベビーガード・バス・トイレ別など）を一覧で確認したい。 + 部屋タイプ同士を横並びで比較したい。 +	部屋の広さ（㎡）と定員を確認したい。 +	各部屋タイプの写真を一覧で見たい。 +
	宿泊施設として、紹介文をリッチテキストで入力し写真を複数枚アップロードしたい。なぜなら、施設の魅力を最大限アピールしたいからだ。 Bグ +		

3. 進捗更新も情報編集も一画面で完結

ドラッグ＆ドロップでステータス更新が完了。

タイトル・担当者・タグ・コメントの確認や編集も同じ画面でサクサク行えます。

複数人が同時に開いていても更新は自動で反映されるため、常に最新の状態をチームで共有しながら進められます。

4/9 - 4/22

旅行者が宿泊プランの内容を見て、自分に合った施設を選ぶようにする

	新規	進行中	終了
進行中 ▼ 家族連れとして、各部屋タイプの写真・広さ・ベッドタイプ・設備を確認したい。なぜなら、子どもが安全に過ごせる部屋かどうか事前に判断したいからだ。 RA	部屋の設備（ベビーガード・バス・トイレ別など）を一覧で確認したい。 部屋タイプ同士を横並びで比較したい。	部屋の広さ（㎡）と定員を確認したい。	各部屋タイプの写真を一覧で見たい。

DRAG & DROP!

4. チーム単位でカンバンを絞り込み表示

複数チームで開発している場合でも、自チームが担当している内容だけをひと目で確認できます。
必要に応じて全体表示へ切り替えながら、自チームへの集中とチーム間のつながりを両立できます。

担当グループ

すべて

Aグループ

Bグループ

未割り当て

次のスプリントを表示 →


5/12 - 5/18

旅行プランを設定し、旅行者が宿泊施設詳細とプラン一覧を確認できる状態にする

	新規	進行中	終了
新規 ▼ 家族連れとして、各部屋タイプの写真・広さ・ベッドタイプ・設備を確認したい。なぜなら、子どもが安全に過ごせる部屋かどうか事前に判断したいからだ。 Aグ +	部屋の設備（ベビーガード・バス・トイレ別など）を一覧で確認したい。 + 部屋タイプ同士を横並びで比較したい。 +	部屋の広さ（㎡）と定員を確認したい。 +	各部屋タイプの写真を一覧で見たい。 +
	宿泊施設として、期間指定での空室数の一括更新と特定日の販売停止を設定したい。なぜなら、手作業を最小限にして効率よく空室数を管理したいからだ。 Aグ +		

導入事例

Redmine全社導入をLychee Redmineでサポート ～3,000名のユーザビリティ向上と、「見える化」を実現～

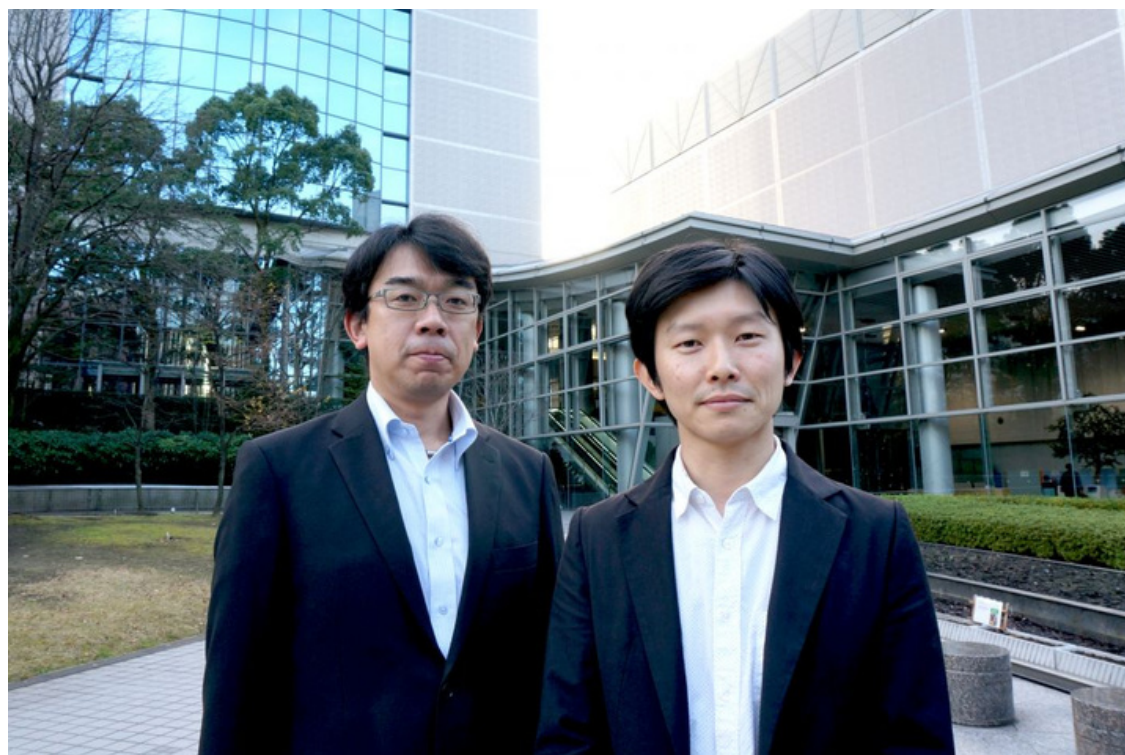

社名：東京海上日動システムズ 様

事業内容：東京海上グループの情報システムの企画・提案・設計開発・保守・運用

使用機能：Lycheeガントチャート、Lychee EVM、Lycheeリソースマネジメント、Lycheeアジャイル

「Lychee Redmine」を選んだ理由

- ・ ガントチャート上で直感的に操作して入力できること。
- ・ Lychee EVMのユーザビリティに魅力を感じた。

課 題

- ×× 業務の生産性を高めるために、コミュニケーションや進捗報告といった粒々のスピードアップが必要。
- ×× 多数のプロジェクトをエクセルで管理していたため、「一元管理ができない」「リアルタイムに参照ができない」「同時更新ができない」「プロジェクト管理手法の標準化ができない」といった課題があった。

効 果

- 😊 ガントチャートもEVMも全てが一元管理されるので、各プロジェクトの状況を「見える化」できるようになった。
- 😊 10種類の管理ファイルを削減することができた。
- 😊 タスク依頼をする際、以前は口頭とエクセルによる二重管理となっていたが、Lycheeアジャイルを導入したことでその手間がなくなった。情報のリアルタイム更新も可能で情報共有がスムーズに。

個別管理と全体管理を融合し、プロジェクト横断型の問題をまとめて解決



社名：株式会社ワコム 様

事業内容：ブランド製品事業、テクノロジーソリューション事業

使用機能：ビジネスプラン（ガントチャート、カンバン、工数リソース管理、カスタムフィールド）

「Lychee Redmine」を選んだ理由

- ・ **ガントチャート機能**や**サポート体制**に魅力を感じた。
- ・ 海外法人や協力会社と連携するための**クラウド環境**に対応していた。

課題

- ❌ プロジェクトの情報が各メンバーのメールサーバーに分散。Excelなど管理ツールの使い方も統一されておらず、**正確な情報把握に労力を費やしていた。**
- ❌ 多数のプロジェクトが**個別に管理**されており、**問題点と適切な解決策が共有**されていなかった。

効果

- 😊 **プロジェクトの情報が一元管理され、業務効率がアップ。**情報把握や段取りのための時間が大幅に短縮された。
- 😊 ガントチャートで**自由自在に日程調整**ができるようになった。
- 😊 多数のプロジェクトに共通する**問題点が可視化**され、**適切な解決策を全面展開**できるようになった。その結果、製品の**本格進化が視野**に入った。

「チケット」によるコミュニケーションで、多数の部署やベンダーと円滑に協働



社名：株式会社クレディセゾン 様

事業内容：ペイメント・リース・ファイナンス・不動産関連・グローバル・エンタテインメントなど

使用機能：スタンダードプラン（ガントチャート、カンバン、バックログ）

「Lychee Redmine」を選んだ理由

- ・ チケットを基盤にしたコミュニケーションが可能だった。
- ・ スケジュールやタスクの管理などExcelで求めていたこと“も”実現できるため。

課 題

×× 大規模な内製開発プロジェクトが立ち上がり、多数の部署やITベンダー（以下、ベンダー）と複雑な調整を行う必要が生じた。

×× Excelによるプロジェクト管理をベンダーから求められたが、その手法は多大な労力を要すると予想された。

解決策と効果

解決策

- ✓ チケットを基盤に多数の部署やベンダーとコミュニケーションを取った。
- ✓ ガントチャート機能を活用し、ベンダーが求める進捗管理を効率化した。

効果

- 😊 チケットごとにタスクとコミュニケーションが整理され、多数の部署やベンダーを巻き込んだマネジメントが円滑になった。
- 😊 週次会議における各プロジェクトの進捗確認がスピーディーに。ベンダーが大量の管理・報告資料を作成して、印刷する必要もなくなった。
- 😊 統制型のプロジェクト管理の要素を採り入れながら、自律的な開発スタイルを維持できた。


4つのプラン

(全プラン30日間無料でお試し可能です)

	フリープラン	スタンダードプラン	プレミアムプラン	ビジネスプラン
	無料で試したい 企業・個人向け	基本的な機能を利用し たい 企業・個人向け	管理機能を強化した い 企業・個人向け	すべての機能が入った さらに高度な機能を取り入れたい企業向け
プラン 利用料	0 円 無制限	900 円 1 ユーザー / 月 購入は 10 ユーザー単位	1,400 円 1 ユーザー / 月 購入は 10 ユーザー単位	2,100 円 1 ユーザー / 月 購入は 10 ユーザー単位
クラウド 利用料	有料プラン共通 5,000 円～/月 (契約ユーザー数に応じて変動)			
機能	基本機能 (一部対象外) カンバン	基本機能 ガントチャート ダッシュボード Neoバックログ バックログ カンバン Lychee AI	スタンダードの機能 + タイムマネジメント リソースマネジメント EVM (出来高管理) コストマネジメント CCPM	プレミアムの機能 + プロジェクトレポート カスタムフィールド拡張 チケット関連図 グループの階層化機能

まずは無料体験版をお試しく下さい！

Lychee Redmine
30日間無料お試し

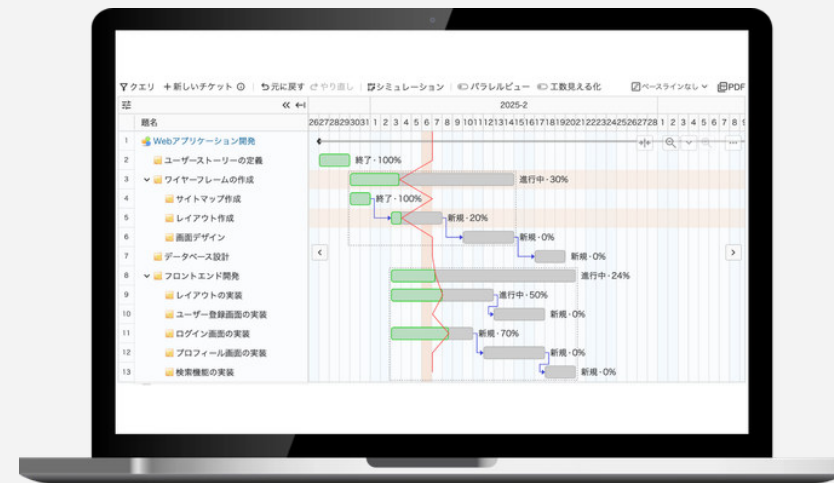

**無料体験版を
今すぐ試す**

もっと詳しく



**Webサイトを
見る**

お役立ち資料



**お役立ち資料は
こちら**





株式会社 アジャイルウェア  Agileware

アジャイルウェアホームページ : <https://agileware.jp>

LycheeRedmine導入のご相談 : <https://lychee-redmine.jp/contact>

お問い合わせ先 : <https://agileware.jp/contact/other-form>
