

CONFIDENTIAL

Lychee Redmine

Lychee ガントチャート新旧比較資料


株式会社アジャイルウェア

2025年8月19日版

本資料について



- ・本資料はLychee ガントチャートの「**ガントチャート 5(以下、新ガントチャート)**」と「**ガントチャート(以下、旧ガントチャート)**」の違い に関してまとめた資料になります。
変更点は画面上部より順に説明するようにしております。
- ・本資料は**現行開発中の画面を使用**しています。**正式リリース時には UI/UXが改善**される可能性があり、表示や操作が一部異なる場合があります。

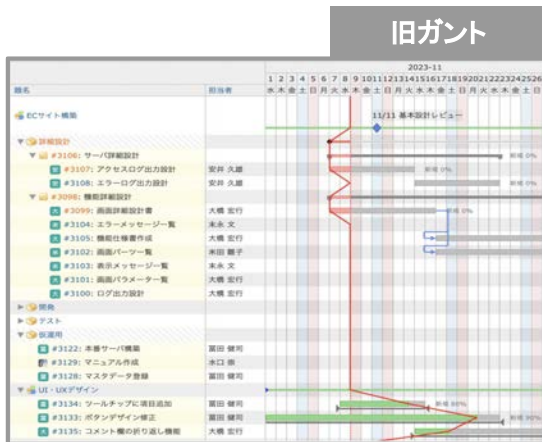

操作変更点

フィルタ・カスタムクエリ・グループ条件部分



画面の上部にあり、「フィルタ」ボタンを押下することで開閉が可能です。

フィルタ条件を選択して、「適用」ボタンを押下して使用してください。

①

CLICK!

ガントチャート

PDF | ベースライン保存 | 全画面モード

▼ フィルタ

↑ アクション

↑ 示する項目

↑ ート条件

6 ヶ月分 5月 2025 適用 クリア 保存

新しいチケット | チケット連続追加 | Undo | Redo

ガントチャート

PDF | ベースライン保存 | 全画面モード

▼ フィルタ

☒ ステータス 未完了

フィルタ追加

↑ アクション

表示する項目

ソート条件

6 ヶ月分 5月 2025 適用 クリア 保存

新しいチケット | チケット連続追加 | Undo | Redo | シミュレーション | パラレルビュー | 更新

②フィルタ条件を指定



画面左上の「クエリ」ボタンを押下することで左側からメニューが現れ、選択できます。
フィルタ条件を選択して、「適用」ボタンを押下して使用してください。

The screenshot illustrates the process of applying filters to a Gantt chart. The top navigation bar includes buttons for Dashboard, Summary, Activity, Roadmap, Ticket, Campaign, Work Time, Gantt Chart 5.0 (Preview), Gantt Chart, Wiki, and Settings. The main area shows a Gantt chart for the month of May 2025. A red box labeled '①' highlights the 'クエリ' (Query) button in the top left corner, with a red arrow pointing to it and the text 'CLICK!' below. Below the main chart, a modal window titled 'マイカスタムクエリ' (My Custom Query) is open. It shows a list of custom queries on the left and a configuration area on the right. A red box labeled '②フィルタ条件を指定' (Specify filter conditions) highlights the configuration area, which includes a search bar, a 'ステータス' (Status) dropdown menu set to '未完了' (Not Completed), a 'グループ条件' (Group Condition) dropdown, and checkboxes for '上位チケットを含める' (Include parent tickets) and '適用' (Apply). The '適用' button is highlighted with a red arrow pointing to the main Gantt chart area.



画面右部分に表示されているクエリー一覧から選択することで、フィルタが適用されます。

ダッシュボード 概要 活動 ロードマップ チケット カンパイン 作業時間 ガントチャート5.0 [プレα] **ガントチャート** Wiki 設定

ガントチャート PDF ベースライン保存 全画面モード

▼ フィルタ

⚙ オプション

関連するチケット
☒ ブロック先 ☐ 次のチケットに先行

イナズマ線
☐ 表示

自プロジェクトを含む上位プロジェクト
☒ 表示

上位チケット
☐ 表示

コメント吹き出し
☐ 表示

クリティカルパス
☐ 表示 ☐ 複数クリティカルパスを計算する

ベースライン表示
▼

マイルストーン
☒ 表示

空のバージョン
☐ 表示

ステータス色
☒ 表示

休業日
☒ 表示

表示する項目

ソート条件

6 ヶ月分 5月 2025 適用 クリア 保存

日別(大) / 日別(小) / 週別 / 月別(大) / 月別

新しいチケット チケット連続追加 Undo Redo シミュレーション パラレルビュー 工数見える化 更新

2025-5

マイカスタムクエリ

demo

カスタムクエリ

ウォッチしているチケット
不具合一覧
報告したチケット
担当しているチケット
更新したチケット
期日が近いチケット
期日超過の未完了チケット



CLICK!

クエリを選択




画面左上の「クエリ」ボタンを押下することで左側からメニューが現れます。

画面左部のクエリ一覧から選択することでフィルタが適用されます。



CLICK!

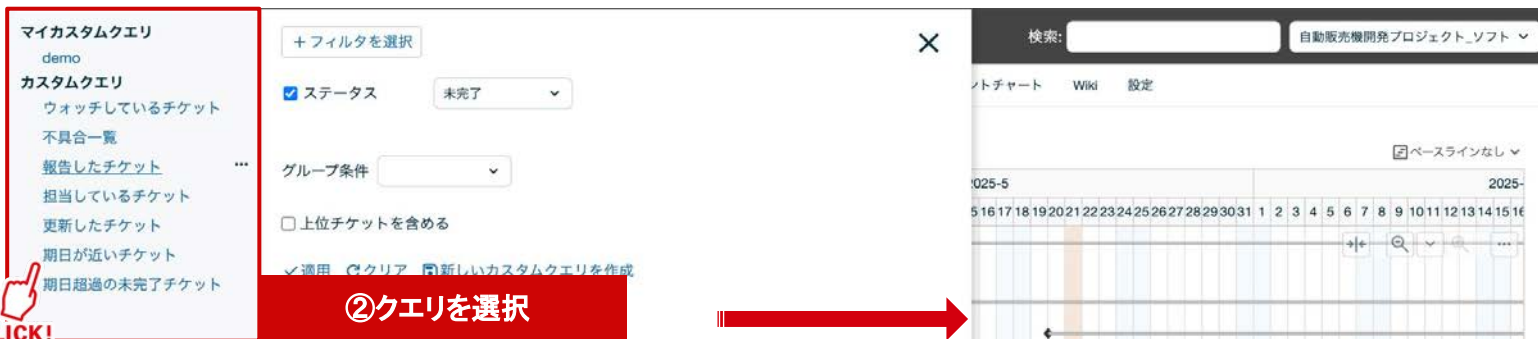


CLICK!

②クエリを選択





ガントチャート表上の「保存」押下すると、カスタムクエリの作成画面に遷移します。

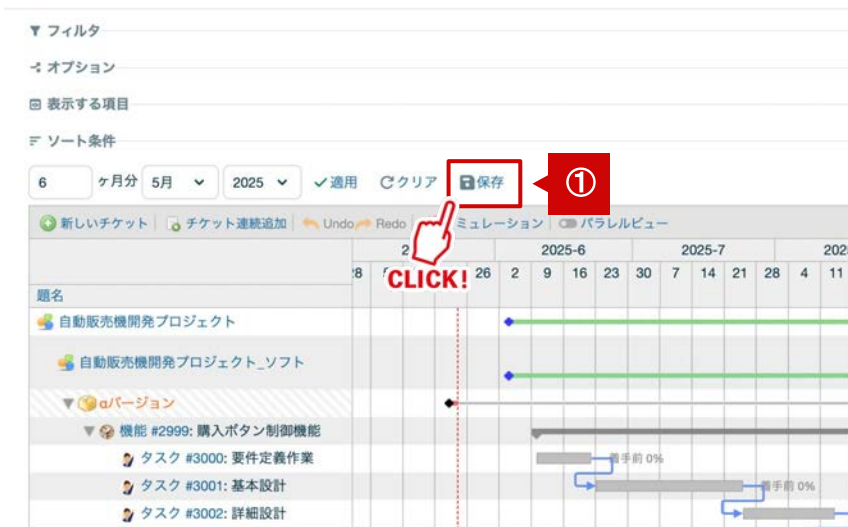

新しいクエリ

名前: 未入力

表示: ☒ 自分のみ
☐ すべてユーザ
☐ 特定のロールのみ
☐ 管理者
☐ 読取者
☐ 観覧者

各プロジェクト単位 ☐

オプション

デフォルトの項目 ☐

グループ条件

表示: ☒ 関連するチケット ☐ イタズで開 ☒ 各プロジェクトを含む上位プロジェクト ☐ 上位チケット ☐ 変更バージョン ☐ パラレルビュー ☒ 作業日

行の検索対象 ☐ 保存

フィルタ条件

ステータス: 未入力

所有者: 未入力

フィールド追加

ソート条件

昇順: 未入力

降順: 未入力

ソート方法: 未入力

手動でソート ☐

項目

利用可能な項目

プロジェクト

チケット

チケットの優先度

ステータス

優先度

作成者

担当者

更新日

カテゴリ

選択された項目

トピック

②フィルタ条件を指定

③

CLICK!



画面左上の「クエリ」ボタンを押下することで左側からメニューが現れます。
メニュー内よりカスタムクエリを作成できます。

マイカスタムクエリ
demo

カスタムクエリ

- ウォッチしているチケット
- 不具合一覧
- 報告したチケット
- 担当しているチケット
- 更新したチケット
- 期日が近いチケット
- 期日超過の未完了チケット

+ フィルタを選択

☒ ステータス 未完了

グループ条件

☐ 上位チケットを含める

適用 **①** [新しいカスタムクエリを作成](#)

CLICK!

未完了かつ自分が担当

表示
☒ 自分のみ ☐ すべてのユーザー ☐ 次のロールのみ ☐ 全プロジェクト向け

フィルタ
+ フィルタを選択

☒ ステータス 未完了

☒ 担当者 等しい << 自分 >>

グループ条件

☐ 上位チケットを含める

ベースライン

表示オプション

- ☒ ツリー構造を保つ
- ☒ 自プロジェクトを含む上位プロジェクト
- ☐ 空のプロジェクト
- ☐ 空のバージョン
- ☐ 並列レビュー
- ☒ 休業日
- ☒ 関連線
- ☐ イナズマ線
- ☒ 実開始日/実終了日バー
- ☒ マイルストーン
- ☐ クリティカルパス
- ☐ 遅延クリティカルパス

②フィルタ条件を指定

作成 **③**

CLICK!



カスタムクエリー一覧の「…」からカスタムクエリの「編集」「削除」が可能になりました。

編集時に、**新しいカスタムクエリを作成(別名で保存)**を選べるようになりました。

マイカスタムクエリ
demo

カスタムクエリ

ウォッチしているチケット

不具合一覧

今月の完了件

報告したチケット

担当しているチケット

更新したチケット

期日が近いチケット

期日超過の未完了チケット

+ フィルタを選択

☒ ステータス

未完了

グループ条件

▼

☐ 上位チケットを含める

☒ 適用

マイカスタムクエリ
demo

カスタムクエリ

ウォッチしているチケット

不具合一覧

報告したチケット

担当しているチケット

更新したチケット

☒ 期日が近いチケット

期日超過の未完了チケット

適用中 期日が近いチケット

+ フィルタを選択

☒ ステータス

未完了

☒ 期日

今後N日

▼

6

日

グループ条件

▼

☐ 上位チケットを含める

☒ 適用

+ 新しいカスタムクエリを作成



カスタムクエリを新規で「新規作成している」場合は「作成」ボタンが、
「編集している」場合「編集」ボタンが表示され、判別できるようになりました。

新規作成

名称

表示
☒ 自分のみ ☐ すべてのユーザー ☐ 次のロールのみ ☐ 全プロジェクト向け

フィルタ
+ フィルタを選択

☒ ステータス 未完了

グループ条件

☐ 上位チケットを含める

ベースライン

表示オプション
☒ ツリー構造を保つ
☒ 自プロジェクトを含む上位プロジェクト
☐ 空のプロジェクト
☐ 空のバージョン
☐ パラレルビュー

☒ 休業日
☒ 関連線
☐ イナズマ線
☒ 実開始日/実終了日/バー
☒ マイルストーン
☐ クリティカルパス
☐ 複数クリティカルパス
☐ コメント吹き出し

年/月/日

作成

編集

不具合一覧

表示
☐ 自分のみ ☒ すべてのユーザー ☐ 次のロールのみ ☐ 全プロジェクト向け

フィルタ
+ フィルタを選択

☐ ステータス 未完了

☐ ユーザー 等しい

☐ バグ

条件

☐ チケットを含める

表示オプション
☒ ツリー構造を保つ
☒ 自プロジェクトを含む上位プロジェクト
☐ 空のプロジェクト
☐ 空のバージョン
☐ パラレルビュー

☒ 休業日
☒ 関連線
☐ イナズマ線
☒ 実開始日/実終了日/バー
☒ マイルストーン
☐ クリティカルパス
☐ 複数クリティカルパス
☐ コメント吹き出し

年/月/日

関連データ

更新

新規作成と編集で
文言が異なります。



「表示する項目」を押下し、開閉することで選択できるようになります。

「グループ条件」を選択し、使用してください。

The screenshot displays the Gantt Chart interface. On the left, a sidebar menu shows '表示する項目' (Items to Display) highlighted with a red box and a red arrow pointing to it, labeled '①'. Below this, a red arrow points to the 'グループ条件' (Group Condition) dropdown menu, which is also highlighted with a red box and labeled '②グループ条件を指定' (Specify Group Condition). The main area shows the '表示する項目' (Items to Display) list, which includes 'プロジェクト' (Project), '親チケット' (Parent Ticket), '親チケットの題名' (Parent Ticket Title), 'ステータス' (Status), '優先度' (Priority), '作成者' (Creator), '更新日' (Update Date), 'カテゴリ' (Category), and '対象バージョン' (Target Version). The 'グループ条件' (Group Condition) dropdown is currently set to 'グループ条件' (Group Condition).

①

CLICK!

②グループ条件を指定



画面左上の「クエリ」ボタンを押下することで左側からメニューが現れます。

「グループ条件」を選択し、「適用」ボタンを押下して使用してください。



操作変更点

オプション部分・ベースライン



画面の上部にある、「オプション」ボタンを押下することで開閉が可能です。
適用したいオプションを選択し、「適用」ボタンを押下して使用してください。

①

CLICK!

ガントチャート

PDF | ベースライン保存 | 全画面モード

フィルタ

オプション

関連するチケット

☒ ブロック先 ☐ 次のチケットに先行

イナズマ線 ☐ 表示

自プロジェクトを含む上位プロジェクト ☒ 表示

上位チケット ☐ 表示

コメント吹き出し ☐ 表示 ()

クリティカルパス

☐ 表示 ☐ 複数クリティカルパスを計算する

ベースライン表示

マイルストーン ☒ 表示

空のバージョン ☐ 表示

ステータス色 ☒ 表示

休業日 ☒ 表示

②表示したいオプションにチェック

表示する項目

ソート条件

6 ヶ月分 5月 2025 適用 クリア 保存

新しいチケット | チケット連続追加 | Undo | Redo | シミュレーション | パラレルビュー | 工数見える化

日別(大) / 日別(小) / 週別 / 月別(大) / 月別(小)

更新



ガントチャート表内の右上部にある「...」ボタンを押下することで専用メニューが開きます。
適用したいオプションを選択することで即座に反映されます

The screenshot displays the Gantt chart interface. The top navigation bar includes tabs for Dashboard, Overview, Activity, Roadmap, Checklist, Campaign, Work Time, Gantt Chart 5.0 [Preview], Gantt Chart, Wiki, and Settings. The main area shows a Gantt chart with tasks listed on the left and a timeline on the right. A red arrow points to a menu icon (three dots) in the top right corner of the chart area, labeled with a red circle containing the number 1. A red box highlights the menu icon, and a red arrow points to it with the text "CLICK!". Below the menu icon, a dropdown menu is visible, titled "ガントバーの付加情報" (Gantt Bar Additional Information). The menu contains several options with checkboxes: "休業日" (Holiday), "関連線" (Related Line), "イナズマ線" (Inazuma Line), "実開始日/実終了日バー" (Actual Start/End Date Bar), "マイルストーン" (Milestone), "クリティカルパス" (Critical Path), "複数クリティカルパス" (Multiple Critical Path), and "コメント吹き出し" (Comment Callout). The "実開始日/実終了日バー" and "マイルストーン" options are checked. The menu also includes a section for "データ列が非表示の時のみ表示" (Display only when data column is hidden), with options for "題名・名称" (Title/Name), "ステータス" (Status), "進捗率" (Progress Rate), and "担当者" (Assignee). The "進捗率" option is checked. The menu is labeled with a red circle containing the number 2.

②オプション選択できるメニューが開く
表示したいオプションにチェック

PDF | ベースライン保存 | 全画面モード

名称:
6/23 週次会議

ベースラインを保存

日別(大) / 日別(小) / 週別 / 月別(大) / 月別(小)

更新

2025-6

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日


② タイトルを入力し
「ベースラインを保存」

着手前 0%




ガントチャート表内の右上部にある「ベースラインなし」を押下することで
ベースラインをスナップショット保存できます。

タイトルを入力せずに保存を押すとタイトルが保存時間で保存させれます。

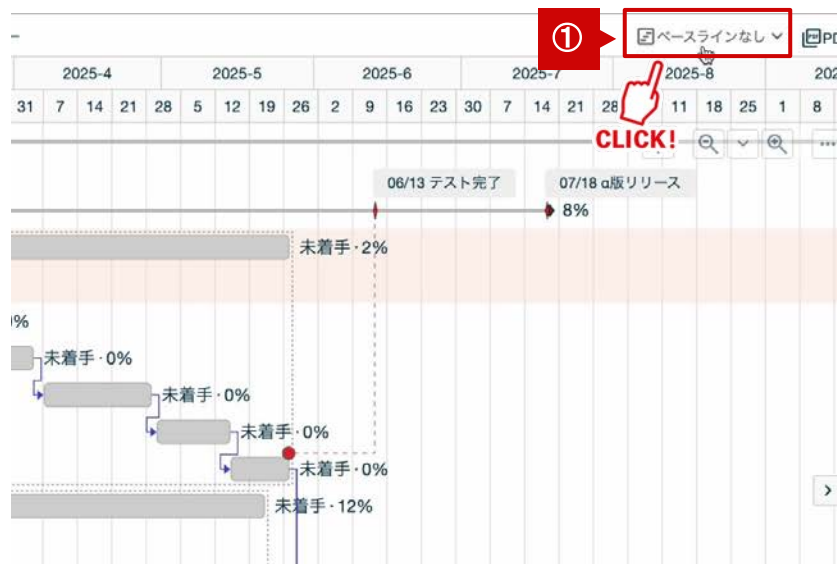




画面の上部にある、「オプション」を開き、
「ベースライン表示」より任意のベースラインを表示することができます。

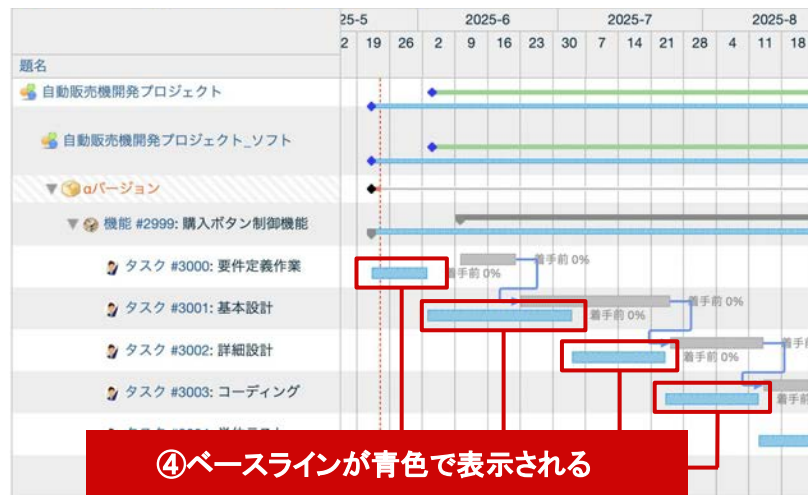[illegible]




ガントチャート表内の右上部にある「ベースラインなし」を押下することでベースライン選択/表示できます。また、ベースライン名を編集できるようになりました。

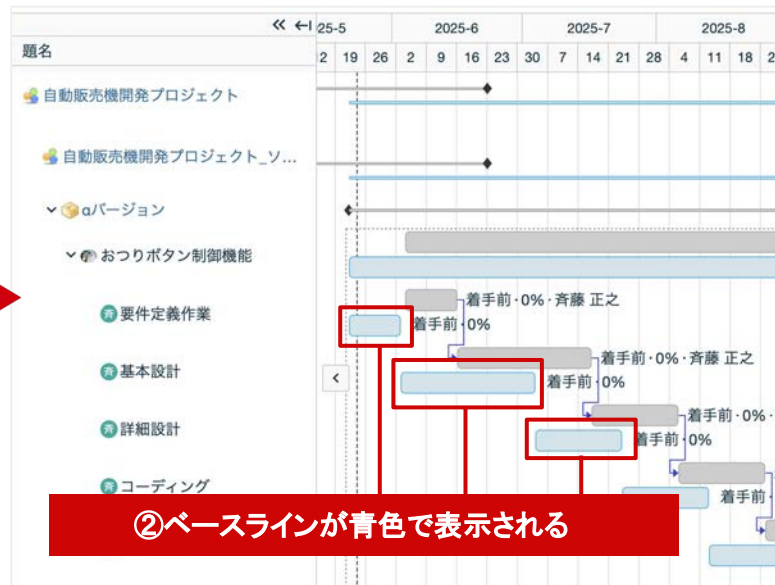



ベースラインのイナズマ線の基準日が「本日」から「保存時の日付」変更されました。
これによりベースライン保存時と現在とを比較しやすくなります。

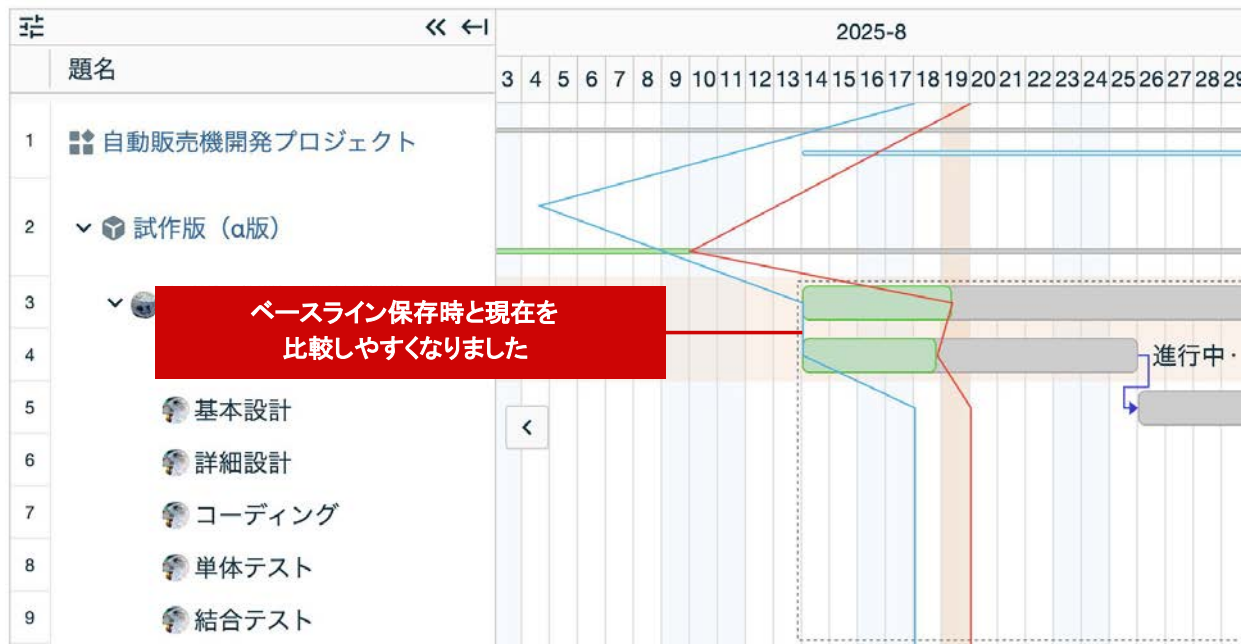

操作変更点

オプション項目の新旧位置

オプション項目の位置



旧ガントの「オプション」項目から新ガントの「オプション」項目の対比は以下の通り。

旧ガント

新ガント

旧ガントの「オプション」項目から新ガントの「オプション」項目の対比は以下の通り。

旧ガントのオプション項目:

- 関連するチケット
☒ ブロック先 ☐ 次のチケットに先行
- イナズマ線
☐ 表示
- 自プロジェクトを含む上位プロジェクト
☒ 表示
- 上位チケット
☐ 表示
- コメント吹き出し
☐ 表示 ()
- クリティカルパス
☐ 表示 ☐ 複数クリティカルパスを計算する
- ベースライン表示
▼
- マイルストーン
☒ 表示
- 空のバージョン
☐ 表示
- ステータス色
☒ 表示
- 休業日
☒ 表示

新ガントのオプション項目:

- ☒ 休業日
- ☒ 関連線
- ☐ イナズマ線
- ☒ 実開始日/実終了日パー
- ☒ マイルストーン
- ☐ クリティカルパス
↳ ☐ 複数クリティカルパス
- ☐ コメント吹き出し
↳ 年 / 月 / 日

ガントバーの付加情報

	非表示	常時表示	データ列が非表示の時のみ表示
題名・名称	☐	☐	☒
ステータス	☐	☒	☐
進捗率	☐	☒	☐
担当者	☐	☐	☒

オプション項目の位置



旧ガントの「オプション」項目から新ガントの「表示する項目」の「表示オプション」に移行した項目は以下。

旧ガント

オプション

関連するチケット ☒ ブロック先 後のチケットに先行	イナズマ線 ☐ 表示	自プロジェクトを含む上位プロジェクト ☒ 表示	上位チケット ☐ 表示	コメント吹き出し ☐ 表示
クリティカルパス ☐ 表示 ☐ 複数クリティカルパスを計算する	ベースライン表示 ▼	マイルストーン ☒ 表示	空のバージョン ☐ 表示	ステータス色 ☒ 表示
				休業日 ☒ 表示

新ガント

表示オプション

- ☒ ツリー構造を保つ
- ☒ 自プロジェクトを含む上位プロジェクト
- ☐ 空のプロジェクト
- ☐ 空のバージョン

カスタムソート

- ☒ 直前のカスタムソートを復元
- ☐ 適用中のカスタムソートを解除

表示項目

デフォルト項目を選択

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ # | ☒ 開始日 | ☐ 最新のコメント |
| ☐ プロジェクト | ☒ 期日 | ☐ 実開始日 |
| ☐ トラッカー | ☐ 予定工数 | ☐ 実終了日 |
| ☐ 親チケット | ☐ 合計予定工数 | ☐ 残工数(Lychee) |
| ☐ 親チケットの題名 | ☐ 作業時間 | ☐ 合計残工数(Lychee) |
| ☒ ステータス | ☐ 合計作業時間 | ☐ コメント |
| ☐ 優先度 | ☐ 進捗率 | ☐ 作業難易度 |
| ☒ 題名 | ☐ 作成日 | ☐ ポイント |
| ☐ 作成者 | ☐ 終了日 | ☐ 工程 |
| ☒ 担当者 | ☐ 最終更新者 | ☐ スクリーンショット |
| ☐ 更新日 | ☐ 関連するチケット | ☐ ログファイル |
| ☐ カテゴリ | ☐ ファイル | ☐ プライベート |
| ☐ 対象バージョン | ☐ 説明 | |

題名
ステータス
担当者
開始日
期日

オプション項目の位置



旧ガントの「オプション」項目から新ガントの「クエリ」に移行した項目は以下。

旧ガント

オプション

関連するチケット
☒ ブロック先次のチケットに先行

イナズマ線
☐ 表示

自プロジェクトを含む上位プロジェクト
☒ 表示

上位チケット
☐ 表示

コメント吹き出し
☐ 表示 ()

クリティカルパス
☐ 表示 ☐ 複数クリティカルパスを計算する

ベースライン表示
▼

マイルストーン
☒ 表示

空のバージョン
☐ 表示

ステータス色
☒ 表示

休業日
☒ 表示

新ガント

マイカスタムクエリ
demo

カスタムクエリ
ウォッチしているチケット
不具合一覧
報告したチケット
担当しているチケット
更新したチケット
期日が近いチケット
期日超過の未完了チケット

+ フィルタを選択

☒ ステータス 未完了 ▼

グループ条件 ▼

☐ 上位チケットを含める

✓ 適用 ✕ クリア 📄 新しいカスタムクエリを作成



旧ガントの「オプション」項目から削除された項目としては以下の通り。

旧ガント

オプション

関連するチケット ☒ ブロック先 ☐ 次のチケットに先行	イナズマ線 ☐ 表示	自プロジェクトを含む上位プロジェクト ☒ 表示	上位チケット ☐ 表示	コメント吹き出し ☐ 表示 ()
クリティカルパス ☐ 表示 ☐ 複数クリティカルパスを計算する	ベースライン表示 ▼	マイルストーン ☒ 表示	空のバージョン ☐ 表示	ステータス色 ☒ 表示
				休業日 ☒ 表示

- ステータス色

理由:ステータス欄のステータス名の横に色記載がある。

- 背景色を変更した場合に視認性が悪くなるため削除。

操作変更点

表示する項目・ソート条件部分



画面の上部にあり、「表示する項目」ボタンを押下することで開閉が可能です。

表示したい項目を「→」で「選択された項目」に、表示したくない項目は「←」で「利用できる項目」に移動させて、「適用」ボタンを押下して使用してください。

① CLICK!

② 表示したい項目を選択して「→」クリック
非表示にしたい項目は「←」で移動させる

③ 移動されたら「適用」をクリック

④ CLICK!



表内の左上部にある「設定(三本線)」ボタンを押下することで専用メニューが開きます。
表示項目についてはチェックBOXのチェックを変更することで即座に列追加・削除されます。

①

CLICK!

ダッシュボード 概要 活動 ロードマップ チケット カンバン 作業時間 ガントチャート5.0 [プレ]

クエリ + 新しいチケット 元に戻す やり直し シミュレーション パラレルビュー

設定

表示オプション

- ☒ ツリー構造を保つ
- ☒ 自プロジェクトを含む上位プロジェクト
- ☐ 空のプロジェクト
- ☐ 空のバージョン

カスタムソート

- ☒ 直前のカスタムソートを復元
- ☐ 適用中のカスタムソートを解除

表示項目

☒ デフォルト項目を選択

☐ #

☐ プロジェクト

☐ トラッカー

☐ 親チケット

☐ 親チケットの

☒ ステータス

☐ 優先度

☐ 題名

☐ 作成者

☐ 更新日

☐ カテゴリ

☐ 対象バージョン

☒ 開始日

☐ 期日

☐ 予定工数

☐ 合計予定工数

☐ 作業時間

☐ 合計作業時間

☐ 進捗率

☐ 作成日

☐ 終了日

☐ 最終更新者

☐ 関連するチケット

☐ ファイル

☐ 説明

☐ 最新のコメント

☐ 実開始日

☐ 実終了日

☐ 残工数(Lychee)

☐ 合計残工数(Lychee)

☐ コメント

☐ 作業難易度

☐ ポイント

☐ 工程

☐ スクリーンショット

☐ ログファイル

☐ プライベート

題名

ステータス

担当者

開始日

期日

2025-5

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2

②表示項目にチェックを入れるだけ



また、表示項目の順番は右部の項目をドラック&ドロップすることで表示順を変更することが可能です。

表示オプション

- ☒ ツリー構造を保つ
- ☒ 自プロジェクトを含む上位プロジェクト
- ☐ 空のプロジェクト
- ☐ 空のバージョン

表示項目

☒ デフォルト項目を選択

カスタムソート

☒ 直前のカスタムソートを復元

☐ 適用中のカスタムソートを解除

表示項目

- ☐ #
- ☐ プロジェクト
- ☐ トラッカー
- ☐ 親チケット
- ☐ 親チケットの題名
- ☒ ステータス
- ☐ 優先度
- ☒ 題名
- ☐ 作成者
- ☒ 担当者
- ☐ 更新日
- ☐ カテゴリ
- ☐ 対象バージョン
- ☒ 開始日
- ☒ 期日
- ☐ 予定工数
- ☐ 合計作業時間
- ☐ 進捗率
- ☐ 作成日
- ☐ 終了日
- ☐ 最終更新者
- ☐ 関連するチケット
- ☐ ファイル
- ☐ 説明
- ☐ 最新のコメント
- ☐ 実開始日
- ☐ 実終了日
- ☐ コメント
- ☐ 作業難易度
- ☐ ポイント
- ☐ 工程
- ☐ スクリーンショット
- ☐ ログファイル
- ☐ プライベート

DRAG & DROP!

題名

ステータス

担当者

開始日

期日



画面の上部にあり、「ソート条件」ボタンを押下することで開閉が可能です。

ソート条件にしたい順に上から設定してください。

The screenshot illustrates the process of selecting sorting conditions in the Gantt Chart interface. It is divided into two parts by a red arrow indicating a click action.

Part 1 (Left): Shows the main Gantt Chart interface. A red box highlights the "ソート条件" (Sorting Conditions) button in the top navigation bar. A red hand icon with the text "CLICK!" points to this button.

Part 2 (Right): Shows the expanded sorting options menu. A red box highlights the menu area. The menu contains the following options:

- ソート条件 (Sorting Conditions)
- 1: 開始日 (Start Date) with a dropdown arrow and "昇順" (Ascending) with a dropdown arrow.
- 2: [Empty dropdown] with a dropdown arrow and [Empty dropdown] with a dropdown arrow.
- 3: [Empty dropdown] with a dropdown arrow and [Empty dropdown] with a dropdown arrow.
- ☒ ツリー構造を保つ (Keep Tree Structure)
- ☐ 手動でソート (Sort Manually)

The bottom of the interface shows a filter bar with "6" items, "ヶ月分" (Monthly), "5月" (May), "2025", and buttons for "適用" (Apply), "クリア" (Clear), and "保存" (Save). The bottom right corner displays the view mode: "日別(大) / 日別(小) / 週別 / 月別(大) / 月別(小)".



新ガントではソート設定はなく、列項目をワンクリックするだけで並び替えができます。

①並び替えたい項目をクリック

題名	担当者	開始日	期日	2	19	26	2	9	16	23	30	7
自動販売機開発プロジェクト		04/22	06/22									
自動販売機開発プロジェクト_ソフト		04/22	06/22									
αバージョン		05/22	09/15									
おつりボタン制御機能	赤石 ライチ	06/04	10/03									
結合テスト	斉藤 正之	09/17	10/03									
単体テスト	斉藤 正之	08/26	09/16									
コーディング	斉藤 正之	08/06	08/25									
詳細設計	斉藤 正之	07/17	08/05									
基本設計	斉藤 正之	06/16	07/16									
要件定義作業	斉藤 正之	06/04	06/15									
購入ボタン制御機能	角田 紗羅	06/10	10/10									
要件定義作業	甲斐 孝治	06/10	06/21									
基本設計	甲斐 孝治	06/23	07/24									
詳細設計	甲斐 孝治	07/25	08/13									

②情報が並び替わる

題名	担当者	開始日	期日	2	19	26	2	9	16
1 自動販売機開発プロジェクト		04/22	06/22						
2 自動販売機開発プロジェクト_ソフト		04/22	06/22						
3 αバージョン		05/22	09/15						
4 購入ボタン制御機能	角田 紗羅	06/10	10/10						
5 結合テスト	甲斐 孝治	09/25	10/10						
6 要件定義作業	甲斐 孝治	06/10	06/21						
7 基本設計	甲斐 孝治	06/23	07/24						
8 詳細設計	甲斐 孝治	07/25	08/13						
9 コーディング	甲斐 孝治	08/14	09/01						
10 単体テスト	甲斐 孝治	09/02	09/24						
11 おつりボタン制御機能	赤石 ライチ	06/04	10/03						
12 基本設計	斉藤 正之	06/16	07/16						
13 詳細設計	斉藤 正之	07/17	08/05						
14 コーディング	斉藤 正之	08/06	08/25						
15 単体テスト	斉藤 正之	08/26	09/16						



操作變更点

表示期間部分



表示期間はガントチャート表の上部の左部、右部の選択によって変更が可能です。





表示期間の指定は新ガントではありません。左右スクロールでどこまでも変更可能です。

今日の日付を中心に戻す場合、「→ | ←」ボタンを押下してください。

表示形式に関してはガントチャート表内の右上の方の虫眼鏡ボタンで変更できます。

またその間の「V(下向き記号)」を押すと従来同様の選択も可能です。

The image shows two screenshots of a Gantt chart interface. The top screenshot shows the main Gantt chart with a table of tasks. A red box labeled '1' highlights the magnifying glass icon in the top right corner of the chart area. The bottom screenshot shows the same interface, but with a red box labeled '2' highlighting the dropdown menu that appears when the magnifying glass icon is clicked. The dropdown menu contains options for the display format: '月別 (小)' (Monthly (Small)), '月別 (大)' (Monthly (Large)), '週別' (Weekly), '日別 (小)' (Daily (Small)), and '日別 (大)' (Daily (Large)). A red arrow points from the 'CLICK!' text to the dropdown menu.

タ	題名	ス...	担当者	開...	期日
1	自動販売機開発...			04/22	06/22
2	自動販売機開発...			04/22	06/22



操作変更点

チケット操作部分



① 図書 #2242 オンプレミスの構想 宏行 大橋 05/23 06/03

CLICK! オンプレミスの構想

Redmineプラグインの開発(LGC) ☒ 工数を日数で表示する

ステータス	新規	開始日	2025/05/23
優先度	通常	期日	2025/06/03
担当者	宏行 大橋	実開始日	
カテゴリ	問い合わせ	実終了日	
対象バージョン	進捗率		0%
親チケット	予定工数	1日	
	残工数(Lychee)		
	作業時間		
ポイント	5	委託先	

説明

作業時間を記録

ファイル

コメント (0 / 1)

閉じる

図書 オンプレミスの構想

プロジェクト Redmineプラグインの開発(LGC) ☒ 工数を日数で表示する ☐ プライベート

ステータス 新規 開始日 2025-05-23 ☐ 前倒し不可

優先度 通常 期日 2025-06-03

担当者 宏行 大橋 実開始日

カテゴリ 問い合わせ 実終了日

対象バージョン 進捗率 0%

親チケット 予定工数 1 日

残工数(Lychee) 日

作業時間

ポイント 5 委託先

説明

編集

作業時間を記録

設計作業 2025-06-06 時間

コメント

編集 プレビュー B I U C H1 H2 H3

編集したい内容を変更し、最後に「保存」をクリック

閉じる 保存



Redmineプラグインの開発(LGC)

+ ダッシュボード 概要 活動 ロードマップ チケット カンパーン バックログ 作

▼クエリ + 新しいチケット ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺

戻る >> << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 Redmineプラグインの開発(LGC) 06/05 要件定義レビュー

2 顧客要望の調査 顧客要望の調査 新規・0%・宮本 吉之助

3 ソリューションの決定 ソリューションの決定 新規・0%・安井 久雄

4 オンプレミスの構想 オンプレミスの構想 新規・8%・平岡 厚吉

5 クラウドの構想 クラウドの構想 新規・0%・富田 健司

6 セキュリティ方針 セキュリティ方針 新規・0%・安西 博満

7 サポート範囲の決定 サポート範囲の決定 新規・0%・林 美琴

8 外部システム連携 外部システム連携 新規・0%・富田 健司

9 データベース設計 データベース設計 新規・0%・安井 久雄

10 運用方法の定義 運用方法の定義 新規・0%・赤石 ラ

11 Redmineプラグインの開発(LGC)... Redmineプラグインの開発(LGC)...

12 Redmineプラグインの開発(LGC)... Redmineプラグインの開発(LGC)...

13 Redmineプラグインの開発(LGC)... Redmineプラグインの開発(LGC)...

14 Redmineプラグインの開発(LGC)... Redmineプラグインの開発(LGC)...

15 Redmineプラグインの開発(LGC)... Redmineプラグインの開発(LGC)...

16 Redmineプラグインの開発(LGC)... Redmineプラグインの開発(LGC)...

CLICK!

クリックすると、
チケット編集画面が開きます

#2248 機能

×

オンプレミスの構想

プロパティ コメント/履歴 作業時間

説明

プロジェクト * Redmineプラグインの開発(LGC)

ステータス * 新規

担当者 平岡 厚吉

優先度 * 通常

カテゴリ フロント

対象バージョン

親チケット -

開始日 期日

2025-05-27 2025-05-30



#2248 機能

オンプレミスの構想

①入力したい項目にマウスを乗せるとグレーになります

プロパティ コメント/履歴 作業時間

説明

プロジェクト * Redmineプラグインの開発(LGC)

ステータス * 新規

担当者 平岡 厚吉

優先度 * 通常

カテゴリ フロント

対象バージョン

親チケット -

開始日 期日

2025-05-27 » 2025-05-30



#2248 機能

オンプレミスの構想

②1クリックすると入力項目が現れます

プロパティ コメント/履歴 作業時間

説明

プロジェクト * Redmineプラグインの開発(LGC)

ステータス * 新規

説明

~~~~~

カテゴリ フロント

対象バージョン

親チケット -

説明

~~~~~

③入力して

④入力画面外をクリック

CLICK!


CLICK!



操作変更点


ガントバー部分

バーの伸縮を行う際は、マウスの形で判別します。

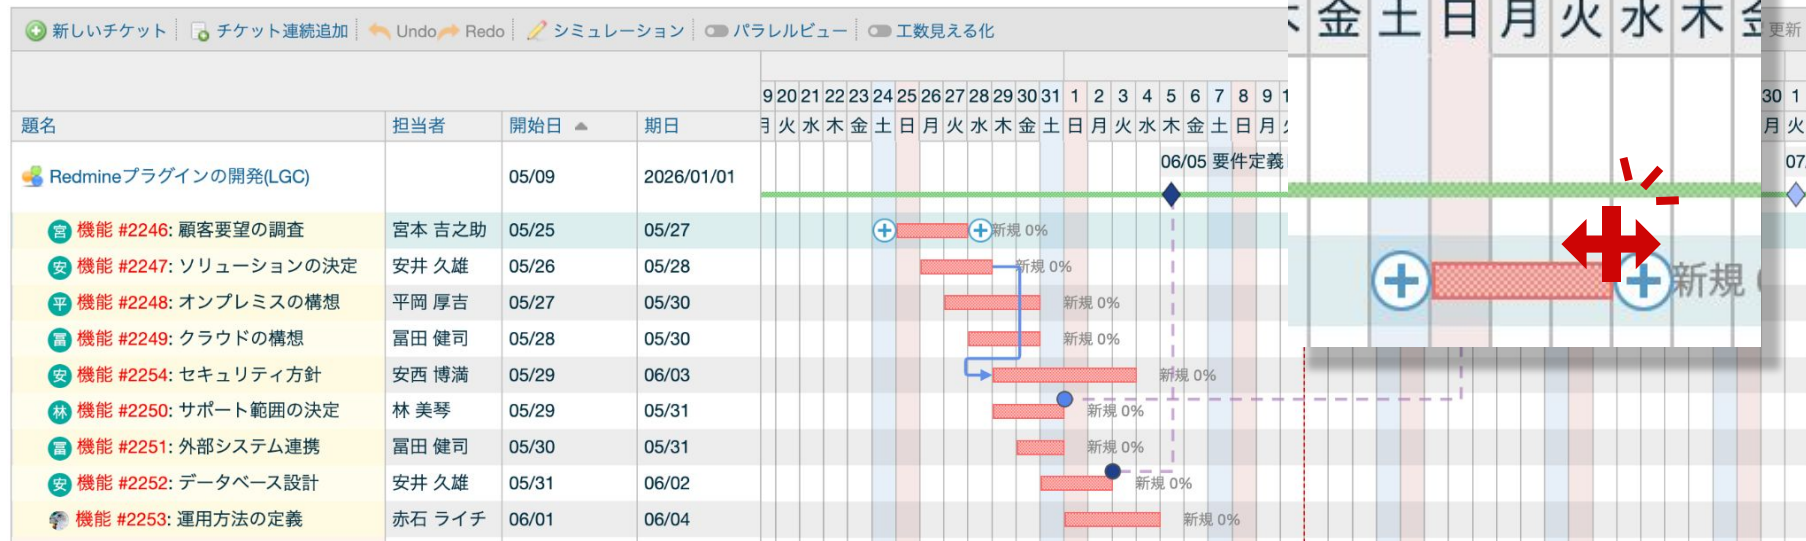



ガントバーにカーソルを当てると、つまみが表示されます。

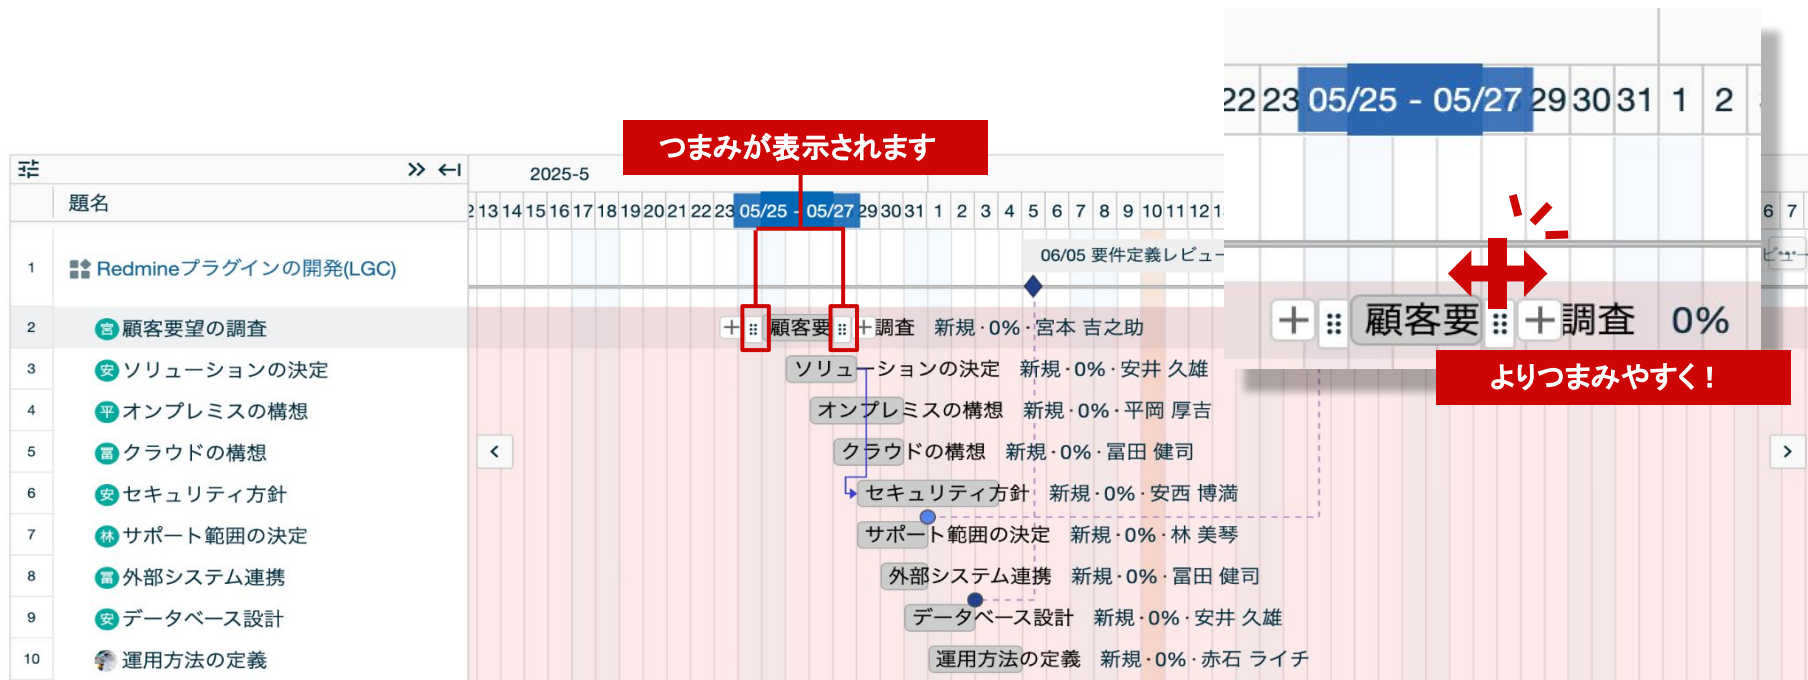

The slide features a white background with a thick red border. Decorative elements include various geometric shapes in light blue, pink, and purple, such as circles, triangles, and lines, scattered across the corners. A diagonal pink band runs from the top right to the bottom left. The text is centered in the middle of the slide.

操作変更点

その他



旧ガントチャートでは、チケット連続追加ボタンを押下後、トラッカーを設定してチケットを作成することができました。

The screenshot shows the '旧ガント' (Old Gantt) interface. At the top, there is a toolbar with buttons: '新しい' (New), 'チケット連続追加' (Ticket Continuous Addition), 'Undo', 'Redo', 'シミュレーション' (Simulation), 'パラレルビュー' (Parallel View), and '工数見える化' (Effort Visualization). A red circle with the number 1 highlights the 'チケット連続追加' button. A red arrow points from this button to a dropdown menu labeled 'トラッカー' (Tracker). The dropdown menu has a checkmark next to 'トラッカー' and other options: '機能' (Function), 'バグ' (Bug), and 'サポート' (Support). A red circle with the number 2 highlights the 'トラッカー' dropdown. A red arrow points from the dropdown to a Gantt chart. The Gantt chart shows a project named '自動販売機開発プロジェクト' (Vending Machine Development Project) with a timeline from 2025-6 to 2026-1. A red circle with the number 3 highlights the '機能 #new_1: 追加作業' (Function #new_1: Additional Work) task in the Gantt chart.

① チケット連続追加

CLICK!

トラッカー

機能
バグ
サポート

②

③

機能 #new_1: 追加作業

Shift + Alt (MacはShift + Option) でチケット作成モードのON/OFFが可能です。

▽クエリ + 新しいチケット ①

[Shift] + [Alt] とマウスカーソルで
任意の場所にチケットを追加できます。



▼クエリ + 新しいチケット ① | 元に戻る ↶や

任意の場所にチケットを追加できます。

自動販売機開発プロジェクト » 自動販売機開発プロジェクト_ソフト

チケット作成モード

検索:


+ ダッシュボード 概要 活動 ロードマップ チケット カンパ 作業時間

▼クエリ + 新しいチケット ⓘ | 元に戻す ↶ やり直し | シミュレーション | パラレルビルド

2025-6	
日	時間
1	自動販売機開発プロジェクト
2	自動販売機開発プロジェクト_ソフト
3	αバージョン
4	購入ボタン制御機能
5	要件定義作業
6	要件定義作業



シミュレーションモード中に、チケット連続作成が可能になりました。

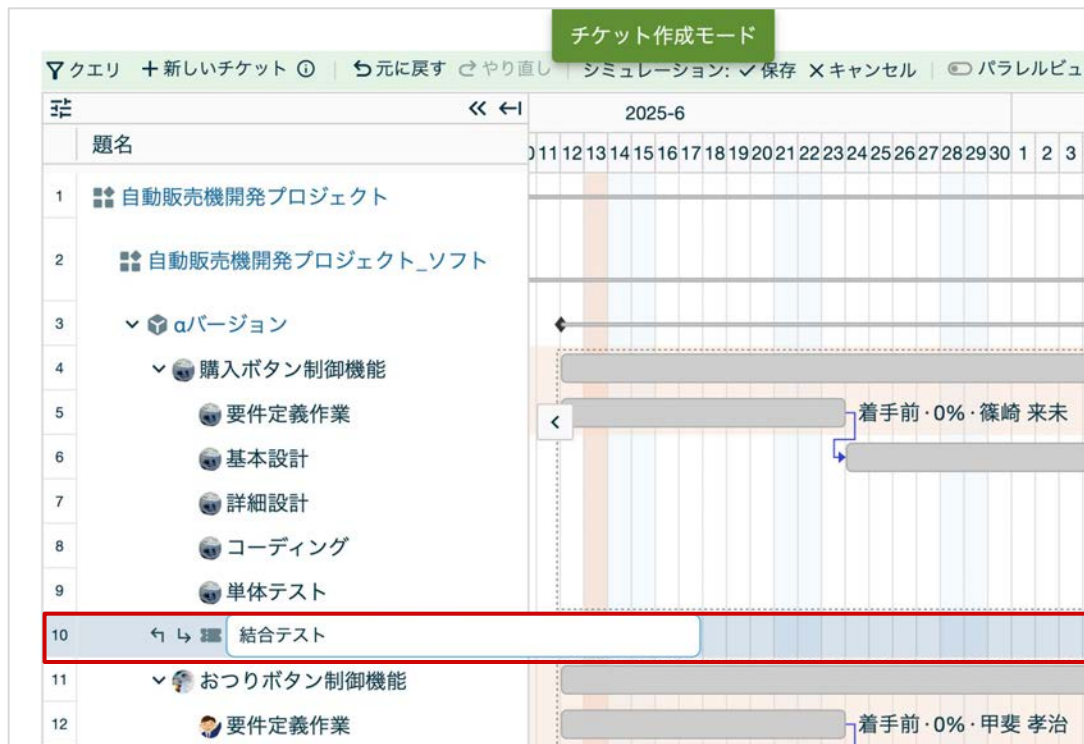



新ガントチャートではチケット追加中にチケット階層(親子関係)を変更できます。

チケット追加中に**→ボタン** で下の階層、

←ボタン で上の階層のチケットに設定することができます。


	題名
1	🔲 自動販売機開発プロジェクト
2	▼ 🔲 自動販売機開発プロジェクト_ソ...
3	▼ 📦 αバージョン
4	▼ 🟢 購入ボタン制御機能
5	👤 要件定義作業
下の階層へ → 追加作業	



	題名
1	🔲 自動販売機開発プロジェクト
2	▼ 🔲 自動販売機開発プロジェクト_ソ...
3	▼ 📦 αバージョン
4	▼ 🟢 購入ボタン制御機能
5	👤 要件定義作業
上の階層へ ← 追加作業	



新ガントチャートではガントバーをドラッグして、チケット期間を指定して
チケット作成することができます。(ドラッグの場合、題名は「無題」になります)

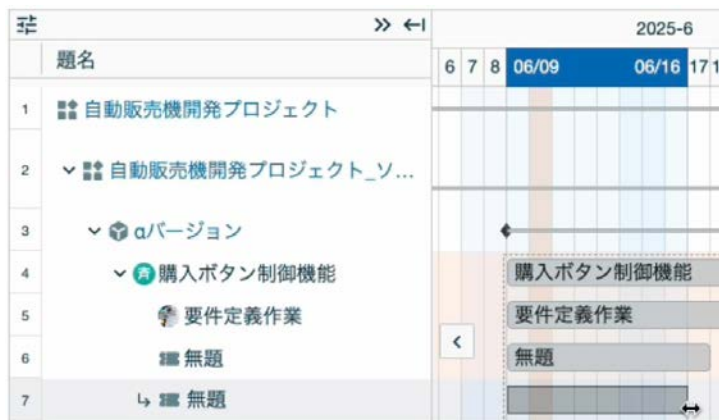

DRAG



チケット作成完了！題名は後で変更可能



マイルストーンとチケットを紐づける際にチケット番号を手入力します。

The screenshot shows a Gantt chart interface with a task list on the left and a timeline on the right. The task list includes:

- 自動販売機開発プロジェクト
- 自動販売機開発プロジェクト_ソフト
- αバージョン
 - 機能 #3005: 購入ボタン制御機能
 - タスク #3006: 要件定義作業
 - タスク #3007: 基本設計
 - タスク #3008: 詳細設計
 - タスク #3009: コーディング
 - タスク #3010: 単体テスト
 - タスク #3011: 結合テスト
 - 機能 #3012: おつりボタン制御機能
 - タスク #3013: 要件定義作業
 - タスク #3014: 基本設計
 - タスク #3015: 詳細設計
 - タスク #3016: コーディング
 - タスク #3017: 単体テスト
 - タスク #3018: 結合テスト

The timeline shows a calendar view from 2025-10-1 to 2025-10-31. A modal window is open for editing a milestone, showing the following details:

- 日付: 2025-10-30
- 名称: αバージョンリリース
- 表示色: A color selection grid with a red checkmark on the red color.
- チケット: 3012
- 保存 button

A red banner at the bottom right of the modal window contains the text: 紐づけたいチケット番号を手入力



チケットを紐づける際にチケット番号を手入力する必要がありましたが、マイルストーン作成時に対象のチケット行を選択するだけで、簡単に紐づけができるようになりました。

① チケット行から選択

CLICK!

② 紐づけたいチケット行をクリック

CLICK!

③ チケットが指定される

チケット 3012

保存



ガントバーにカーソルを移動すると表示される「+」ボタンを押下し、紐付けるチケットにカーソルを移動します。

黒い線が表示され、紐付けるチケットのガントバーをクリックすると先行後続の関連設定が行えます。







・クリックするだけで、先行・後続の関連を簡単に設定できます。

遅延日数は「0日」で自動設定されるため、すぐに関連付けが反映されます。

・右クリックで詳細に関連付けできます。遅延日数設定やブロック設定、前倒し設定したい場合に 利用します。

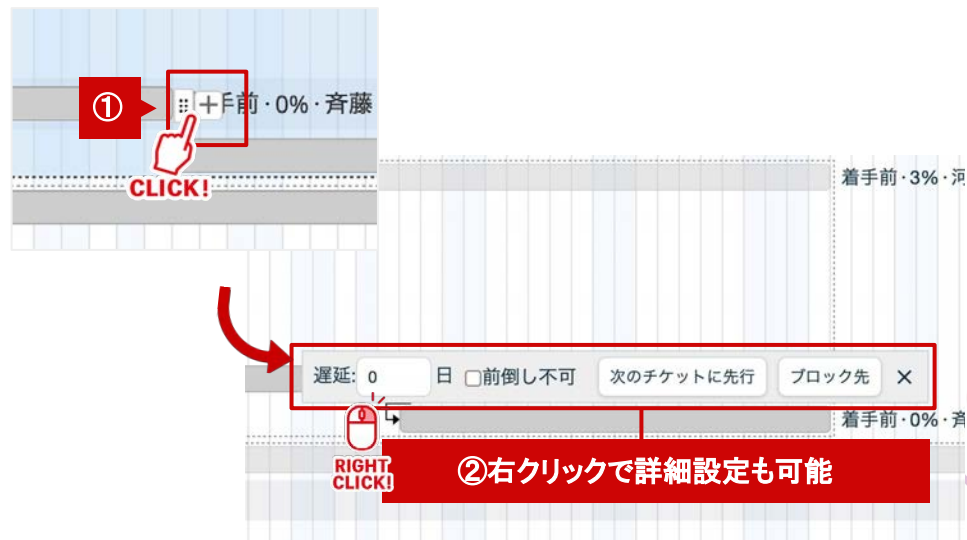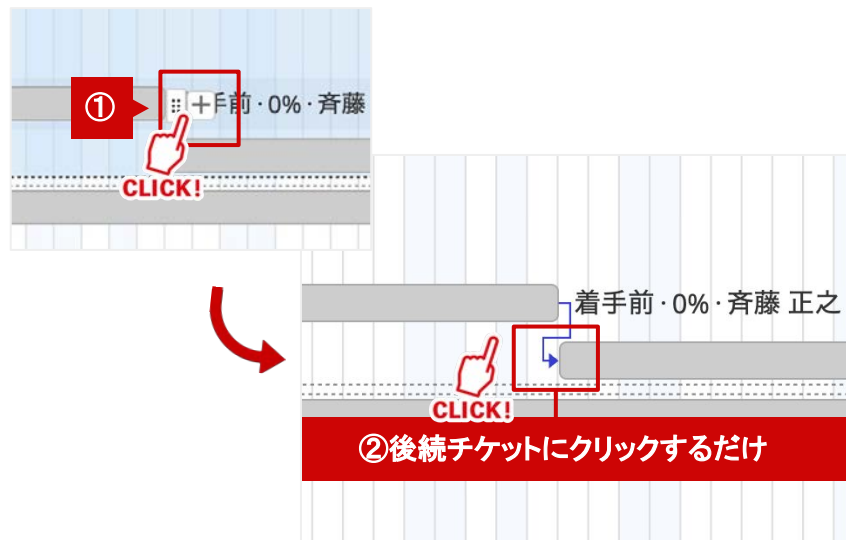



該当のチケットの詳細画面から、関連付けの解除操作を行います。



タスク #3008 結合テスト

プロジェクト * 自動販売機開発プロジェクト_ソフト ☐ 工数を日数で表示する

ステータス *	着手前	開始日	2025/09/25
優先度 *	通常	期日	2025/10/14
担当者	斉藤 正之	実開始日	
カテゴリ		実終了日	
対象バージョン	αバージョン	進捗率	0%
親チケット	購入ボタン制御機能	予定工数	64:00時間
		残工数(Lychee)	
		作業時間	

説明

終了条件

読む...

作業時間を記録 🕒

ファイル

関連するチケット

次のチケットに後続 タスク #3007: 単体テスト	着手前	2025/08/28	2025/09/24	🕒
----------------------------	-----	------------	------------	---

コメント (0 / 14)


閉じる

CLICK!

②チケット詳細画面でアイコンをクリック




ガントチャート上の関連線をクリックするだけで、関連付けを簡単に解除できるようになりました。

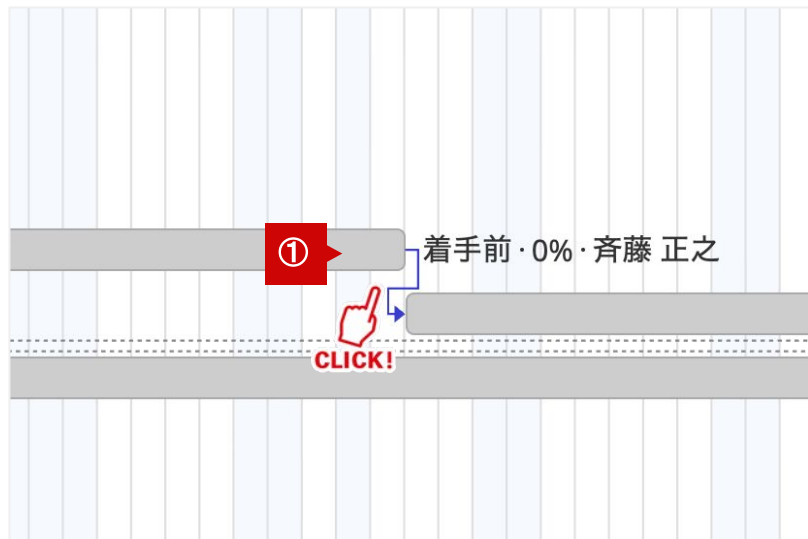



遅延時の色付けを、進捗バーが赤くなる表示から、行全体の背景が赤くなる表示に変更しました。
ガントバーが表示されていない期間を表示している場合でも遅延に気づきやすくなります。


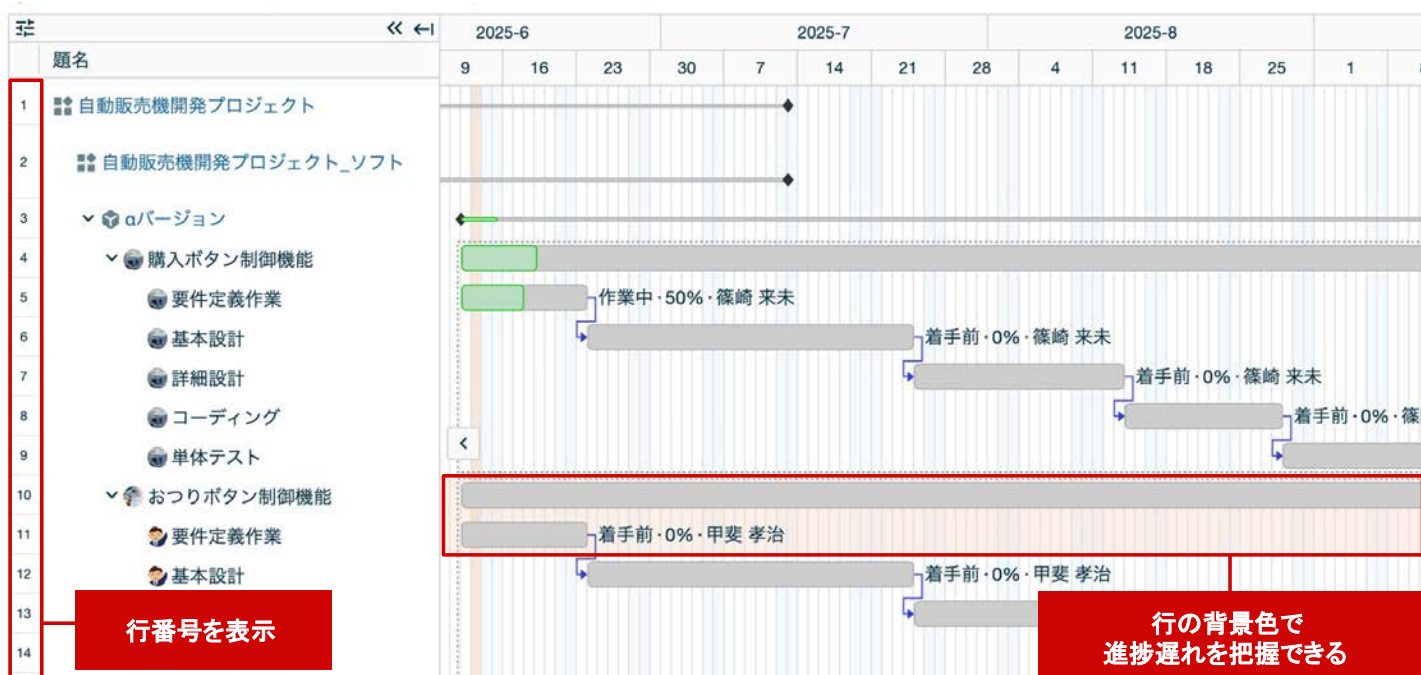


行番号を表示

行の背景色で
進捗遅れを把握できる



ガントチャート左下の番号を押下すると、階層ごとに折りたたみ表示が可能です。

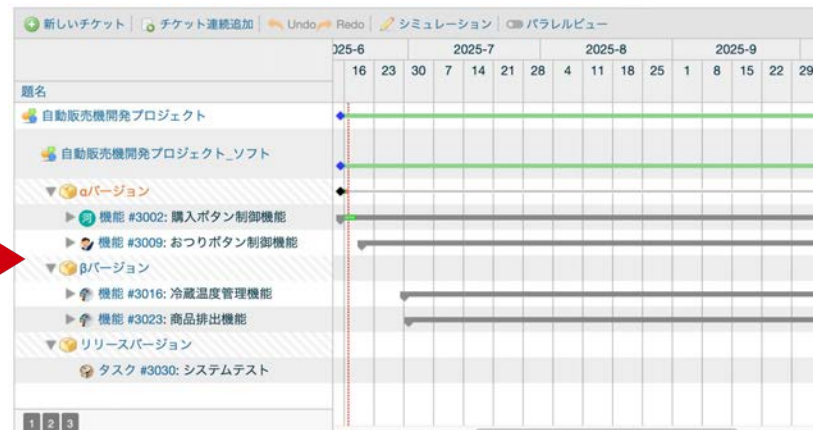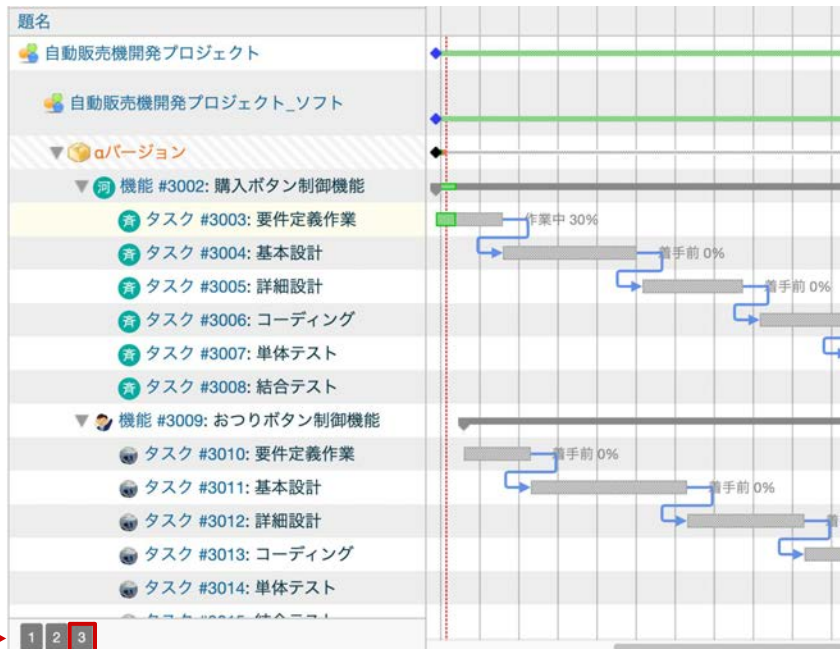



②階層ごとに折りたたみ表示できる

①





一括開閉ボタン表示が番号から▶▼形式になりました。

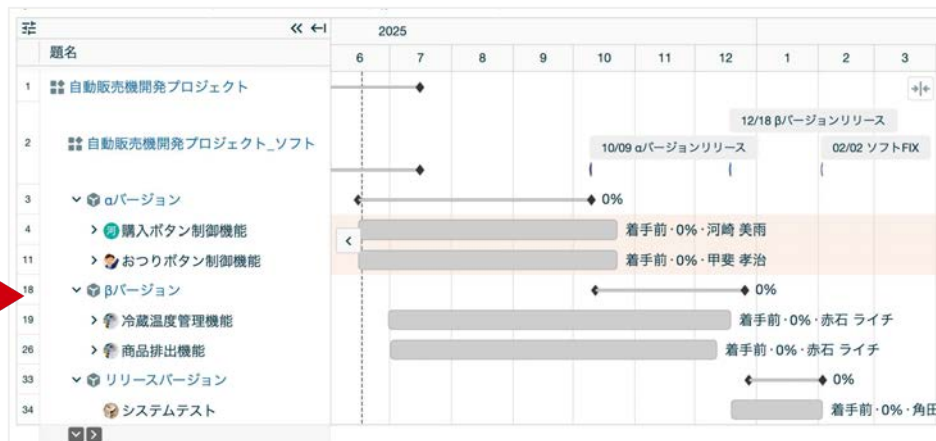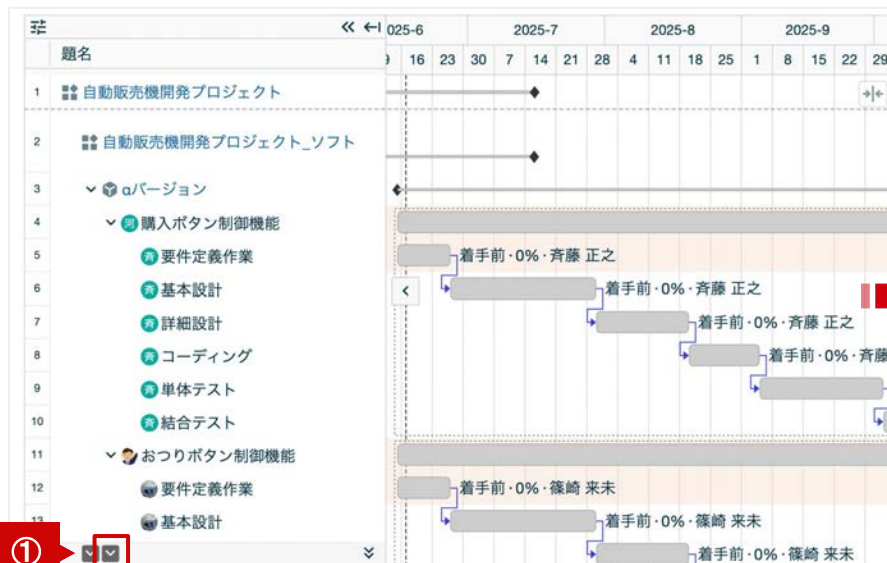

②階層ごとに折りたたみ表示できる

①



CLICK!



プロパティエリアの開閉が可能になりました。
ガントチャートのエリアが広がり、プロジェクトでも全体像を把握しやすくなります。



②ガントチャートのスペースを広げられる

ダウンロードのリンクをクリックし、サイズと向きを指定して、ガントチャートをPDFでダウンロードすることができます。

ガントチャート

▼ フィルタ

≡ オプション

📄 表示する項目

≡ ソート条件

6ヶ月分
6月
2025
適用
クリア
保存

🔄 新しいチケット
🔗 チケット連続追加
🔄 Undo
🔄 Redo
🎯 シミュレーション
🔄 パラレルビュー

題名	2025-6			2025-7			2025-8			2025-9		
	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	1
📁 自動販売機開発プロジェクト	[Green bar]											
📁 自動販売機開発プロジェクト_ソフト	[Green bar]											
📁 📁 αバージョン	[Green bar]											
📁 機能 #3002: 購入ボタン制御機能	[Green bar]											
📁 タスク #3003: 要件定義作業	[Green bar] 作業中 30%											
📁 タスク #3004: 基本設計	[Grey bar] 着手前 0%											
📁 タスク #3005: 詳細設計	[Grey bar] 着手前 0%											
📁 タスク #3006: コーディング	[Grey bar] 着手前 0%											
📁 タスク #3007: 単体テスト	[Grey bar] 着手前 0%											
📁 タスク #3008: 結合テスト	[Grey bar] 着手前 0%											

📄 PDF
🔗 ベースライン保存
🖼️ 全画面モード

サイズ

A4

向き

横向き

余白

表示

縮尺率

100%

ヘッダー (左)

ヘッダー (中)

ヘッダー (右)

プロジェクト名

☒ 表示する

印刷年月日

☒ 表示する

PDFをダウンロード



ガントチャートエリアでは期間指定を行わないため、
ダウンロード時に期間を指定できるように項目が追加されています。

期間指定エリアの追加

期間

2025/04/16 - 2025/09/16

サイズ

A4

向き

☒ 横 ☐ 縦

余白

20 mm

10 mm 10 mm

20 mm

ヘッダー (左)

ヘッダー (中)

ヘッダー (右)

付加情報

☒ プロジェクト名
☒ 現在の日付

PDFをエクスポート

1 自動販売機開発プロジェクト

2 自動販売機開発プロジェクト_ソフト

3 aバージョン

4 購入ボタン制御機能

5 要件定義作業 作業中・30%・斉藤 正之

6 基本設計

7 詳細設計

8 コーディング

9 単体テスト

10 結合テスト

11 おつりボタン制御機能

12 要件定義作業 着手前・0%・篠崎 来未

13 基本設計

14 詳細設計

15 コーディング

16 単体テスト

17 結合テスト

その他便利機能

③開始日を設定

④自動でスケジューリングされる



操作は、旧ガントとほとんど変わりません。

① チケットを複数選択

RIGHT CLICK!

②

③ 開始日を設定

④ 自動でスケジューリングされる

未着手・0%

未着手・0%

未着手・0%

未着手・0%



ガントチャート表の上部にある各ボタンを押下することでモードに変わります。

各種機能の詳細についてはマニュアルをご参照ください。

ガントチャート

PDF | ベースライン保存 | 全画面モード

フィルタ

☒ ステータス 未完了

フィルタ追加

オプション

表示する項目

ソート条件

6 ヶ月分 5月 2025 適用 クリア 保存

日別(大) / 日別(小) / 週別 / 月別(大) / 月別(小)

新しいチケット | チケット連続追加 | Undo Redo | シミュレーション | **パラレルビュー** | **工数見える化** | 更新

題名	担当者	ステータス	期日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
				木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日



ガントチャート表の上部にある各ボタンを押下することでモードに変わります。


機能的には旧ガントと変更ありません。

各種機能の詳細についてはマニュアルをご参照ください。



CLICK!

困ったときのヘルプ『ココミテ』

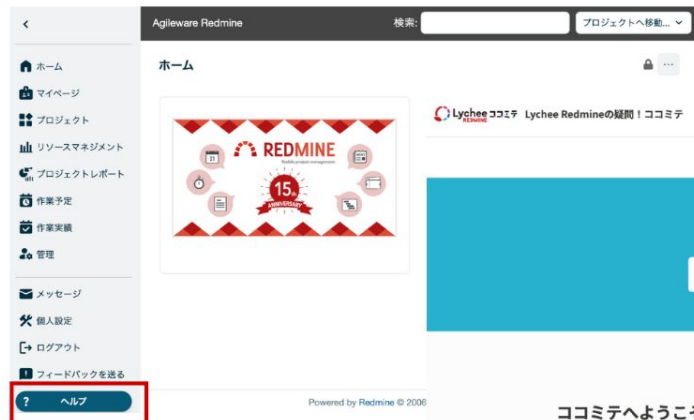

操作マニュアルの他、
お役立ち情報なども随時更新！





お問い合わせ先: <https://lychee-redmine.jp/contact/>

開発元: 株式会社アジャイルウェア

